



KEY-PLAN

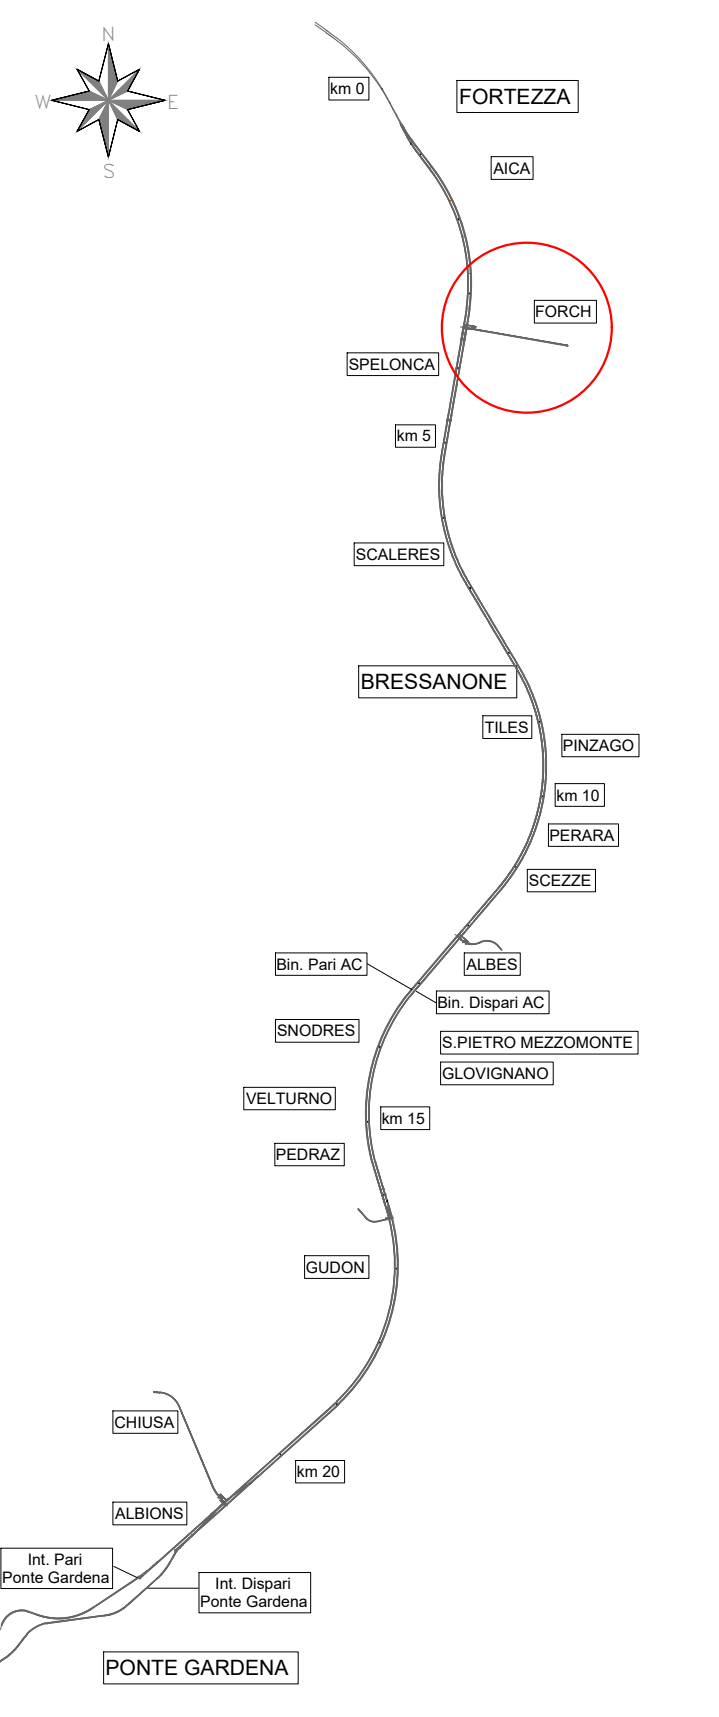

SEZIONE 7-7

SCALA 1 : 100


PROFILO IN ASSE GALLERIA
BINARIO PARI

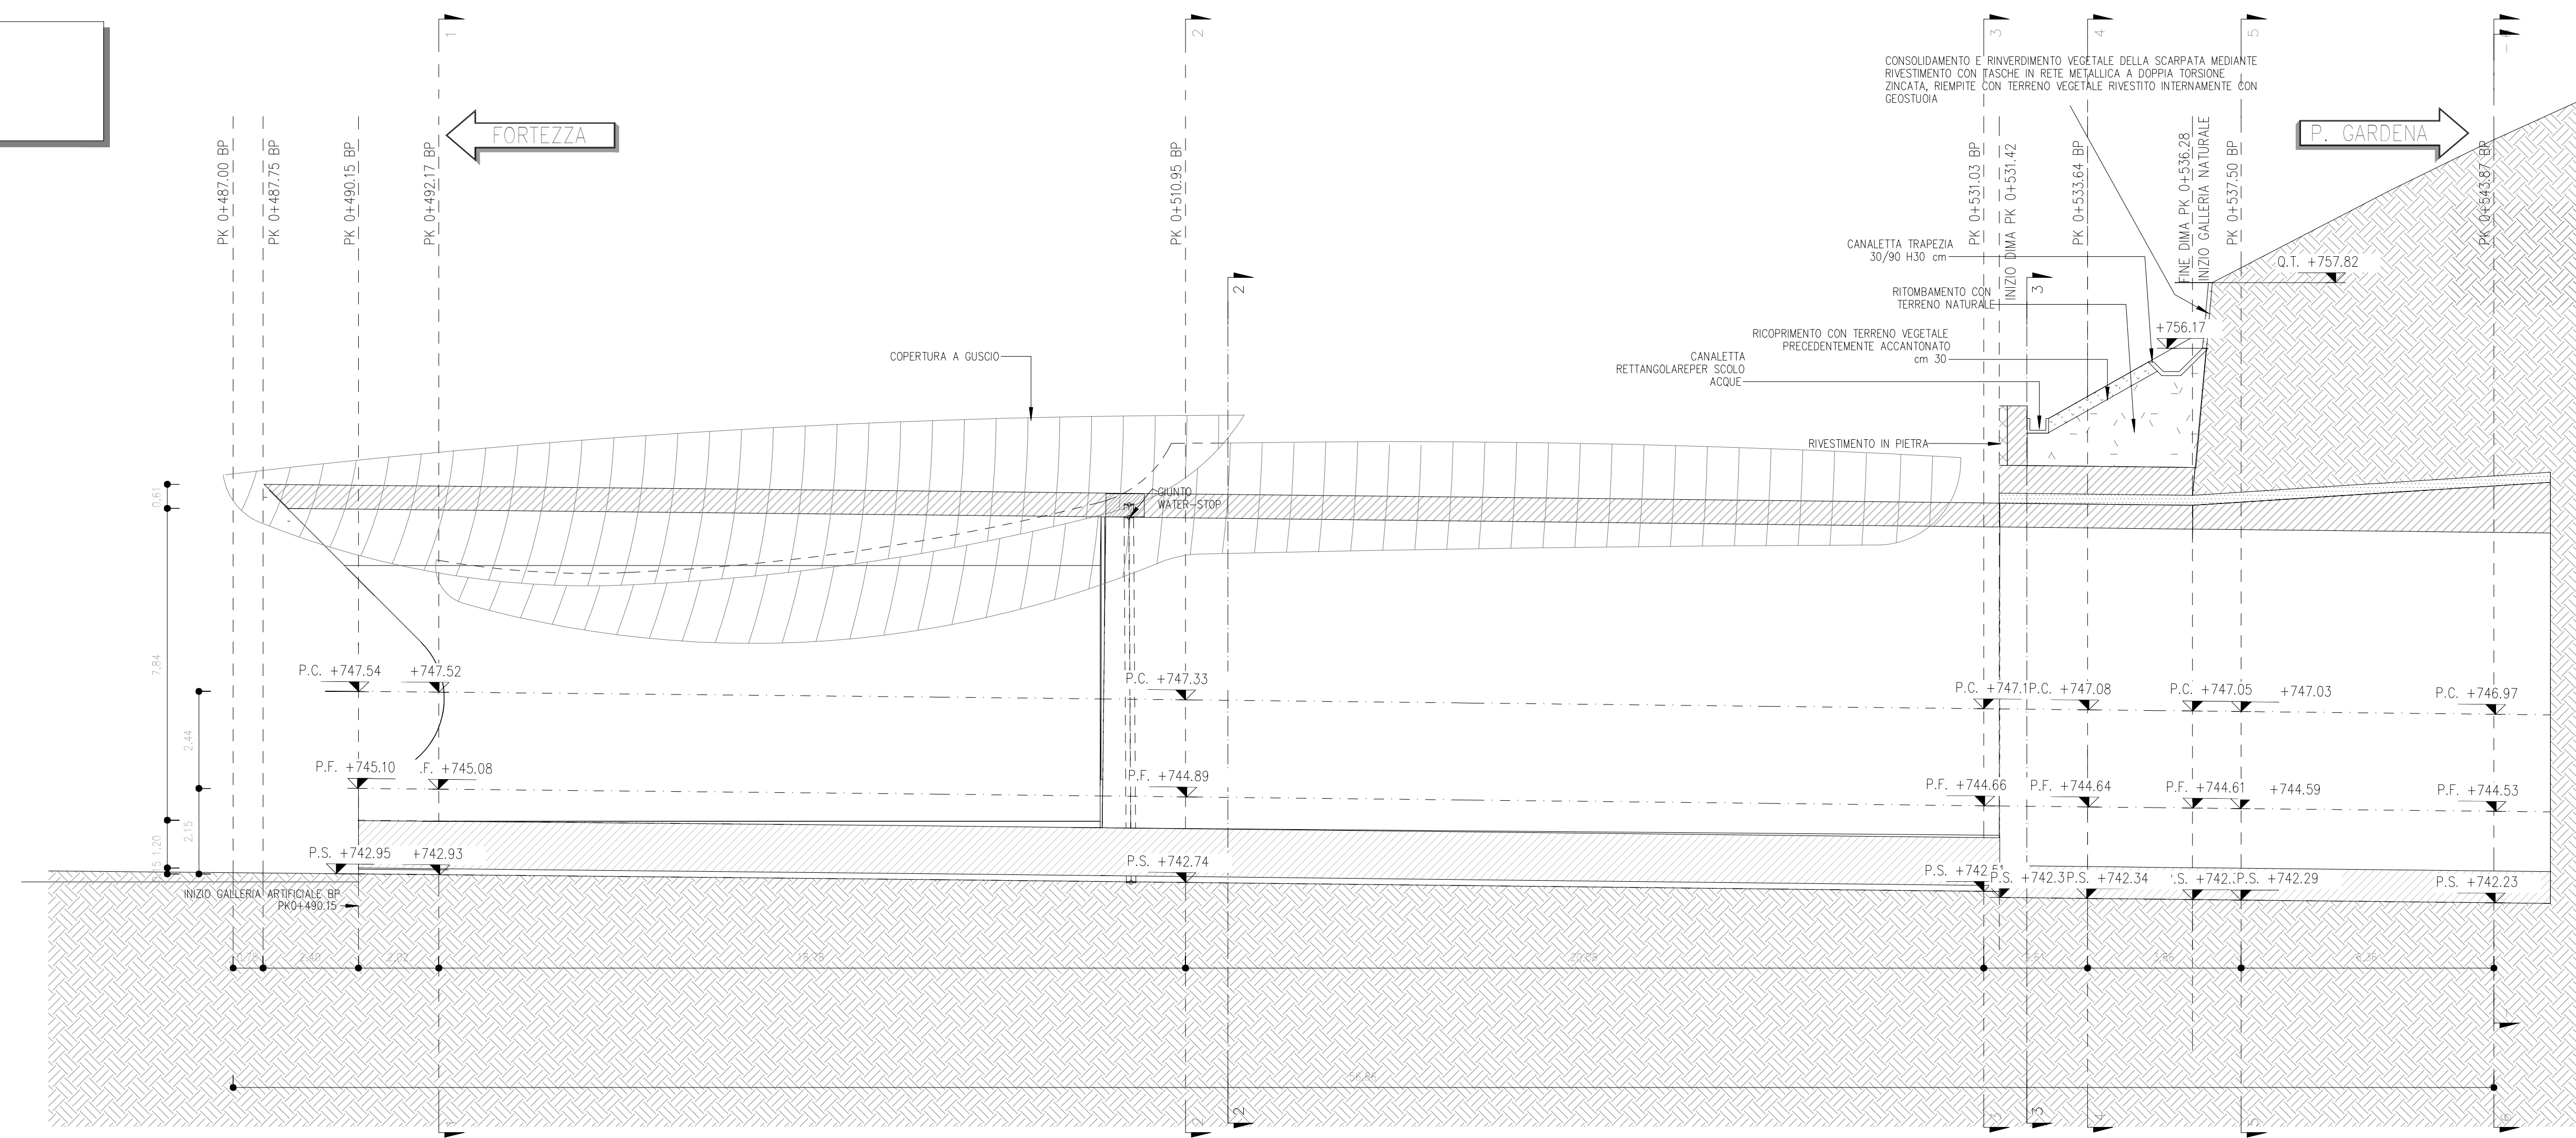

SEZIONE 8-8

SCALA 1 : 100

PROFILO IN ASSE GALLERIA
BINARIO DISPARI

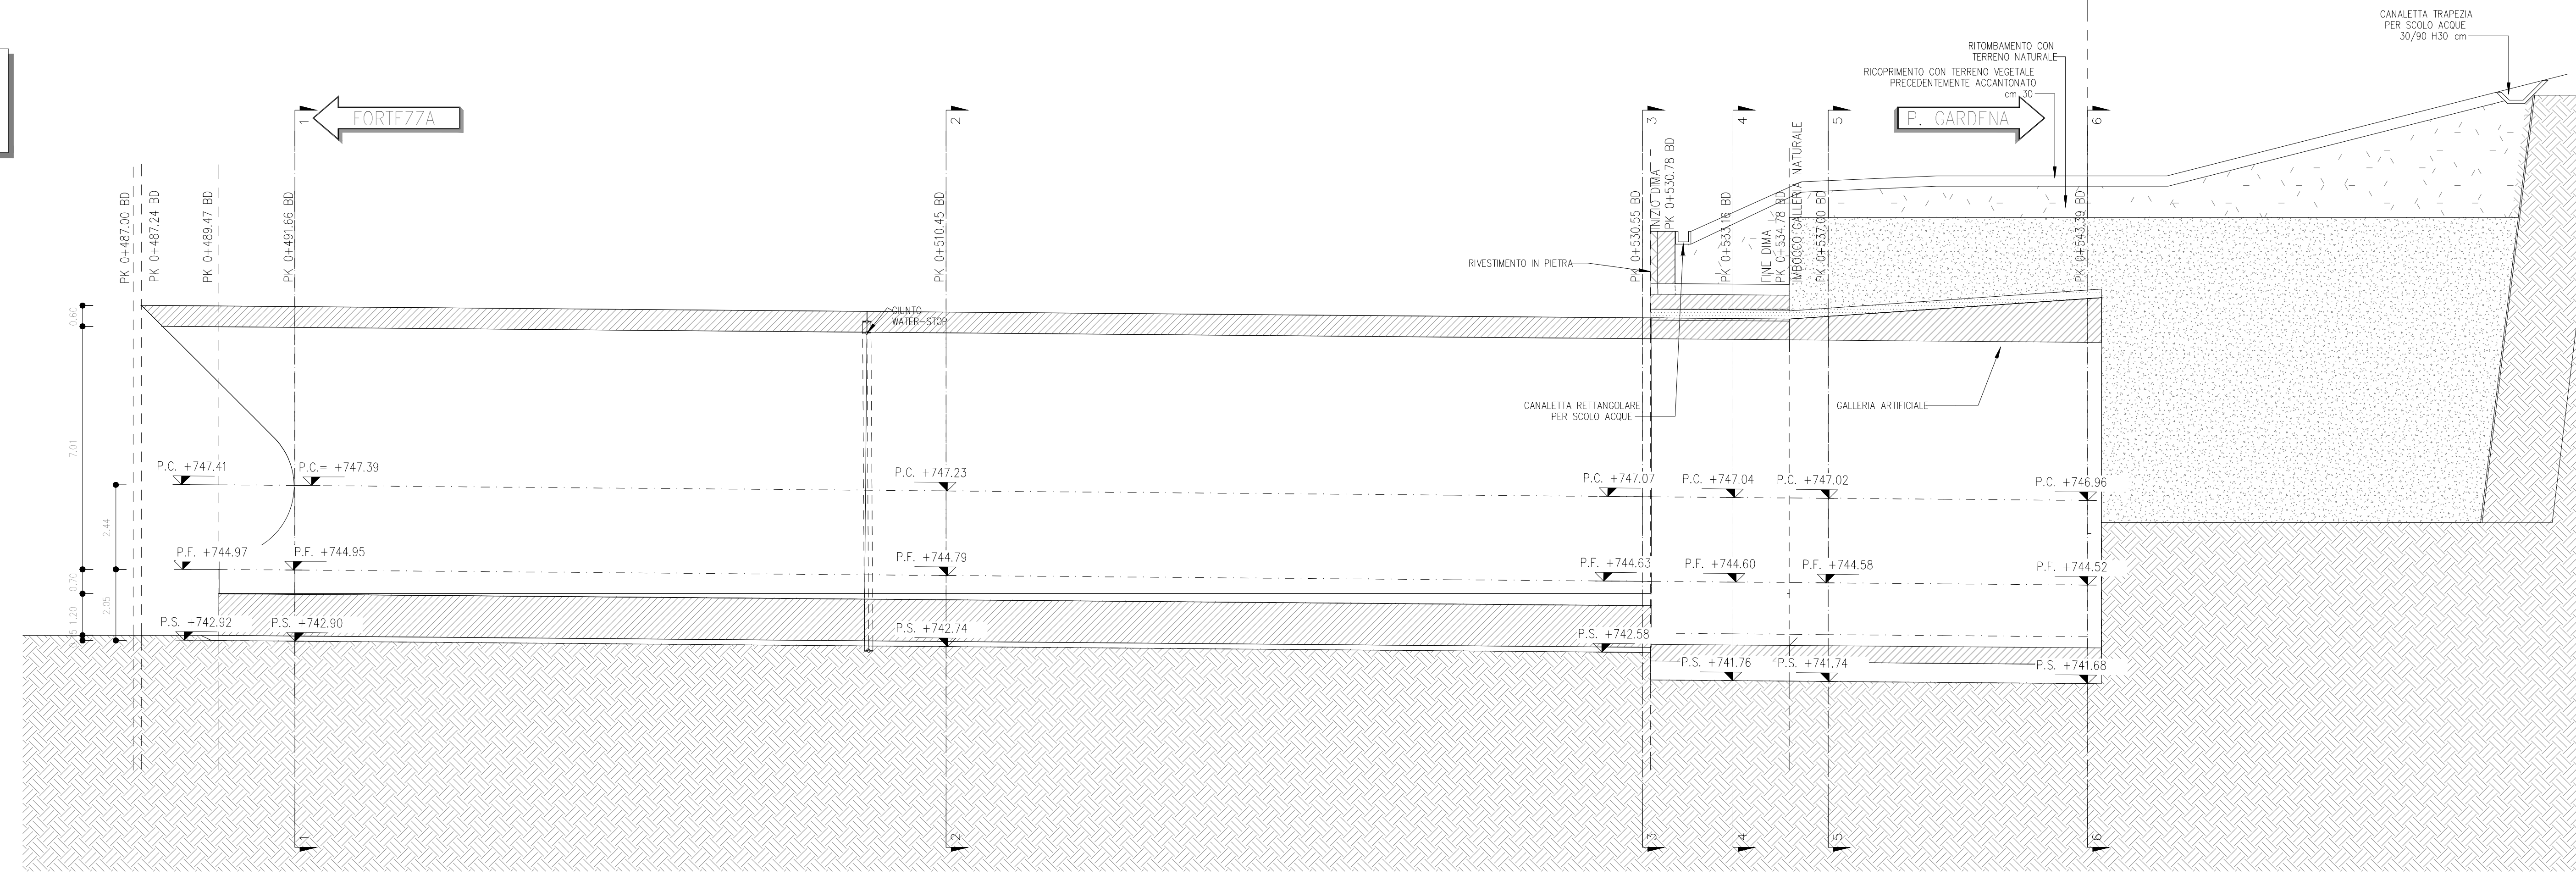

FASI ESECUTIVE FASE DEFINITIVA

- ESECUZIONE DELLA GALLERIA ARTIFICIALE E SISTEMAZIONE DEFINITIVA
- FASE 9 - ESECUZIONE DELLA GALLERIA ARTIFICIALE
- preparazione del piano di lavoro per il getto della galleria artificiale;
 - getto delle fondazioni della galleria artificiale;
 - getto di calcestruzzo e pietre della galleria artificiale;
 - montaggio della copertura a guscio della galleria artificiale, realizzata con rivestimento in lamiera;
 - tavolo in legno ad alta densità separato dalle travi in acciaio mediante un foglio in neoprene.
- FASE 10 - RITOMBAMENTO DELLA PROTESI IN CALCESTRUZZO, DELLA DIMA E DELLA GALLERIA ARTIFICIALE
- ritombamento dei piedini della galleria artificiale con terreno di riporto e sistemazione con terreno vegetale sp=30 cm;
 - ritombamento della dima e profilatura del terreno in corrispondenza del cono di "tocco fino al congiungimento con il pendio naturale, con terreno di riporto e sistemazione con terreno vegetale sp=30cm;
 - consolidamento e rivestimento vegetale della scarpata a monte del ritombamento sopra protesi mediante rivestimento con fasce in rete metallica a doppia torsione zincata riempite con terreno vegetale rivestito internamente con gestuola.

LEGENDA

P.C.	Piano di centri	P.S.	Piano di scavo
P.F.	Piano del ferro	D.C.	Quota cordolo berlinese
D.M.	Quota sommità muro	D.T.	Quota del terreno
Q.B.	Quota testa protesi in calcestruzzo		

NOTE

Per la planimetria fare riferimento alla tavola:
"B0U1BEZZVAGA0100007C"

Gli interventi di protezione del versante con barriere paramassi e consolidamento del versante con rete metallica di protezione sono indicati.



COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **Impresit** CONSORZIO DOLOMITI

PROGETTAZIONE: **SWS**

MANDATA: **PINI**, **GDP GEOMIN**, **SISI**

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: **DR. Paolo Cuneo**

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA "FORTEZZA - PONTE GARDENA" - Profili

DISEGNO: **08 - GALLERIE**
D-GALLERIA SCALARES
Imbocco Nord (Fortezza)
Sistemazione definitiva - Profili

APPALTATORE: **Impresit**

SCALA: **1 : 100**

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autografo	Data
A	Emissione	M. Inganni	13/01/22	A. Valente	14/01/22	D. Buttafava	15/01/22		
B	Emissione per indicazioni Contrattoria	L. Giustolisi	18/07/22	A. Valente	19/07/22	D. Buttafava	20/07/22		
C	Emissione a seguito di valutazione e autorizzazione	S. Carli	26/03/2023	P. Fortuna	26/03/2023	D. Buttafava	27/03/2023		

File: B0U1BEZZVAGA0100007C.dwg n. Elab.: 00/03/2023
