

LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO


VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO

1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

PROGETTO ESECUTIVO - COD. MI608

 <p>STUDIO CORONA</p>	 <p>Ing. Valerio Bajetti Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° A-26211</p>	<p>ING. RENATO DEL PRETE</p> <p>Ing. Renato Del Prete Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 5073</p>	 <p>Arch. Nicoletta Frattini Ordine degli Arch. di Torino e provincia n° A-8433</p>	 <p>Ing. Gabriele Incecchi Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° A-12102</p>
	 <p>Ing. Renato Vaira (Ordine degli Ingg. di Torino e Provincia n° 4663 W)</p>	 <p>Prof. Ing. Matteo Ranieri Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 1137</p>	 <p>Prof. Ing. Luigi Monterisi Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 1771</p>	 <p>Ing. Gioacchino Angarano Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 5970</p>

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Dott. Ing. Giuseppe Danilo MALGERI

INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE



Ing. Fabrizio BAJETTI

GEOLOGO



Prof. Ing. Geol. Luigi MONTERISI

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE



Ing. Gianluca CICIRIELLO

N005

N - CANTIERIZZAZIONE

N0 - CANTIERIZZAZIONE

RELAZIONE SUL CRONOPROGRAMMA

<p>CODICE PROGETTO</p> <p>PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.</p> <p>LO203 E 2301</p>		<p>NOME FILE</p> <p>N005-T00CA00CANRE05_B.dwg</p>		<p>REVISIONE</p> <p>B</p>	<p>SCALA:</p> <p>-----</p>
<p>CODICE ELAB.</p> <p>T00CA00CANRE05</p>					
C					
B	EMISSIONE A SEGUITO VERIFICA ART. 26	Dicembre 2023	ARCH. SOHEILA NEGARESTANI	ING. GAETANO RANIERI	ING. FABRIZIO BAJETTI
A	EMISSIONE	Ottobre 2023	ARCH. SOHEILA NEGARESTANI	ING. GAETANO RANIERI	ING. FABRIZIO BAJETTI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO


SOMMARIO

1	PREMESSA	2
2	IL CRONOPROGRAMMA	2
2.1	WBS (work breakdown structure) delle opere	2
2.2	Tipologie di lavorazione per singola WBS	2
2.3	Aree di lavoro e fasi esecutive	3
2.4	Il cronoprogramma	4
2.5	La durata dei lavori	5

2.3 AREE DI LAVORO E FASI ESECUTIVE

Per rappresentare la sequenza temporale di esecuzione delle opere sono state individuate in 12 aree di lavoro che seguono l'andamento dell'asse principale della variante e che consentono di descrivere l'avanzamento esecutivo dei cantieri.

Nell'elaborato N015-T00CA00CANPL08 sono rappresentate in planimetria tutte le WBS delle opere e dei corpi stradali da eseguire nelle varie aree di lavoro. Inoltre negli stessi elaborati grafici sono rappresentate le diverse aree di lavoro nella loro sequenza temporale di esecuzione (fasi esecutive) associate alla codifica degli assi stradali.

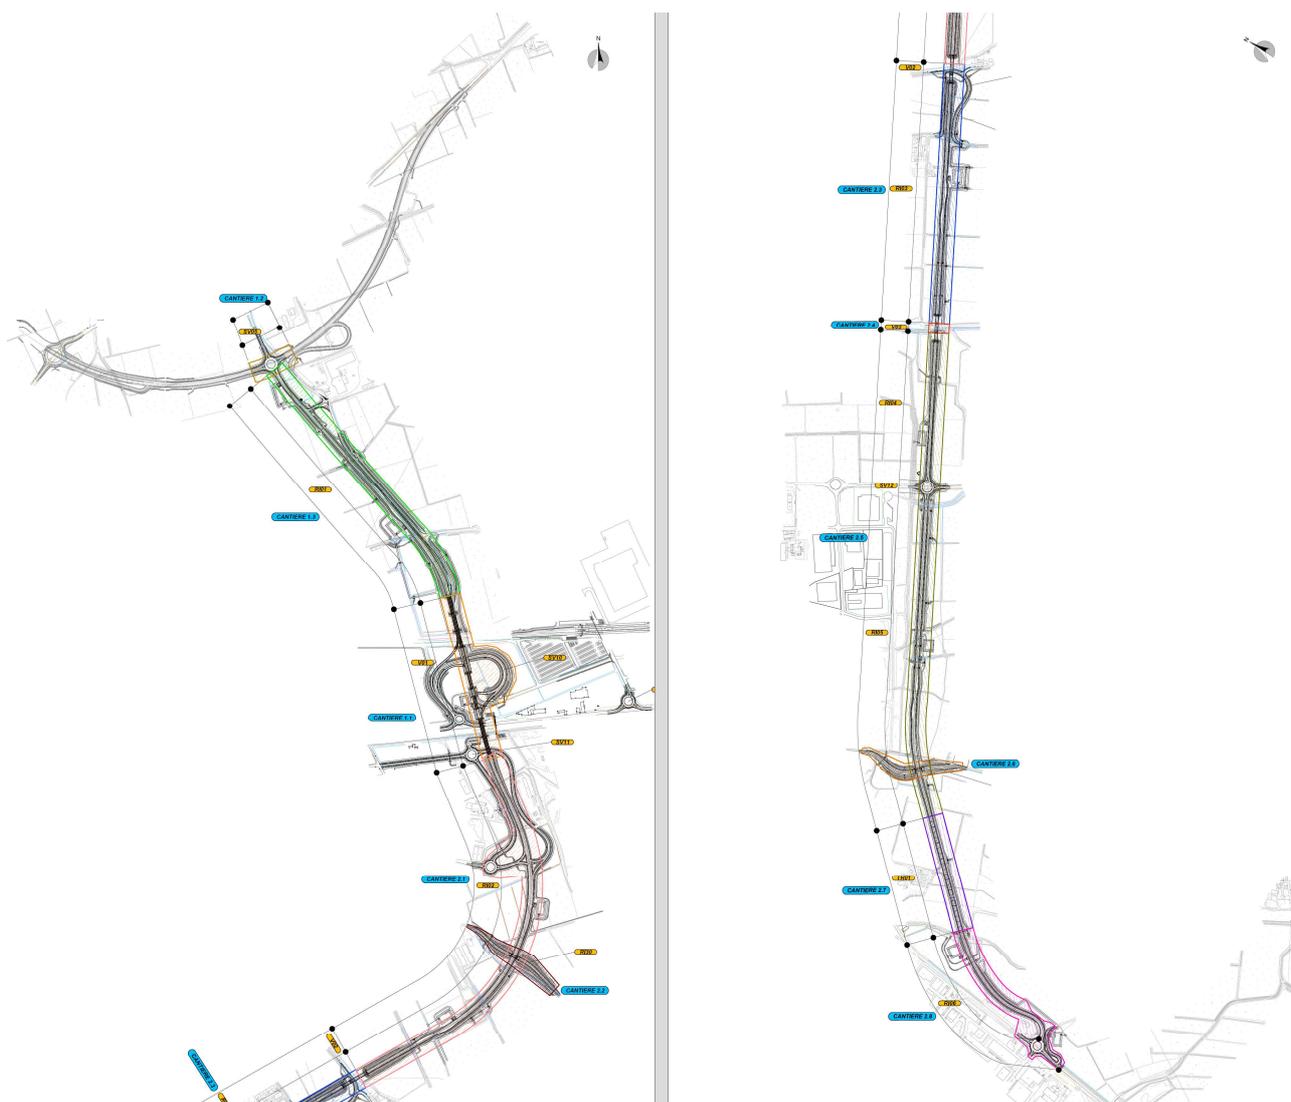

Nell'avanzamento temporale del cantiere le fasi esecutive prendono avvio in contemporanea a partire dalle aree di lavoro a Nord e da Sud, dove sono ubicati i 2 cantieri base.

Le attività si sviluppano quindi nell'ambito dei singoli cantieri.

Le opere da eseguire per la realizzazione dei lavori in oggetto sono state codificate e raggruppate in categorie omogenee (quali corpo stradale, svincoli, opere d'arte maggiori).

Si sono individuati quindi:

- per la zona Nord n. 1 cantiere stradale e n. 1 cantiere di opere d'arte maggiori quali il viadotto sul Naviglio Grande;
- per la zona sud n. 3 cantieri stradali e n. 5 cantieri di opere d'arte maggiori quali i n. 2 cavalcavia e i n. 2 ponti sul Naviglio di Bereguardo e sulla Roggia Ticiniello e la trincea sul tronco C2.

Di fatto per la zona nord sussistono n. 2 cantieri, che per loro caratteristiche, durata ed importanza costituiscono realtà fra loro indipendenti:

- il primo relativo al viadotto sul Naviglio Grande,
- il secondo relativo al cantiere stradale che in successione realizza il rilevato del tronco RI01 dell'asse principale, quindi gli svincoli e le rotatorie.

Per la zona sud, in modo analogo, sussistono n. 4 cantieri:

- il primo relativo ai n. 2 cavalcavia e i n. 2 ponti sul Naviglio di Bereguardo e sulla Roggia Ticiniello, che sono realizzati in successione per tipologia di lavori (fondazioni, pile, impalcato, soletta, ecc);
- il secondo relativo alla trincea con muri in c.a. nella tratta C2;
- il terzo ed il quarto relativi ai cantieri stradali che in successione rispettivamente da nord e da sud realizzano il rilevato dell'asse principale, svincoli e rotatorie compresi.

Anche negli elaborati grafici di cantierizzazione sono presenti leggende e KeyMap di ricucitura tra le WBS delle singole opere, le aree di esecuzione dei lavori (aree di lavoro) e la denominazione degli assi stradali.

L'evoluzione temporale di esecuzione delle lavorazioni, aggregata in fasi esecutive, è rappresentata nel Diagramma di Gantt (Cronoprogramma) e negli elaborati grafici.

2.4 IL CRONOPROGRAMMA

La progressione temporale delle lavorazioni di ciascuna area di lavoro è dunque rappresentato nell'elaborato N006-T00CA00CANRE06 del Cronoprogramma. La durata di ciascuna lavorazione (in funzione alle risorse necessarie al loro svolgimento) e le sequenze costruttive e operative (rappresentate dai legami logici tra le attività) portano a stabilire il tempo necessario all'esecuzione dell'intera opera, tenendo conto anche dell'evolversi di tutte le esigenze organizzative dei cantieri nel corso dei lavori.

FASE 0 - Le fasi esecutive prendono avvio dalla consegna dei lavori attraverso un insieme di **attività propedeutiche** necessarie all'avvio dei cantieri.

In particolare si sviluppano i rilievi topografici di dettaglio, per l'impostazione dei rilevati stradali e delle opere d'arte.

Le installazioni dei cantieri base a Nord e a Sud come inquadrati nella planimetria di T00CA00CANPL09 e T00CA00CANPL10 concludono la fase propedeutica. Le altre aree di cantiere e di lavoro nonché le piste al loro servizio – coincidenti con la viabilità di servizio di progetto - saranno realizzate con l'avanzamento temporale dell'esecuzione dei vari lotti.

FASE 1 – Dopo l'installazione dei 2 cantieri base prende avvio la FASE 1 con le aree di lavoro a Nord e a Sud. In particolare si procede con la realizzazione dei tombini e dei manufatti di regolazione, quindi con l'apertura dei nuovi canali e la realizzazione delle piste di servizio per l'accesso a tutte le aree di cantiere.

Ultimata la deviazione delle acque e la costruzione delle piste di servizio, si potrà dare inizio alle lavorazioni stradali propriamente dette.

FASE 2 – le attività nell'area Nord: avanzano i lavori dell'area #1.1 (Viadotto VI01, GA02, VI02, GA03, VI03, GA04, VI04 e svincoli n. 10 e 11) e #1.2 (svincolo n.05);

le attività nella area Sud: da Nord avanzano i lavori delle aree #2.1 (rilevato RI02 e RI03, svincolo n.11 e 11sud), e da Sud il cantiere #2.8 (RI06 e svincolo n.13, poi Ri35 con gli svincoli n. 25 e 39);

sempre nell'area sud: si sviluppano in serie i lavori #2.2 relativi al cavalcavia n. 16, i lavori #2.6 al cavalcavia n.17, i lavori #2.7 relativi alla trincea TR01.

FASE 3 – le attività nell'area Nord: si completano i lavori dell'area #1.1 (Viadotto VI01, GA02, VI02, GA03, VI03, GA04, VI04 e svincoli n. 10 e 11) e poi dell'area di lavoro #1.3 (rilevato RI01 e complanari RI28 e RI28a);

le attività nella area Sud: da Nord si completano i lavori delle aree #2.1 (rilevato RI02 e RI03, svincolo n.11 e 11sud), e da Sud il cantiere #2.5 (rilevato RI04, svincolo n. 12 e rilevato RI.5);

sempre nell'area sud: si sviluppano in serie i lavori i lavori #2.3 al ponte sulla Roggia Ticiniello, i lavori #2.4 relativi al ponte sul Naviglio di Bereguardo, mentre si completano i lavori #2.7 relativi alla trincea TR01.

Si fa notare che il cronoprogramma prevede che la consegna dei lavori sia preceduta da alcune attività preliminari che riguardano tra gli altri la risoluzione delle interferenze con le reti di servizi di vari gestori (RFI,Terna,) stimate in maniera diversa a seconda delle necessità del gestore.

2.5 LA DURATA DEI LAVORI

Il dettaglio delle lavorazioni di ciascuna area di lavoro è riportato all'interno della struttura nidificata con le relative durate e legami che determinano il cosiddetto "percorso critico" e la durata complessiva dei lavori.

A partire dalla consegna dei lavori la durata dei lavori complessiva è calcolata in **1100 giorni naturali e consecutivi**, che includono 145 giorni di andamento stagionale sfavorevole. Da questa tempistica sono esclusi i tempi per la preparazione delle aree (risoluzione interferenze e B.O.E.) e per le procedure di gara.
