

SEZIONE 1-1

SCALA 1 : 100

PROGRESSIVA 0+000.00
 AREA DI RITOMB. mq 14.78
 AREA TERR. VEG. mq 3.16

| SEZIONI | QUOTE | TERRENO |
|----------------|--------|---------|
| DIST. PARZIALI | 010.9 | 010.9 |
| | 3.93 | 010.91 |
| | 7.42 | 010.93 |
| | 7.42 | 010.95 |
| | 6.95 | 010.96 |
| | 010.96 | |

SEZIONE 2-2

SCALA 1 : 100

PROGRESSIVA 0+011.00
 AREA DI RITOMB. mq 110.94
 AREA TERR. VEG. mq 8.10

| SEZIONI | QUOTE | TERRENO |
|----------------|--------|---------|
| DIST. PARZIALI | 010.54 | 010.54 |
| | 6.45 | 010.55 |
| | 10.23 | 010.59 |
| | 10.18 | 010.72 |
| | 11.96 | 010.81 |
| | 010.81 | |

SEZIONE 3-3

SCALA 1 : 100

PROGRESSIVA 0+016.14
 AREA DI RITOMB. mq 106.75
 AREA TERR. VEG. mq 10.48


| SEZIONI | QUOTE | TERRENO |
|----------------|--------|---------|
| DIST. PARZIALI | 010.31 | 010.31 |
| | 6.18 | 010.31 |
| | 8.96 | 010.31 |
| | 6.62 | 010.31 |
| | 6.97 | 010.31 |
| | 010.31 | |

SEZIONE 4-4

SCALA 1 : 100


PROGRESSIVA 0+021.14
 AREA DI RITOMB. mq 25.81
 AREA TERR. VEG. mq 7.19

| SEZIONI | QUOTE | TERRENO |
|----------------|--------|---------|
| DIST. PARZIALI | 020.86 | 020.86 |
| | 7.25 | 020.86 |
| | 7.40 | 020.86 |
| | 2.96 | 020.86 |
| | 2.88 | 020.86 |
| | 020.86 | |

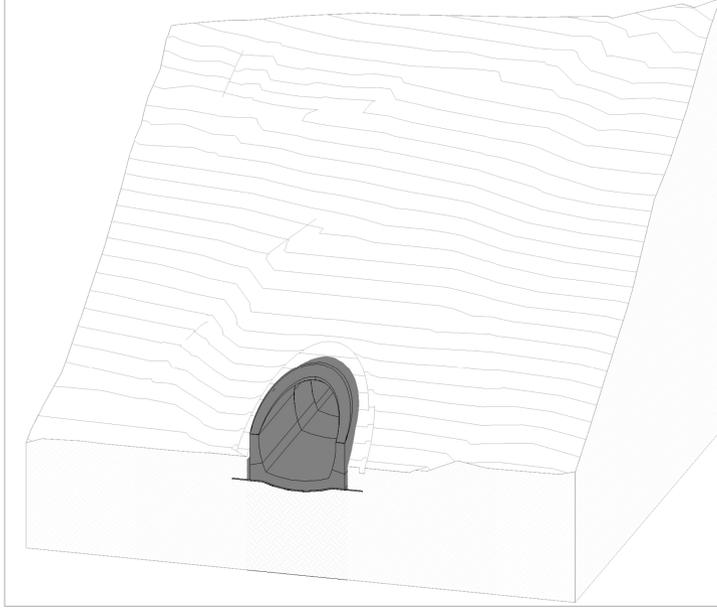


SCHEMA PLANIMETRICO

SCALA 1 : 200

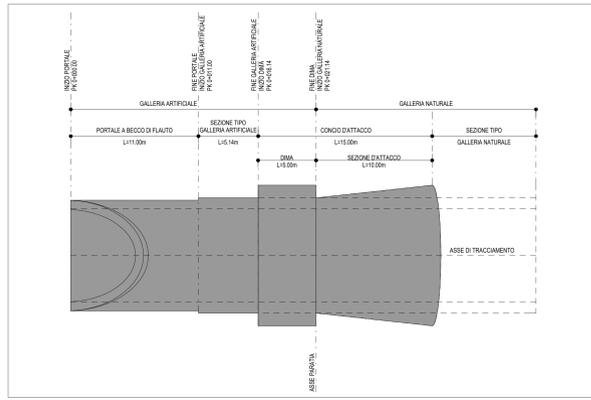

KEY-PLAN

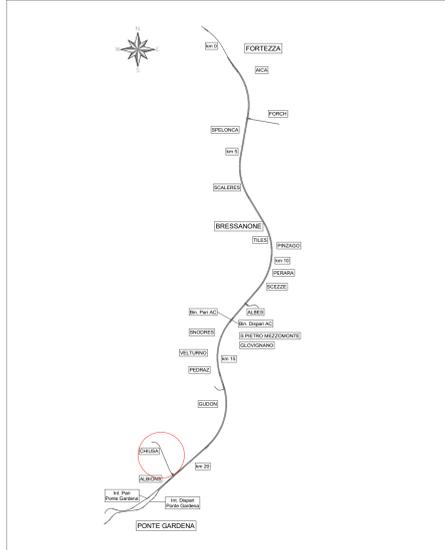

FASI ESECUTIVE

- FASE 1: Getto della galleria artificiale
- FASE 2: Installazione del giunto water stop con il portale
- FASE 3: Installazione dell'impermeabilizzazione in calotta e piedini
- FASE 4: Getto del portale a becco di falco
- FASE 5: Installazione dell'impermeabilizzazione in calotta e piedini
- FASE 6: Ritombamento con terreno di riporto e riprofilatura del terreno con pendenza max HV+3.2 in fino al congiungimento con il pendio naturale e sistemazione con terreno vegetale Sig. 30cm
- FASE 7: Realizzazione della canalotta di smaltimento acque al contorno del portale a becco di falco e collegamento con la rete di smaltimento acque di piazzale.

LEGENDA

- P.S. Piano di scavo
- P.R. Piano rotolamento
- P.C. Piano di centri



COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **webuild** **Impim** CONSORZIO DOLOMITI

PROGETTAZIONE: **SWS** **PINI** **GDF GEOMINI** **SISI** **IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. Paolo Cicero**

PROGETTO ESECUTIVO
 PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA "FORTEZZA - PONTE GARDENA"

DISEGNO
 08 - GALLERIE
 L-FINESTRA CHIUSA
 Imbocco
 Sistemazione definitiva - Sezioni Trasversali

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autografo/ Data |
|------|---------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| A | Emissione | M. Invernizzi | 20/12/21 | A. Valente | 21/12/21 | D. Bubbico | 22/12/21 | |
| B | Emissione per indicazione Committente | L. Giudice | 18/07/2022 | A. Valente | 18/07/2022 | D. Bubbico | 20/07/2022 | |
