



SITI DI PRODUZIONE ED UTILIZZO INTERNO

- Corpo Stradale - Scavi
- Corpo Stradale - Rilevati
- Aree di cantiere/Sito di deposito intermedio

SEMISVINCOLO	ELEMENTI/ PROVENIENZA SCAVI	SCAVI mc DI REIMPIEGHI PER FORMAZIONE DI RILEVATO E RIMODELLAMENTI	FABBISOGNI RILEVATI RITOMBAMENTI RIVESTIMENTI	REIMPIEGHI E APPROVVIGIONAMENTI				
				RIUTILIZZO INTERNO ALLA WBS DI PROVENIENZA		RIUTILIZZO ESTERNO ALLA WBS DI PROVENIENZA		APPROVVIGIONAMENTI DA CAVA
				DESTINAZIONE	mc	DESTINAZIONE	mc	
SUD	Rampa 1-2	30025	9090	Rampa 1-2	9090	Rampa 2-2 (Svincolo NORD)	20935	0
	Rotatoria A2	14727	575	Rotatoria A2	575	Rampa 2-2 (Svincolo NORD)	14152	0
	Dev SS19-Tratto 1	4588	1357	Dev SS19-Tratto 1	1357	Rampa 3-2 (Svincolo NORD)	3231	0
	Dev SS19-Tratto 2	2572	1118	Dev SS19-Tratto 2	1118	Rampa 2-2 (Svincolo NORD)	1454	0
	Dev str loc 1-2	6422	5376	Dev str loc 1-2	5376	Rotatoria C2 (Svincolo NORD)	1045	0
<b>TOTALE SUD</b>	<b>58333</b>	<b>17516</b>		<b>17516</b>			<b>40817</b>	<b>0</b>
NORD	Rampa 2-2	19619	62659	Rampa 2-2	19619			5113
	Rampa 3-2	0	14095	Rampa 3-2	0			10864
	Rotatoria B2	2829	1443	Rotatoria B2	1443			0
	Rotatoria C2	0	5292	Rotatoria C2	0	Rampa 2-2	1386	4347
	Rotatoria D2	0	2997	Rotatoria D2	0			581
	Dev SP241_Tratto 2-2	0	588	Dev SP241_Tratto 2-2	0			588
	Dev SP241_Tratto 3-2	3345	929	Dev SP241_Tratto 3-2	929			0
	Strada locale 4-2	0	1094	Strada locale 4-2	0	Rotatoria D2	2416	1004
<b>TOTALE NORD</b>	<b>25794</b>	<b>89097</b>		<b>21991</b>		<b>3803</b>	<b>22486</b>	

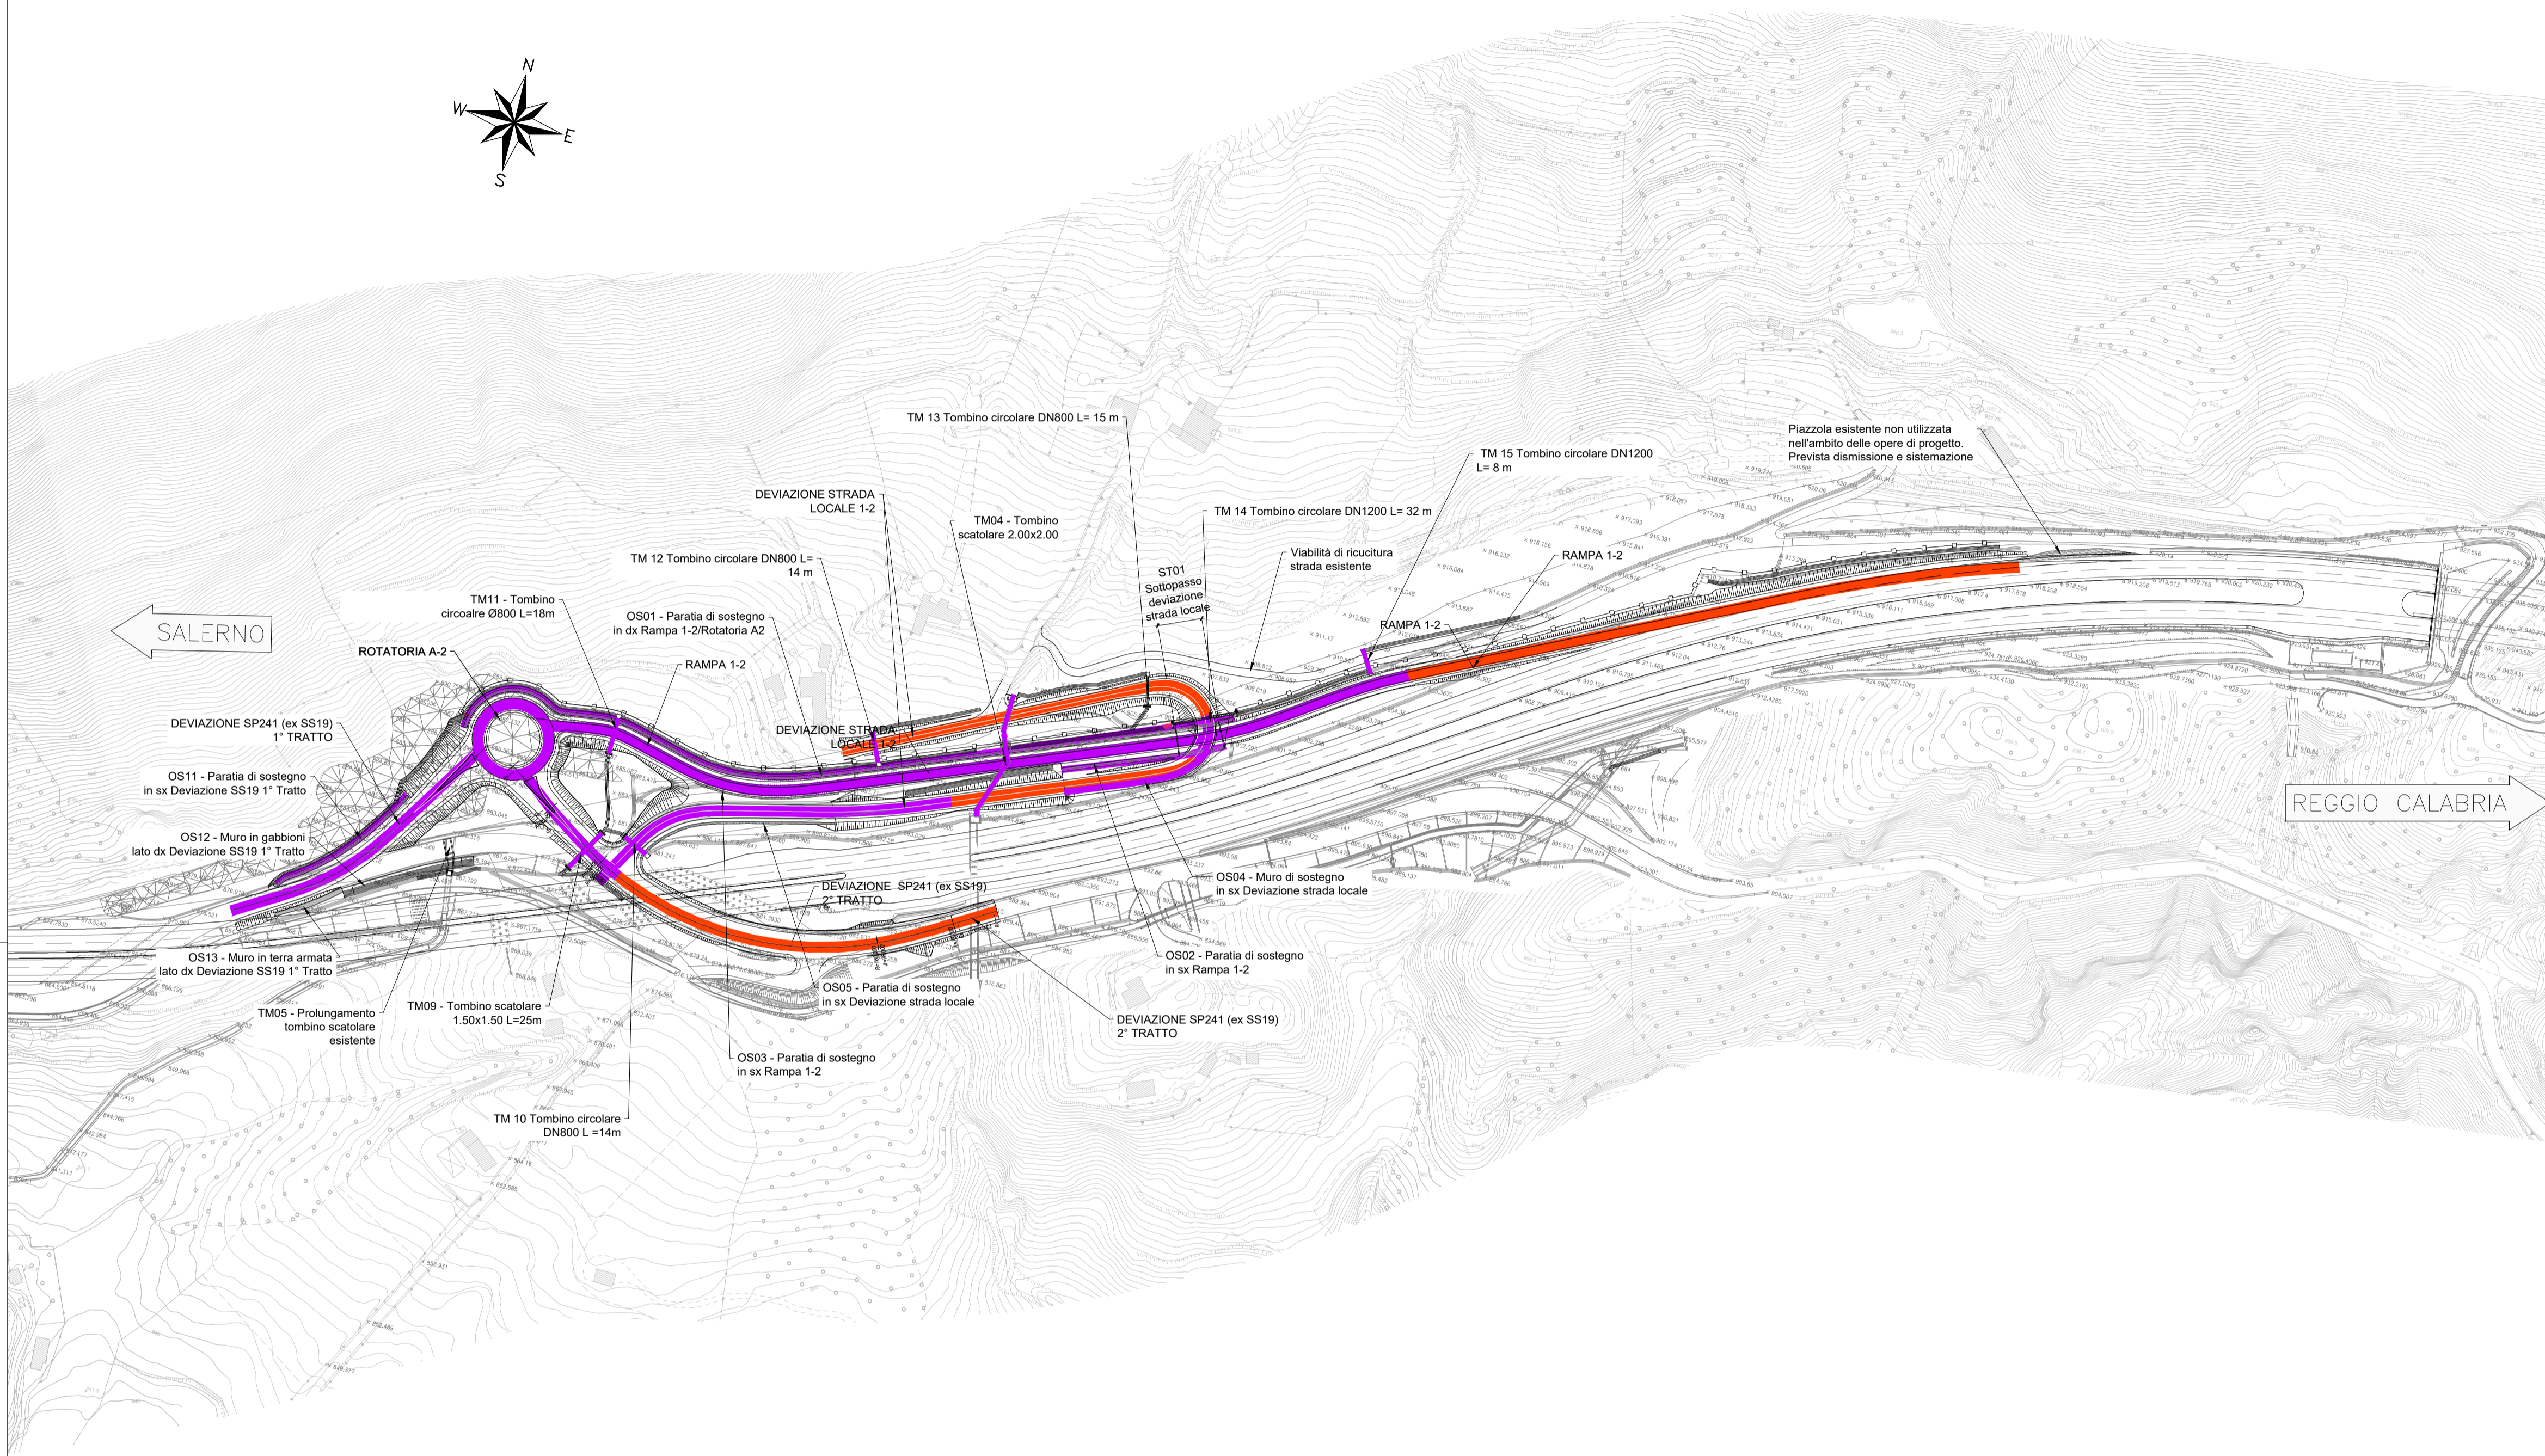

KEY-PLAN

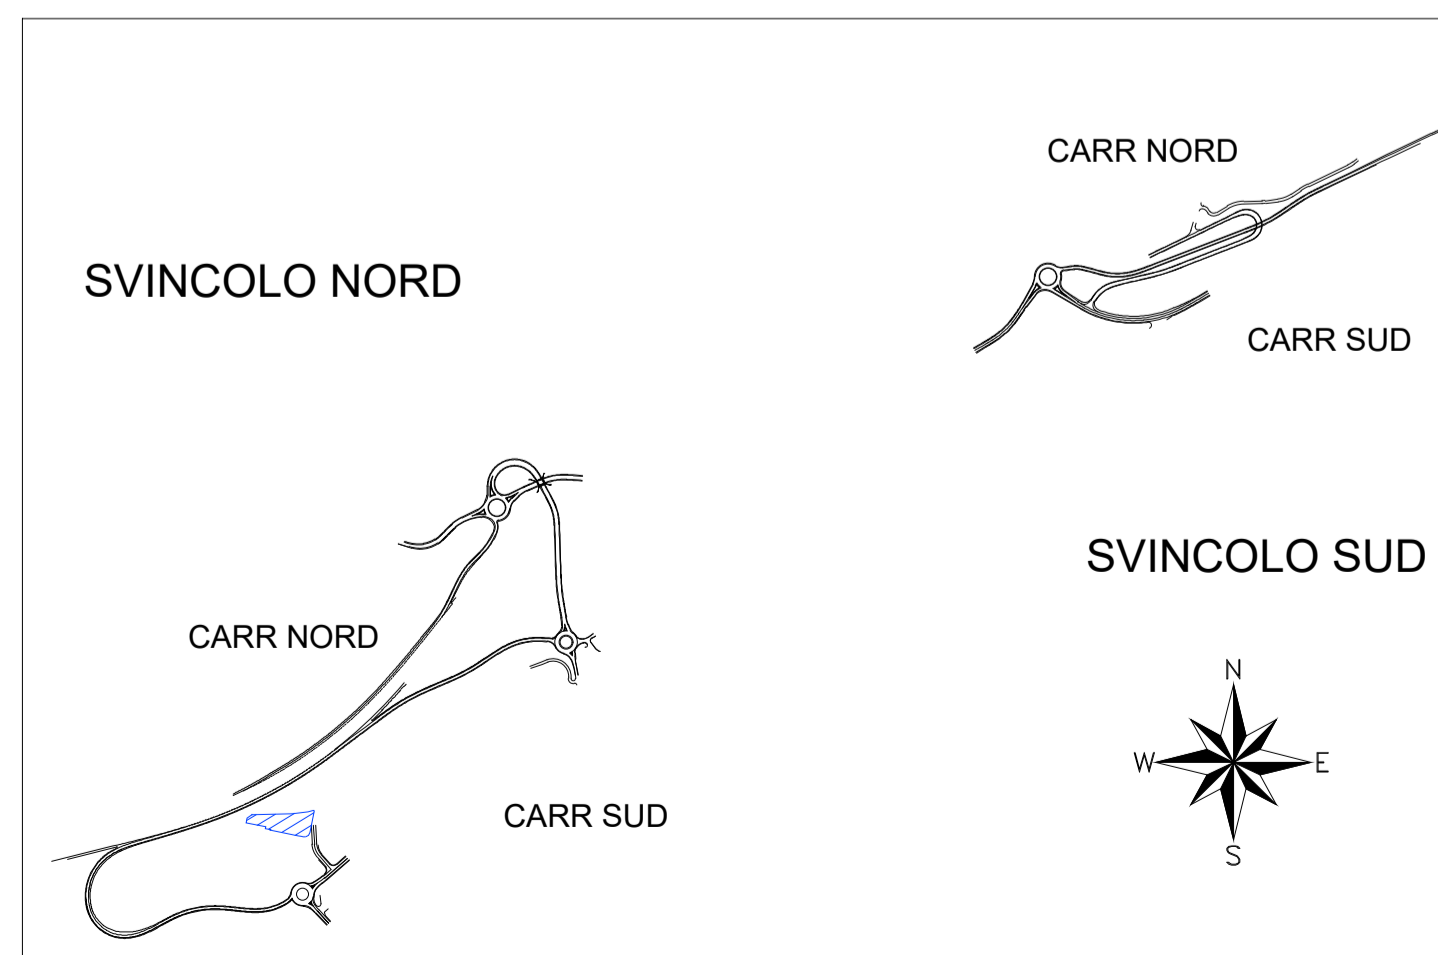

OPERE DI SOSTEGNO					
WBS	Tipologia	Semi-Svincolo	Rampa/Viabilità secondaria	Pk.	h SCAVO
OS01	Paratia di sostegno in dx	Semi-Svincolo Sud	Rampa 1-2	0+474 - 0+531 (n dx)	3,00-4,50
	Paratia di sostegno in dx	Semi-Svincolo Sud	Rampa 1-2	0+531 - 0+640	4,50-6,50
	Paratia di sostegno in dx	Semi-Svincolo Sud	Rampa 1-2	0+640 - 0+700 ca (n dx)	6,50-7,00
	Paratia di sostegno in dx	Semi-Svincolo Sud	Rampa 1-2	0+700 - 0+760 (n dx)	7,00-5,00
OS02	Paratia di sostegno in dx	Semi-Svincolo Sud	Rampa 1-2	0+760 - 0+836,2 (n dx)	5,00-7,00
	Paratia di sostegno in sx	Semi-Svincolo Sud	Rampa 1-2	0+474,0 - 0+531 (n sx)	4,00-6,00
OS03	Paratia di sostegno in sx	Semi-Svincolo Sud	Rampa 1-2	0+640,4 - 0+700 ca (n sx)	3,00-4,00
OS04	Paratia di sostegno in sx	Semi-Svincolo Sud	Rampa 1-2	0+700 - 0+760 (n dx)	4,00-5,00
OS05	Muri in c.a.	Semi-Svincolo Sud	Deviazione strada locale 1-2	0+200,8 e 0+276 (n sx)	1,00-2,50
OS06	Paratia di sostegno in dx	Semi-Svincolo Sud	Deviazione strada locale 1-2	0+388,4 e 0+489,3 (n sx)	3,00-5,00
OS07	Muri in c.a.	Semi-Svincolo Nord	Rampa 2-2	0+379,2 e 0+440,0 (n sx)	1,00-2,50
OS07	Terre rinforzate	Semi-Svincolo Nord	Rampa 2-2	0+820 - 1+15 (n dx)	1,00-2,50
ST01	Sottopasso	Semi-Svincolo Sud	Rampa 1-2	0+452,0 - 0+477,0 (rampa 1-2)	3,00-4,50
ST02	Sottopasso	Semi-Svincolo Nord	Rampa 2-2	1+106 (rampa 2-2)	1,00

**anas** Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

AUTOSTRADA A2 MEDITERRANEA  
NUOVO SVINCOLO DI MORMANNO

**PROGETTO DEFINITIVO** COD UC 162

PROGETTAZIONE: R.T.I.: PROGIN S.p.A. (capogruppo mandataria)  
CREW Cremonesi Workshop S.r.l - ART Risorse Ambiente Territorio S.r.l  
ECOPLAME S.r.l. - InArPRO S.r.l.

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Dott. Ing. Antonio GRIMALDI (Progin S.p.A.)

CAPOGRUPPO MANDATARIA: PROGIN S.p.A. Direttore Tecnico: Dott. Ing. Paolo IORIO

IL GEOLOGO: Dott. Geol. Giovanni CARRA (ART Ambiente Risorse e Territorio S.r.l.)

MANDANTI: CREW (Cremonesi Workshop S.r.l.) e ART (Ambiente Risorse e Territorio S.r.l.)

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Michele Curiale (Progin S.p.A.)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Antonio Citarella

ECOPLAME (Ambiente e Paesaggio) e InArPRO (Ingegneria Ambientale e Territoriale)

PROTOCOLLO: DATA: 20...

**CANTIERIZZAZIONE**

Planimetria ubicazione siti di produzione/utilizzo e aree di cantiere - Semisvincolo SUD

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
DP UC162 D20	T00CA00CANPL03.dwg	A	1:200
CODICE ELAB.	T00CA00CANPL03		

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	Emissione a seguito richiesta MISE	Aprile 2024	R. Scutto	P. Iorio	A. Grimaldi
