




Centrale Termoelettrica Piacenza

via Nino Bixio, 27/D  
29121 Piacenza  
Tel. 0523 668111  
Fax 0523 668400  
www.edipower.it



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2011 - 0016403 del 07/07/2011



Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali  
ex Divisione VI - Rischio Industriale - Prevenzione e Controllo Integrati dell'inquinamento

**Dott. Giuseppe Lo Presti**

Via C. Colombo, 44

00147 Roma

[dsa-ris@minambiente.it](mailto:dsa-ris@minambiente.it)

E p.c. Spett.le

ISPRA

Servizio interdipartimentale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo delle attività ispettive.

**Ing. Alfredo Pini**

Via V. Brancati, 48

00144 Roma

[controlli-aia@isprambiente.it](mailto:controlli-aia@isprambiente.it)

Piacenza, 30 giugno 2011 Prot. n. 4952

Raccomandata A.R.

Anticipata via mail

**Oggetto: ex DSA-DEC-2009-0000974 del 03/08/2009 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Edipower Spa sita in Piacenza (PC). Prescrizione di cui al paragrafo 10.5 del Parere Istruttorio. Aggiornamento stato di avanzamento lavori.**

Con riferimento alla nota DVA-2011-0002543 del 07/02/2011, trasmettiamo in allegato idonea documentazione che attesta lo stato di avanzamento delle opere relative all'attuazione della prescrizione di cui al paragrafo 10.5 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la centrale Edipower di Piacenza, con particolare evidenza per le attività realizzate dal 24/03/2011 ad oggi.

Con i migliori saluti.

**Edipower SpA**  
Centrale termoelettrica Piacenza

Gabriele Pastori

Allegati:

- ✓ documentazione fotografica relativa alle ulteriori opere realizzate dal 24.03.2011 al 30.06.2011;
- ✓ programma cronologico definitivo delle opere, con evidenza delle attività già completate.


Edipower spa - Sede legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano

Capitale sociale euro 1.441.300.000 i.v. - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano C.F. e P.I. 13442230150 - REA di Milano 1651649

**CENTRALE TERMOELETTRICA DI PIACENZA**

**Demolizione deposito oli combustibili**

**Appaltatore DESPE s.p.a.**

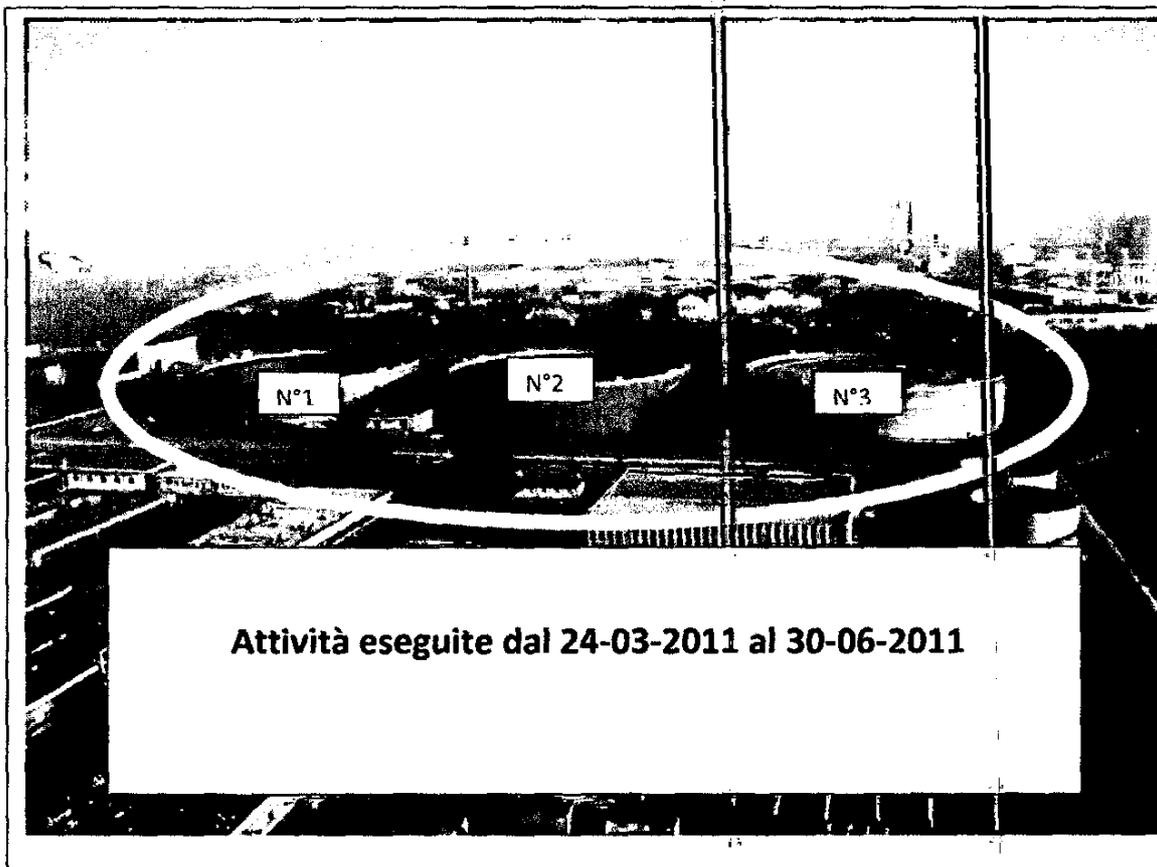


## **CRONOLOGIA ATTIVITA' DEL CANTIERE DAL 24-03-2011 AL 30-06-2011:**

- Attività di bonifica/demo canaline e vasche API: 07-02-2011 ÷ 30-06-2011
- Scoibentazione amianto (tubazioni bacino serbatoi): 23-11-2010 ÷ 20-05-2011
- Scoibentazione e demolizione sala pompe e serbatoi minori: 26-03-2011 ÷ 27-05-2011
- Demolizione manufatti in calcestruzzo piazzale ferro cisterne, preparazione fondo per reinterri con terreno di coltura: 20-04-2011 ÷ 18-06-2011
- Pulizia, scoibentazione e demolizione tubazioni OCD+vap da serbatoi 50.000 a serb. Giornalieri: 01-02-2011 ÷ 30-06-2011
- Pulizia, scoibentazione e demolizione tubazioni OCD+vap da serbatoi Giornalieri a sala macchine: 10-03-2011 ÷ 27-05-2011
- Pulizia, scoibentazione e demolizione tubazioni OCD+vap da stazione pompe a pontile: 21-03-2011 ÷ 29-04-2011
- Inizio sistemazione pavimentazione stradale zona baia scarico: 21-06-2011÷


**In sequenza foto cronologiche dei lavori eseguiti:**




**Bonifica/Demo vasca Api e canaline 7-02-2011 ÷ 30-06-2011**

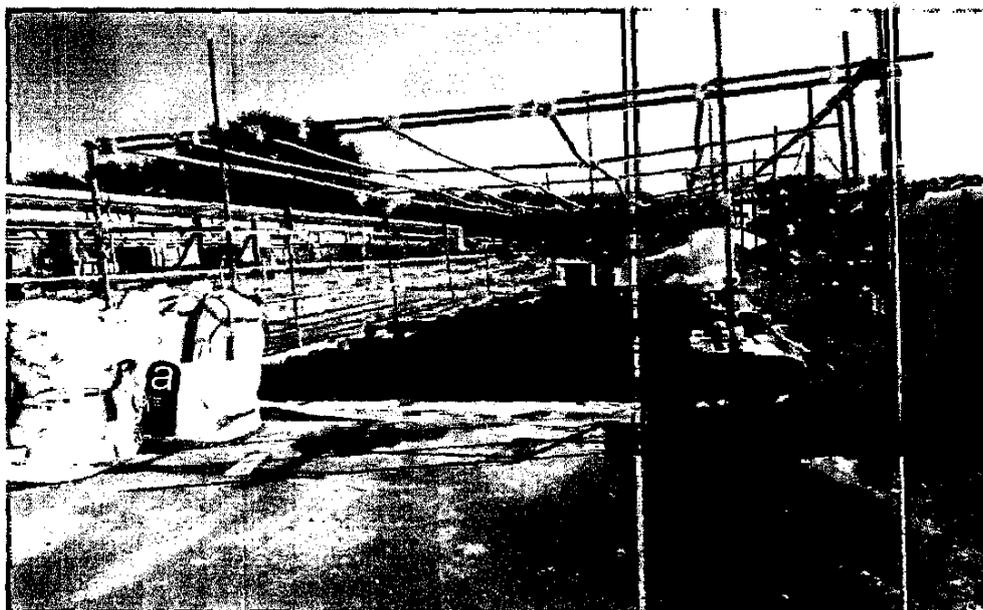

**Scoibentazione amianto-demolizione tubazioni bacino 23-11-2010 ÷ 20-05-2011**

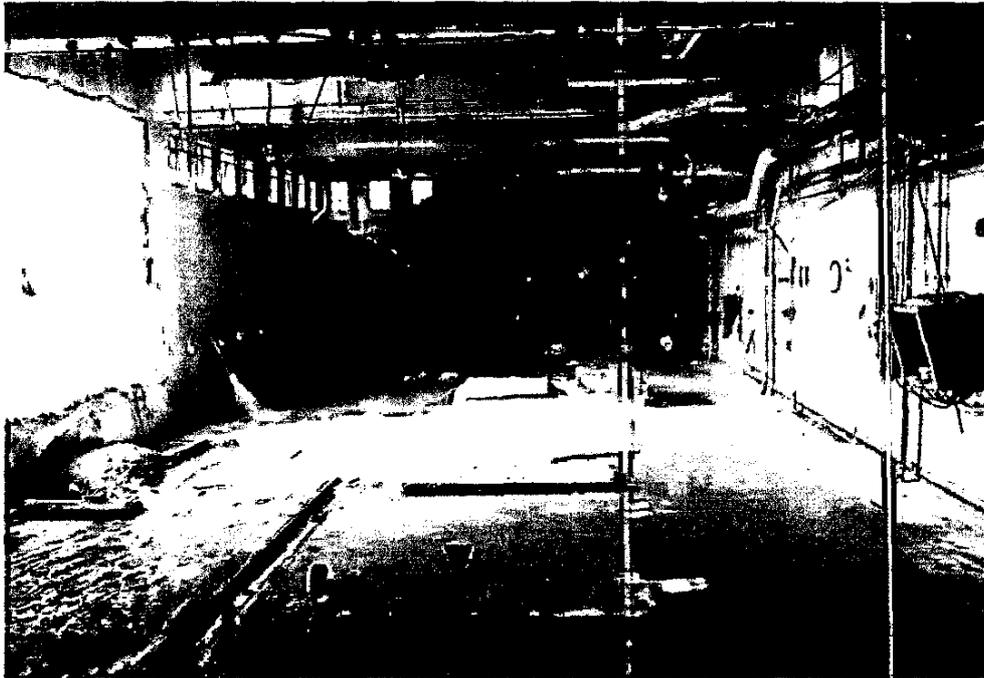


**Scoibentazione/Demolizione sala pompe e serbatoi minori, 26-03-2011 ÷ 27-05-2011**




**Baia di scarico ferrocisterne: demolizione manufatti calcestruzzo e regolarizzazione fondo con spaccato di ghiaia, per prossima creazione area verde**

20-04-2011 ÷ 18-06-2011

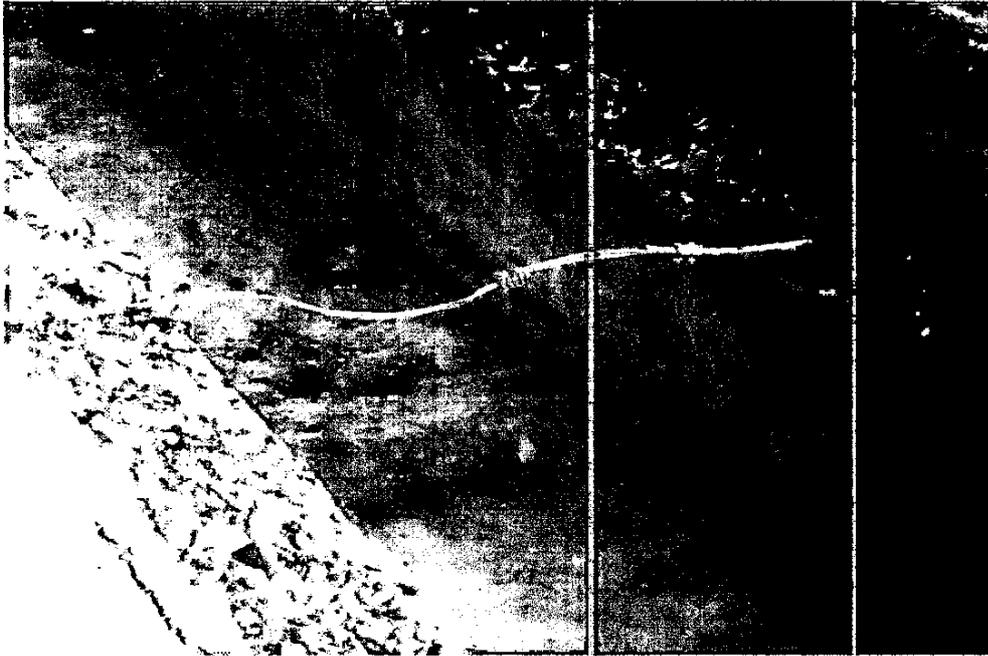


Scoibentazione/Demolizione tubazioni OCD da serb 50.000 a serb. Giornalieri

1-02-2011 ÷ 30-06-2011

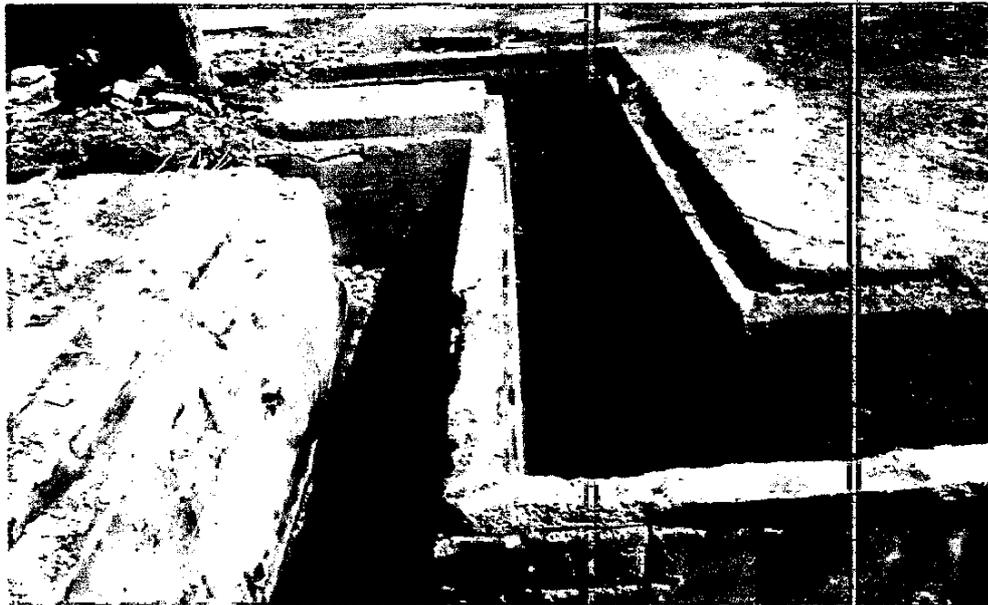

Demolizione tubazioni da serbatoi giornalieri a sala macchine

10-03-2011 ÷ 27-05-2011

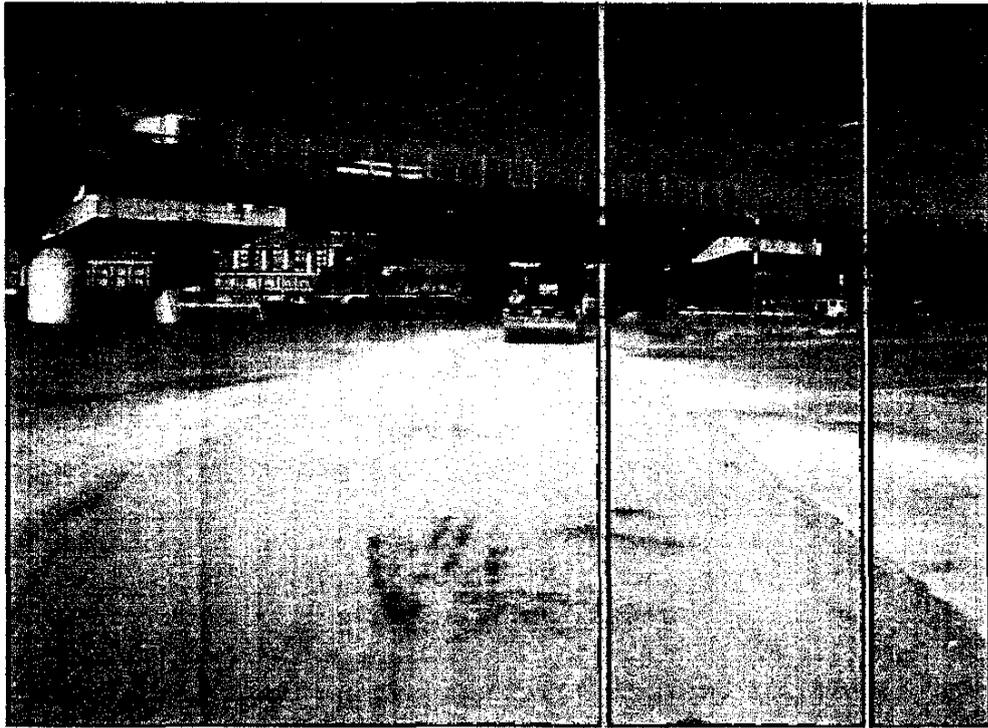

**Inizio sistemazione pavimentazione stradale zona baia scarico 21-06-2011 ÷**

MANIFATTURA IN MURAZIONE PARCO SERRATOI E RETE OCD

PROIEZIONE GANTT (29.06.2010)

Activity ID	Description	Duration	Start Date	End Date
A1000	Accatastamento	10	03-May-10A	14-May-10A
<b>PARCO SERRATOI</b>				
A1010	Autoregolazione della Demolizione	0	11-Aug-10A	
A1020	Sovberazione Serratoio 2	25	08-Jun-10A	23-Jul-10A
A1030	Sovberazione Tubazioni con fase Sep. 2	10	26-Jul-10A	06-Aug-10A
A1040	Preparazione e approvazione Piano di Lavoro Anziano	8	11-Aug-10A	20-Aug-10A
A1050	Rimozione guarnizione sede 2	35	17-Aug-10A	02-Sep-10A
A1060	Rimozione guarnizione sede 1	10	03-Sep-10A	13-Sep-10A
A1070	Rimozione guarnizione sede 3	10	16-Nov-10A	26-Nov-10A
A1075	Autoregolazione e sostituzioni serratoio	10	06-Sep-10A	16-Sep-10A
A1085	Sostituzione Fase liquida serratoio 1	25	25-Oct-10A	05-Nov-10A
A1090	Sostituzione Fase liquida serratoio 3	30	28-Oct-10A	11-Nov-10A
A1100	Sostituzione e pulizia Tubazioni Radio 1	20	25-Oct-10A	12-Feb-11A
A1110	Sostituzione e pulizia Tubazioni Radio 2	10	25-Oct-10A	15-Dec-10A
A1120	Sostituzione e pulizia Tubazioni Radio 3	15	13-Jan-11A	03-Feb-11A
A1130	Pulizia sala pompe e serratoio in inox	10	17-Jan-11A	25-Feb-11A
A1140	Pulizia canali ne e vasche API	26	07-Feb-11A	30-Jan-11A
A1150	Sostituzione Anziano (Serratoio, broni serratoio)	12	01-Dec-10A	20-Dec-10A
A1160	Sostituzione Anziano 2 (Serratoio, broni serratoio)	39	23-Nov-10A	20-May-11A
A1170	Sostituzione Tubazioni con fase Sep. 1	10	13-Jan-11A	26-Jan-11A
A1180	Sostituzione Tubazioni con fase Sep. 3	80	23-Aug-10A	08-Oct-10A
A1190	Demolizione Serratoio 2 TETI O E PARETI	41	28-Apr-11A	24-Jun-11A
A1195	Demolizione Serratoio 2 FONDO	10	03-Feb-11A	16-Feb-11A
A1200	Rimozione Marche e Demolizione serratoio 1	55	20-Dec-10A	04-Mar-11A
A1210	Rimozione Marche e Demolizione serratoio 3	55	12-Nov-10A	31-Jan-11A
A1220	Demolizione varie tubazioni, pompe, pannelli, etc.)	102	05-Feb-11A	27-May-11A

SCARICO FERROSTIERNE


A1230	Rimozione concretizzazioni	31	17-Dec-10A	10-Jan-11A
A1240	Apertura canali	35	04-Jan-11A	24-Jan-11A
A1250	Sostituzione Tubazioni Ferrosterne fase 1	35	24-Jan-11A	30-Jan-11A
A1260	Pulizia tubazioni laterali	30	25-Jan-11A	13-Feb-11A
A1270	Sostituzione Tubazioni Ferrosterne fase 2	45	30-Jan-11A	14-Feb-11A
A1275	Demolizione Tubazioni Ferrosterne	30	14-Feb-11A	04-Mar-11A
A1280	Pulizia canali laterali	45	20-Apr-11A	13-Jan-11A

RETE DI DISTRIBUZIONE OCD COIBENTATA DI AMIANTO

A1300	Apertura canali fase 1	30	01-Feb-11A	20-Apr-11A
A1310	Sostituzione e pulizia tubazioni OCD fase 1	31	10-Feb-11A	15-Apr-11A
A1320	Sostituzione tubazioni OCD fase 1	31	01-Apr-11A	13-May-11A
A1330	Demolizione tubazioni OCD fase 1	29	20-Apr-11A	30-Jun-11
A1340	Realizzo e ripristino pavimentazione fase 1	22	30-Jun-11	29-Jul-11
A1350	Apertura canali fase 2	30	10-Mar-11A	01-Apr-11A
A1360	Sostituzione e pulizia tubazioni OCD fase 2	12	24-Mar-11A	08-Apr-11A
A1370	Sostituzione tubazioni OCD fase 2	15	15-Apr-11A	29-Apr-11A
A1380	Demolizione tubazioni OCD fase 2	15	25-Apr-11A	27-May-11A
A1390	Realizzo e ripristino pavimentazione fase 2	22	30-Jun-11	29-Jul-11
A1400	Apertura canali fase 3	24	21-Mar-11A	14-Apr-11A
A1410	Sostituzione e pulizia tubazioni OCD fase 3	12	11-Apr-11A	15-Apr-11A
A1420	Sostituzione tubazioni OCD fase 3	15	15-Apr-11A	20-Apr-11A
A1430	Demolizione tubazioni OCD fase 3	8	20-Apr-11A	29-Apr-11A
A1440	Realizzo e ripristino pavimentazione fase 3	44	21-Jun-11A	15-Aug-11

INCONTINERE

A1450	Sostituzione serratoio casella	25	03-Aug-11	06-Sep-11
-------	--------------------------------	----	-----------	-----------

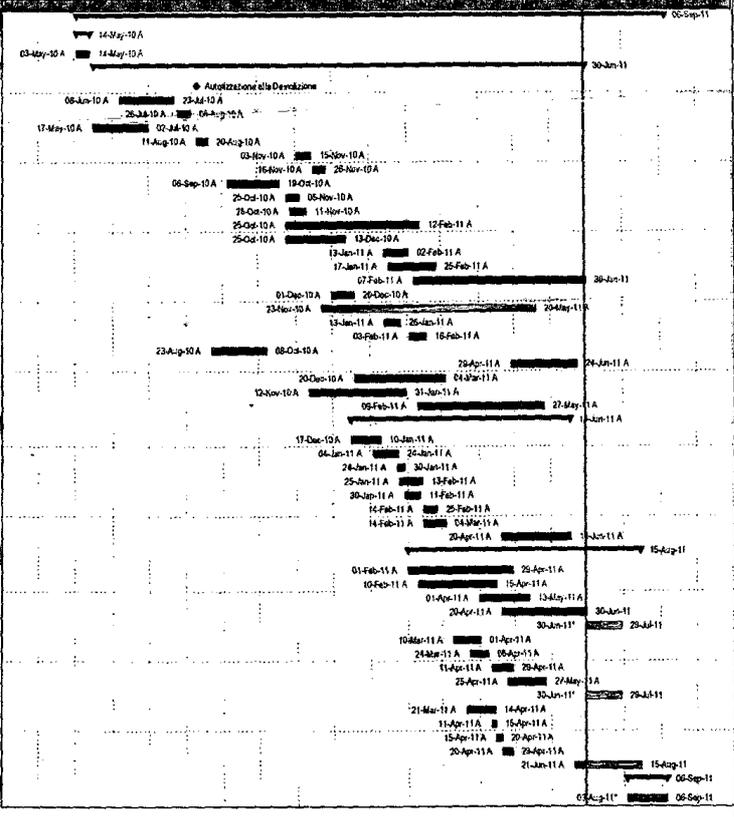

Remaining Level of Effort   
  Actual Work   
  Critical Remaining Work   
  Summary   
  Actual Level of Effort   
  Remaining Work   
  Milestone   
  WBS Summary Activity

Page 1 of 1      TASK filter: All Activities      © Oracle Corporation

## Casano Luana

---

**Da:** Pastori Gabriele [Gabriele.Pastori@edipower.it]  
**Inviato:** mercoledì 6 luglio 2011 17.50  
**A:** DVA-IV  
**Oggetto:** Edipower: anticipo invio lettera del 30\_6\_2011  
**Allegati:** lett 30\_6\_2011.pdf



lett 30\_6\_2011.pdf  
(2 MB)

Con la presente si anticipa l'invio della lettera prot. 4952 del 30/6/2011.

Cordiali saluti

Gabriele Pastori  
Edipower S.p.A.  
Centrale di Piacenza

Edipower La invita a prendere visione del Rapporto di Sostenibilita'. Con tale pubblicazione la Societa' intende attivare un canale di comunicazione chiaro e trasparente con i propri interlocutori.

Per visualizzare il rapporto attivare il seguente link:  
[http://www.edipower.it/rapporto\\_sostenibilita.htm](http://www.edipower.it/rapporto_sostenibilita.htm)

-----  
[disclaimer]

Questa e-mail potrebbe contenere informazioni confidenziali e riservate di proprieta' Edipower S.p.A. Nel caso il ricevente non fosse l'esatto destinatario o avesse ricevuto questo messaggio per errore e' pregato di notificarlo immediatamente al mittente e cancellare questa e-mail. La copia e/o la diffusione del materiale contenuto in questa e-mail senza previo accordo con Edipower S.p.A. e' vietata.

This e-mail may contain confidential and privileged information, property of Edipower S.p.A. If you are not the intended recipient, or have received this e-mail by mistake, please notify immediately the sender, and destroy this e-mail. Copy, disclosure or distribution of the material in this e-mail without previous permission of Edipower S.p.A. is strictly forbidden.  
-----

