


MACROFASE 4 - FASE 4a - 45 gg

INIZIO VARIANTE "FALCONARA".
 Progr. km 0+000.00
 Linea Rimini-Ancona Km.191+160.00

FINE VARIANTE "FALCONARA".
 Progr. km 5+628.00
 Linea Rimini Ancona km 196+520.95

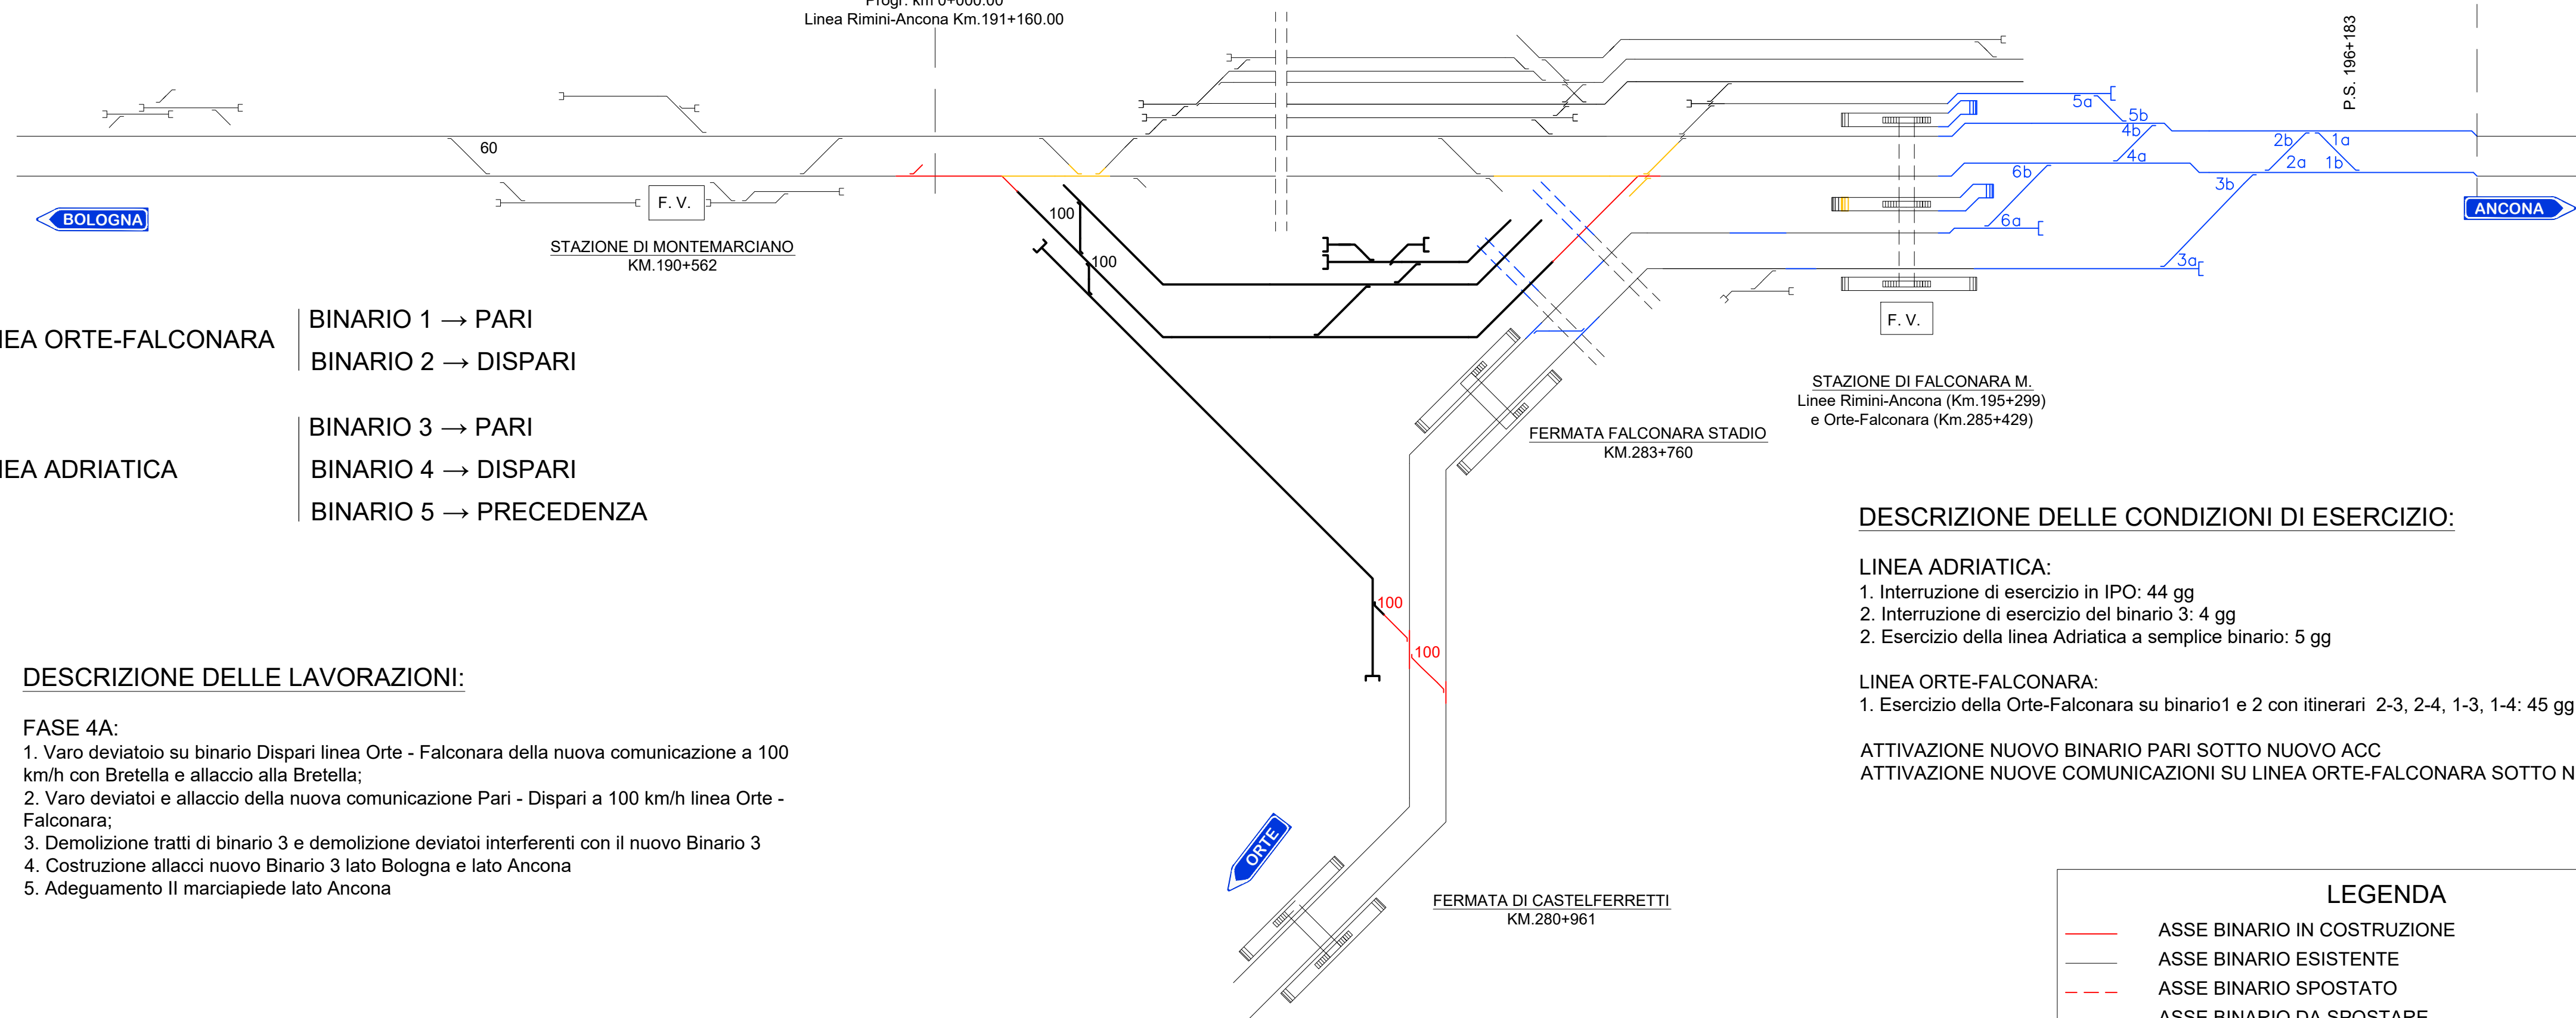

- LINEA ORTE-FALCONARA
- BINARIO 1 → PARI
 - BINARIO 2 → DISPARI
- LINEA ADRIATICA
- BINARIO 3 → PARI
 - BINARIO 4 → DISPARI
 - BINARIO 5 → PRECEDENZA

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI:

- FASE 4A:**
1. Varo deviatoio su binario Dispari linea Orte - Falconara della nuova comunicazione a 100 km/h con Bretella e allaccio alla Bretella;
 2. Varo deviatoi e allaccio della nuova comunicazione Pari - Dispari a 100 km/h linea Orte - Falconara;
 3. Demolizione tratti di binario 3 e demolizione deviatoi interferenti con il nuovo Binario 3
 4. Costruzione allacci nuovo Binario 3 lato Bologna e lato Ancona
 5. Adeguamento Il marciapiede lato Ancona

DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO:

- LINEA ADRIATICA:**
1. Interruzione di esercizio in IPO: 44 gg
 2. Interruzione di esercizio del binario 3: 4 gg
 2. Esercizio della linea Adriatica a semplice binario: 5 gg
- LINEA ORTE-FALCONARA:**
1. Esercizio della Orte-Falconara su binario1 e 2 con itinerari 2-3, 2-4, 1-3, 1-4: 45 gg
- ATTIVAZIONE NUOVO BINARIO PARI SOTTO NUOVO ACC**
ATTIVAZIONE NUOVE COMUNICAZIONI SU LINEA ORTE-FALCONARA SOTTO NUOVO ACC

LEGENDA	
—	ASSE BINARIO IN COSTRUZIONE
—	ASSE BINARIO ESISTENTE
- - -	ASSE BINARIO SPOSTATO
- - -	ASSE BINARIO DA SPOSTARE
—	ASSE BINARIO/OPERE IN DEMOLIZIONE
—	ASSE BINARIO COSTRUITO IN FASE PRECEDENTE
—	ASSE BINARIO PROVVISORIO

COMMITTENTE:



RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE INVESTIMENTI - S.O. PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

U.O. : AREA OPERATIVA CENTRO SUD
 PM Nodi di Roma e Falconara, Orte - Falconara e Bologna - Falconara

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA: ADRIATICA
INTERVENTO: VARIANTE DI FALCONARA

CA - CANTIERIZZAZIONE
Esercizio
Schematico - Macrofase 4 a

APPALTATORE	IL PROGETTISTA	SCALA
		
IL DIRETTORE TECNICO Ing. Fabio Sgarrella		

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IA1Y	00	E	ZZ	DX	CA2100	006	D

PROGETTAZIONE							IL PROGETTISTA
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	Prima emissione	A. Casini	28/11/2016	F. Gaeta	29/11/2016	A. Nastasi	30/11/2016
B	Rec. istruttoria del 13.03.2017	A. Casini	06/04/2017	A. Nastasi	07/04/2017	G. Tanzi	10/04/2017
C	Rec. Rdv	F. Sgarrella	05/06/2017	A. Nastasi	05/06/2017	G. Tanzi	05/06/2017
D	Rec. Rdv	F. Sgarrella	20/06/2017	A. Nastasi	20/06/2017	G. Tanzi	20/06/2017

Data: 20/06/2017
