


MACROFASE 4 - FASE 4c - 45 gg

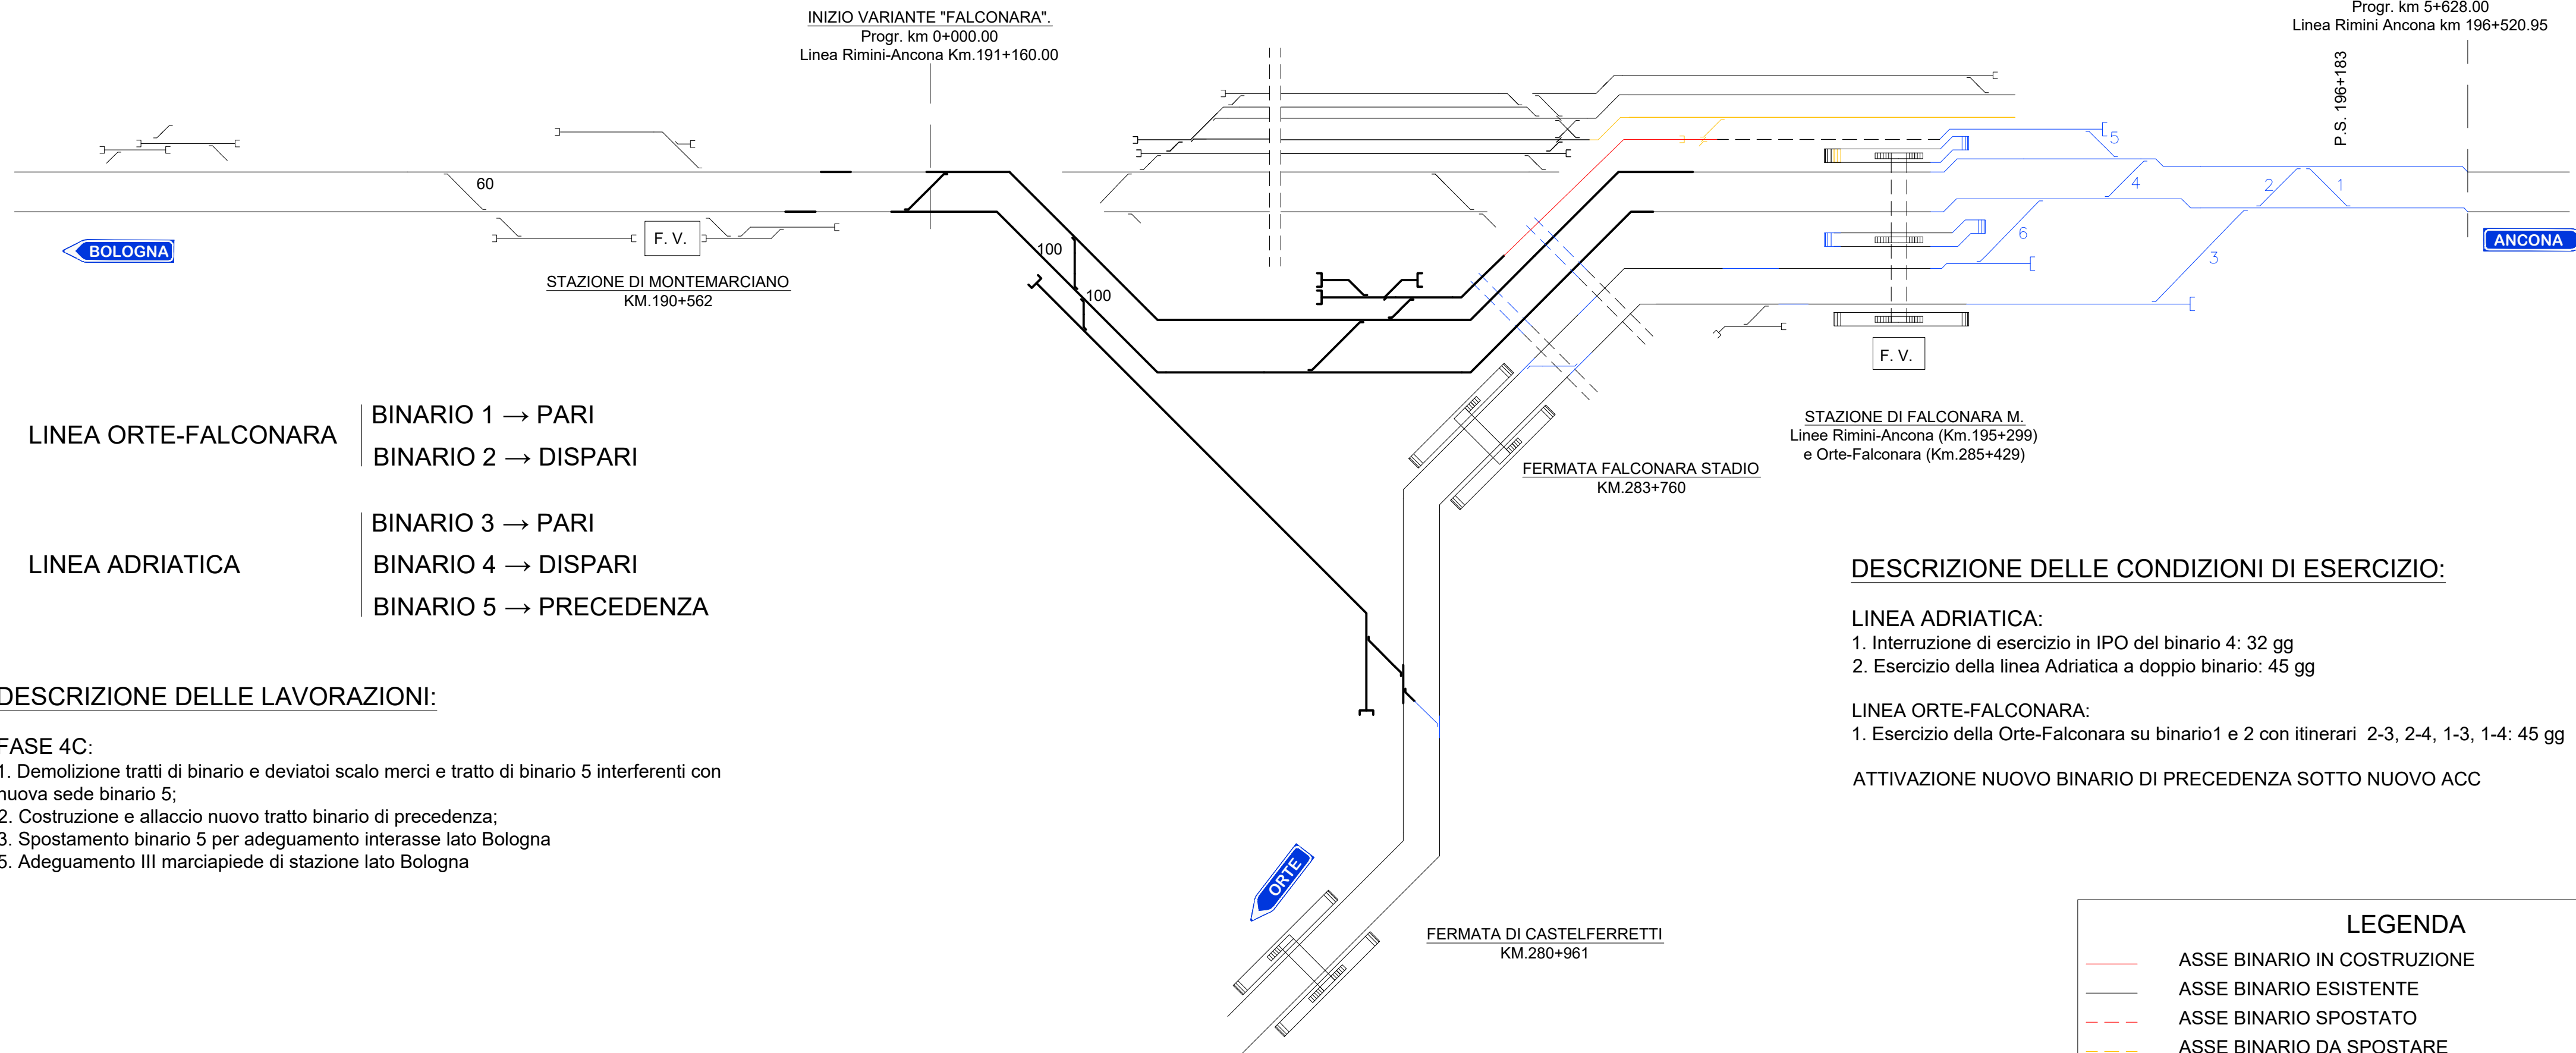

- LINEA ORTE-FALCONARA
- BINARIO 1 → PARI
 - BINARIO 2 → DISPARI
- LINEA ADRIATICA
- BINARIO 3 → PARI
 - BINARIO 4 → DISPARI
 - BINARIO 5 → PRECEDENZA

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI:

FASE 4C:

1. Demolizione tratti di binario e deviatori scalo merci e tratto di binario 5 interferenti con nuova sede binario 5;
2. Costruzione e allaccio nuovo tratto binario di precedenza;
3. Spostamento binario 5 per adeguamento interasse lato Bologna
5. Adeguamento III marciapiede di stazione lato Bologna

DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO:

LINEA ADRIATICA:

1. Interruzione di esercizio in IPO del binario 4: 32 gg
2. Esercizio della linea Adriatica a doppio binario: 45 gg

LINEA ORTE-FALCONARA:

1. Esercizio della Orte-Falconara su binario 1 e 2 con itinerari 2-3, 2-4, 1-3, 1-4: 45 gg

ATTIVAZIONE NUOVO BINARIO DI PRECEDENZA SOTTO NUOVO ACC

LEGENDA

- ASSE BINARIO IN COSTRUZIONE
- ASSE BINARIO ESISTENTE
- - - ASSE BINARIO SPOSTATO
- - - ASSE BINARIO DA SPOSTARE
- ASSE BINARIO/OPERE IN DEMOLIZIONE
- ASSE BINARIO COSTRUITO IN FASE PRECEDENTE
- ASSE BINARIO PROVVISORIO

COMMITTENTE:



DIREZIONE INVESTIMENTI - S.O. PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:



U.O. : AREA OPERATIVA CENTRO SUD

PM Nodi di Roma e Falconara, Orte - Falconara e Bologna - Falconara

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA: ADRIATICA
INTERVENTO: VARIANTE DI FALCONARA

CA - CANTIERIZZAZIONE

Esercizio

Schematico - Macrofase 4 c

| APPALTATORE | IL PROGETTISTA | SCALA |
|--|----------------|-------|
| | | - |
| IL DIRETTORE TECNICO Ing. Fabio Sgarrella | | - |

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. |
|----------|-------|------|------|-----------|------------------|--------|------|
| IA1Y | 00 | E | ZZ | DX | CA2100 | 016 | B |

| PROGETTAZIONE | | | | | | | IL PROGETTISTA | |
|---------------|---------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|----------------------|
| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Ing. Giancarlo Tanzi |
| A | Rec. istruttoria del 13.03.2017 | A. Casini | 06/04/2017 | A. Nastasi | 07/04/2017 | G. Tanzi | 10/04/2017 | Data: 20/06/2017 |
| B | Rec. Rdv | F. Sgarrella | 20/06/2017 | A. Nastasi | 20/06/2017 | G. Tanzi | 20/06/2017 | |
| | | | | | | | | |

CIG. 5512584838

CUP: J41C0700000001

File: IA1Y-00-E-ZZ-DX-CA2100-016_B.dwg
