

QUADRILATERO
S.p.A. - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma

Sede Operativa - Alta Sorveglianza III.2
Via Dante Alighieri, 270
60044 FABRIANO (AN)

A.S. MAXILOTTO 2		
M. Prot. 1018		
Data 26.11.13		
FUNZ.	ASS.	AZIONE
R.A.S.		
PROG.		
P.C.		
Q.		
SIC.		
AMB.		
G.EOL.	x	
ES-I.		
CANL.		
ESGR.		

Protocollo n. 12894-13

Roma li. 19.11.2013

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo,44
00147 ROMA
Alla c.a. Ing. Mauro Patti

PEC: dirpascau@legadnall.it

E, p.c.: Spett.le DIRPA S.c.a.r.l.
In Amministrazione Straordinaria
(D.L. 347/03)
Via Dante Alighieri 270/D
60044 FABRIANO (AN)

PEC: dirpascau@legadnall.it

Spett.le DIRPA S.c.a.r.l.
In Amministrazione Straordinaria
(D.L. 347/03)
Alla c.a. del Commissario Straordinario
Prof.ssa Daniela SAITTA
Via Catania 9
00161 ROMA

Raccomandata a mano

Egr. Direttore dei Lavori
Ing. Fulvio Giovannini
Ufficio Direzione Lavori
Via Dante Alighieri 270/D
60044 FABRIANO (AN)
Fax: 0732/232915

OGGETTO: Opera strategica "Asse viario Marche Umbria - Quadrilatero di penetrazione".
Maxi Lotto n. 2: lavori di completamento della direttrice Perugia - Ancona tramite
realizzazione della SS 318 "di Valfabbrica", tratto Planello - Valfabbrica, della SS 76 "Val
d'Esino", tratti Fossato di Vico - Cancelli e Albacina - Serra San Quirico e realizzazione della
"Pedemontana delle Marche", tratto Fabriano - Muccia/Sfercia (CUP F12C03000050020).
Contratto rep. N. 59059 del 23/06/2006 e successivi Atti Aggluntivi.
Trasmissione documentazione richiesta con nota CTVIA 422/2012.
(Rif. nota QMU 8768-12 del 16/02/2012 e Verbale di riunione VIAS in data 07/11/2013).

Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. - Soggetta alla direzione o al coordinamento dell'Anas S.p.A.
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma
Capitale Sociale euro 60.000.000,00 di cui versati euro 38.701.500,00
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07555981005 R.E.A. 1039626
Tol. +39 06845601 - Fax +39 0684560549 - quadrilatero.s.p.a@postacert.stradeanas.it


RINA

Con riferimento alla nota della scrivente Società prot. 8768-12 del 16/02/2012 e a quanto concordato nell'incontro di cui al verbale riportato in oggetto, si invia copia della seguente documentazione :


- Nota di sintesi relativa alla Delibera della Regione Marche DGR n. 1771/2008;
- Nomina del Referente Ambientale;
- Nomina del Responsabile Ambientale;
- Cronoprogrammi del Sub Lotti 1.1. e 1.2 in corso di esecuzione.

Distinti saluti.

II. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Vincenzo Lomma



**II. RESPONSABILE DEL PROGETTO
DI INFRASTRUTTURAZIONE VIARIA**
Ing. Andrea Silionni



Allegati: c.s.

Activity ID	Description	Duration (days)	Start	End	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-------------	-------------	-----------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------

Activity ID	Description	Duration (days)	Start	End	2011	2012	2013	2014	2015	2016
11PED.1.1.00	ASPERTURALE TRAFFICO NUOVA S.S.76 LOTTO 1,1,1	0	18-Mar-12	31-Mar-15						
211.1.1.90	FINE LAVORI SUB LOTTO 1,1	0	30-Nov-15							
11PED.1.1.01	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	1365	15-Jul-10A	30-Nov-15						
11PED.1.1.02	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	0	18-Mar-12							
11PED.1.1.03	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	0	29-Feb-12	29-Feb-12						
11PED.1.1.04	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	1536	15-Jul-10A	30-Nov-15						
11PED.1.1.05	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	1536	15-Jul-10A	30-Nov-15						
11PED.1.1.06	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	204	17-Aug-12	06-Mar-13						
11PED.1.1.07	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	1697	15-Jul-10A	07-Mar-15						
11PED.1.1.08	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	1570	15-Jul-10A	31-Jul-15						
11PED.1.1.09	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	1539	15-Jul-10A	31-Jul-15						
11PED.1.1.10	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	1478	15-Jul-10A	31-Jul-15						
11PED.1.1.11	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	1615	01-Sep-10A	01-Feb-15						
11PED.1.1.12	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	1636	15-Jul-10A	05-Jan-15						
11PED.1.1.13	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	1536	15-Jul-10A	05-Jan-15						
11PED.1.1.14	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	1701	01-Aug-10A	29-Mar-15						
11PED.1.1.15	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	818	01-Aug-10A	28-Oct-12						
11PED.1.1.16	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	638	20-Aug-12	16-Feb-14						
11PED.1.1.17	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	484	26-Nov-13	24-Mar-15						
11PED.1.1.18	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	239	03-Jan-14	28-Mar-15						
11PED.1.1.19	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	1431	20-Mar-11A	17-Feb-15						
11PED.1.1.20	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	1189	01-Oct-10A	11-Jun-14						
11PED.1.1.21	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	686	15-Nov-10A	21-Mar-14						
11PED.1.1.22	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	1876	16-Sep-10A	04-Nov-15						
11PED.1.1.23	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	843	16-Sep-10A	05-Jan-15						
11PED.1.1.24	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	574	17-Jan-12	11-Jun-14						
11PED.1.1.25	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	429	23-Dec-13	24-Feb-15						
11PED.1.1.26	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	227	23-Jun-14	20-Feb-15						
11PED.1.1.27	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	111	17-Jul-15	04-Nov-15						
11PED.1.1.28	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	971	15-Apr-12	11-Dec-14						
11PED.1.1.29	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	899	17-Jul-12	15-Jun-14						
11PED.1.1.30	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	482	07-Aug-11A	24-Nov-12						
11PED.1.1.31	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	107	01-Apr-15	16-Jul-15						
11PED.1.1.32	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	1180	28-Sep-12	29-Nov-15						
11PED.1.1.33	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	63	26-Sep-12	27-Nov-12						
11PED.1.1.34	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	46	12-Feb-15	29-Mar-15						
11PED.1.1.35	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	178	06-Feb-14	02-Aug-14						
11PED.1.1.36	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	33	26-Feb-15	30-Mar-15						
11PED.1.1.37	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	82	06-Jan-15	30-Mar-15						
11PED.1.1.38	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	56	05-Oct-15	29-Nov-15						
11PED.1.1.39	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	155	17-Dec-13	20-Mar-14						
11PED.1.1.40	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	73	20-Nov-12	06-Feb-13						
11PED.1.1.41	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	68	01-Jun-15	07-Aug-15						
11PED.1.1.42	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	30	22-Mar-13	07-Aug-13						
11PED.1.1.43	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	403	21-Apr-13	28-Mar-14						
11PED.1.1.44	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	167	17-Dec-12	01-Jun-13						
11PED.1.1.45	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	116	26-Nov-12	21-Mar-13						
11PED.1.1.46	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	910	17-Jun-12	13-Dec-14						
11PED.1.1.47	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	225	02-Oct-13	13-Jun-14						
11PED.1.1.48	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	183	14-Jun-14	13-Dec-14						
11PED.1.1.49	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	740	17-Jun-12	26-Jun-14						
11PED.1.1.50	OPERE IDRAULICHE, TOMBINI CIRCOLARI E INALVEAZIONI	45	02-Aug-15	19-Sep-15						

Actual Work Critical Pathmaking Work Remaining Work Milestone






QUADRILATERO

SS 318 - Perizia di Variante n.3 (ID: 12PED)


Attività ID Osservazione Data inizio Data fine

Attività ID	Osservazione	Data inizio	Data fine
1212.1.01	Completazione dell'approvazione della perizia	0	18-Dec-12*
1212.1.02	Fine lavori Tronco I*	0	20-Dec-13*
1212.1.03	Fine lavori Tronco II*	0	22-Apr-14*

Attività ID	Osservazione	Data inizio	Data fine
12PED.1.1.SS.318 TRONCO I*			
12PED.1.1.CS.07	CORPO STRADALE E ASTA PRINCIPALE E TRONCO I*SS 318	1784	01-Feb-09 A
12PED.1.1.CS.08	CORPO STRADALE USCITA PINNELLO	1784	01-Feb-09 A
12PED.1.1.CS.09	CORPO STRADALE E USCITA VALFABRICA	1565	08-Sep-09 A
12PED.1.1.CS.10	STRADE LOCALI E IMPRISTINI	365	01-Jan-12 A
12PED.1.1.CS.11	OPERE DI SOSTEGNO, MURI IN TERRA RINFORZATA ECC.	49	10-Mar-13
12PED.1.1.CS.12	MURI IN TERRA RINFORZATA ASTA PRINCIPALE E TRONCO I*SS 318	639	01-Feb-09 A
12PED.1.1.OH.01	OPERE D'ARTE MINORI, CAVALLERIA, SCARICOLI STRADALI E IDRAULICI	575	16-Aug-11 A
12PED.1.1.OH.02	SOTTOPASSO SP 248 TRONCO I*SS 318	1452	01-Aug-09 A
12PED.1.1.OH.03	SOTTOPASSO ALLA PROGR. 5-918 TRONCO I*SS 318	760	05-Mar-11 A
12PED.1.1.OH.04	SOTTOPASSO ALLA PROGR. 5-921 TRONCO I*SS 318	1452	01-Aug-09 A
12PED.1.1.OH.05	SOTTOPASSO ALLA PROGR. 5-918 TRONCO I*SS 318	1452	01-Aug-09 A
12PED.1.1.OH.06	SOTTOPASSO ALLA PROGR. 5-918 TRONCO I*SS 318	1452	01-Aug-09 A
12PED.1.1.OH.07	OPERE IRREGOLARI, TORNIERIE CIRCOLARI E INALZEZZAZIONI	1430	02-Aug-09 A
12PED.1.1.OH.08	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	55	30-Apr-13
12PED.1.1.MA.01	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	52	30-Apr-13
12PED.1.1.MA.02	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	64	31-May-13
12PED.1.1.MA.03	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	435	20-Jun-12 A
12PED.1.1.MA.04	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	345	20-Jun-12 A
12PED.1.1.MA.05	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	89	01-Jun-13
12PED.1.1.MA.06	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	1593	26-Aug-09 A
12PED.1.1.MA.07	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	1434	24-Aug-09 A
12PED.1.1.MA.08	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	935	21-Apr-11 A
12PED.1.1.MA.09	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	1027	18-Aug-10 A
12PED.1.1.MA.10	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	1068	07-Sep-10 A
12PED.1.1.MA.11	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	822	11-May-11 A
12PED.1.1.MA.12	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	938	07-Sep-10 A
12PED.1.1.MA.13	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	233	12-Apr-13
12PED.1.1.MA.14	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	147	03-Jul-13
12PED.1.1.MA.15	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	117	26-Aug-13
12PED.1.1.MA.16	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	235	12-Apr-13
12PED.1.1.MA.17	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	122	29-Aug-13
12PED.1.1.MA.18	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	21	10-Jun-13
12PED.1.1.MA.19	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	171	08-Sep-13
12PED.1.1.MA.20	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	194	06-Apr-10 A
12PED.1.1.MA.21	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	176	01-Feb-11 A
12PED.1.1.MA.22	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	1034	25-Aug-10 A
12PED.1.1.MA.23	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	714	25-Mar-11 A
12PED.1.1.MA.24	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	941	28-Oct-10 A
12PED.1.1.MA.25	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	194	06-Apr-10 A
12PED.1.1.MA.26	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	1848	01-Apr-09 A
12PED.1.1.MA.27	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	1848	01-Apr-09 A
12PED.1.1.MA.28	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	1572	02-Jan-10 A
12PED.1.1.MA.29	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	759	01-Aug-11 A
12PED.1.1.MA.30	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	334	15-Apr-12 A
12PED.1.1.MA.31	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	61	01-Apr-09 A
12PED.1.1.MA.32	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	418	01-Dec-11 A
12PED.1.1.MA.33	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	58	23-Mar-13
12PED.1.1.MA.34	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	1374	07-Nov-09 A
12PED.1.1.MA.35	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	41	02-Jul-13
12PED.1.1.MA.36	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. TRONCO I*SS 318	776	07-Nov-09 A

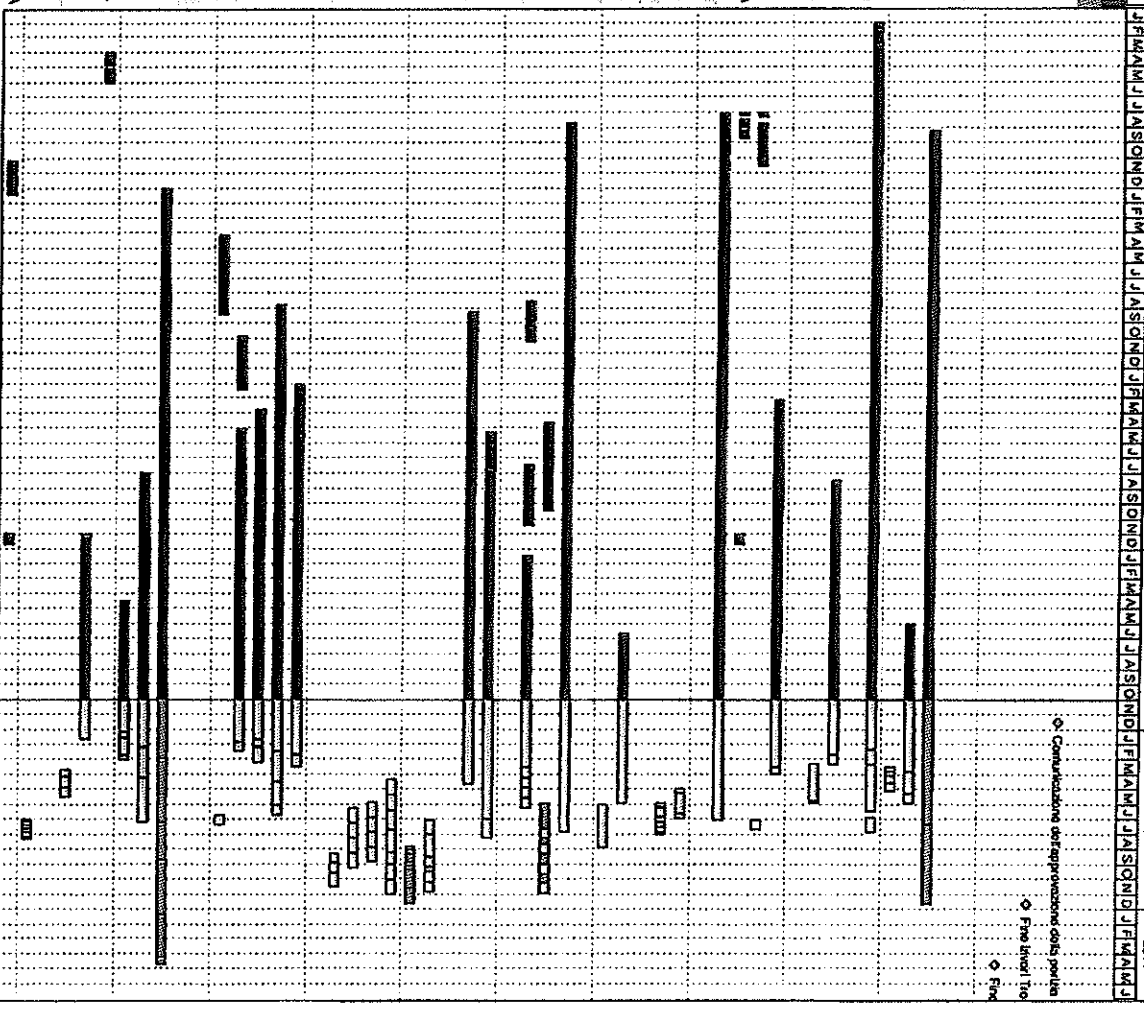

Activity ID	Description	Durata (hr:min)	Start	End
12PED.2.1.0M.12	SOTTOPASSO ALLA PROGL. 124875 TRONCO R°-SS 318	375	27-Jan-10A	19-Jun-12A
12PED.2.1.MU.08	OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. E PARATE	306	30-Dec-12	31-Oct-13
12PED.2.1.MU.09	MURINO DI SOTTOSCARPA FINALE SEZ.48 E 6 TRONCO R° SS 318	75	13-Jul-13	26-Sep-13
12PED.2.1.MU.10	PARATA FRATELLE SEZ. 39 E 38 (PARATA ZONA FRANA LA SORBELLA)	306	30-Dec-12	31-Oct-13
12PED.2.1.MU.11	MURINO DI SOTTOSCARPA RACCORDO VALFABRICA	57	09-Aug-13	03-May-13
12PED.2.1.MU.12	MURI ESISTENTI PONTE CHIASSO	116	08-Jan-13	01-Oct-13
12PED.2.1.0I	OPERE IDRAULICHE, TORRENI CIRCOLARI E INALZEZIONI	103	29-Mar-13	08-Jul-13
12PED.2.1.0A.08	CANALIZZAZIONI, COLLETTORI E POZZETTI	152	24-Jun-13	02-Dec-13
12PED.2.1.0A.10	VASCA DI RACCOLTAACQUA SEZ.21 RACCORDO VALFABRICA	137	09-Jul-13	22-Nov-13
12PED.2.1.0A.11	VASCA DI RACCOLTAACQUA SEZ.15 RACCORDO VALFABRICA	15	02-Oct-13	16-Oct-13
12PED.2.1.0A.12	VASCA DI RACCOLTAACQUA SEZ.10C TRONCO R°	81	09-Jul-13	27-Sep-13
12PED.2.1.0A.13	VASCA DI RACCOLTAACQUA SEZ.10C TRONCO R°	15	26-Sep-13	10-Oct-13
12PED.2.1.0A.14	VASCA DI RACCOLTAACQUA SEZ.280 TRONCO R°	15	24-Jul-13	07-Aug-13
12PED.2.1.0A.15	VASCA DI RACCOLTAACQUA SEZ.280 TRONCO R°	16	06-Aug-13	23-Aug-13
12PED.2.1.0A.16	SISTEMAZIONE IDRAULICA TRONCO R°-SS 318	15	24-Aug-13	07-Sep-13
12PED.2.1.VI	VIADOTTI	102	24-Jun-13	02-Dec-13
12PED.2.1.VI.29	VIADOTTO PIAN SALUCCIO	1273	26-Oct-10A	23-Apr-14
12PED.2.1.VI.30	VIADOTTO DEL RANCO	876	26-Oct-10A	21-Mar-13
12PED.2.1.MI.31	PONTE CHIASSO, RACCORDO VALFABRICA	891	01-Jun-12A	22-Apr-14
12PED.2.1.0S	OPERE DI SOSTEGNO, MURI IN TERRA RINFORZATA ECC.	887	26-Oct-10A	13-Mar-13
12PED.2.1.0S.18	MURI IN TERRA RINFORZATA ASTA PRINCIPALE TRONCO R°-SS 318	885	01-Jun-11A	12-Oct-13
12PED.2.1.0S.19	MURI IN TERRA RINFORZATA ASTA PRINCIPALE TRONCO R°-SS 318	885	01-Jun-11A	12-Oct-13
12PED.2.1.MA.01	RIPIRISTINI E MITIGAZIONE AMBIENTALE TRONCO I°-SS 318	72	02-Jan-14	14-Mar-14
72			02-Jan-14	14-Mar-14

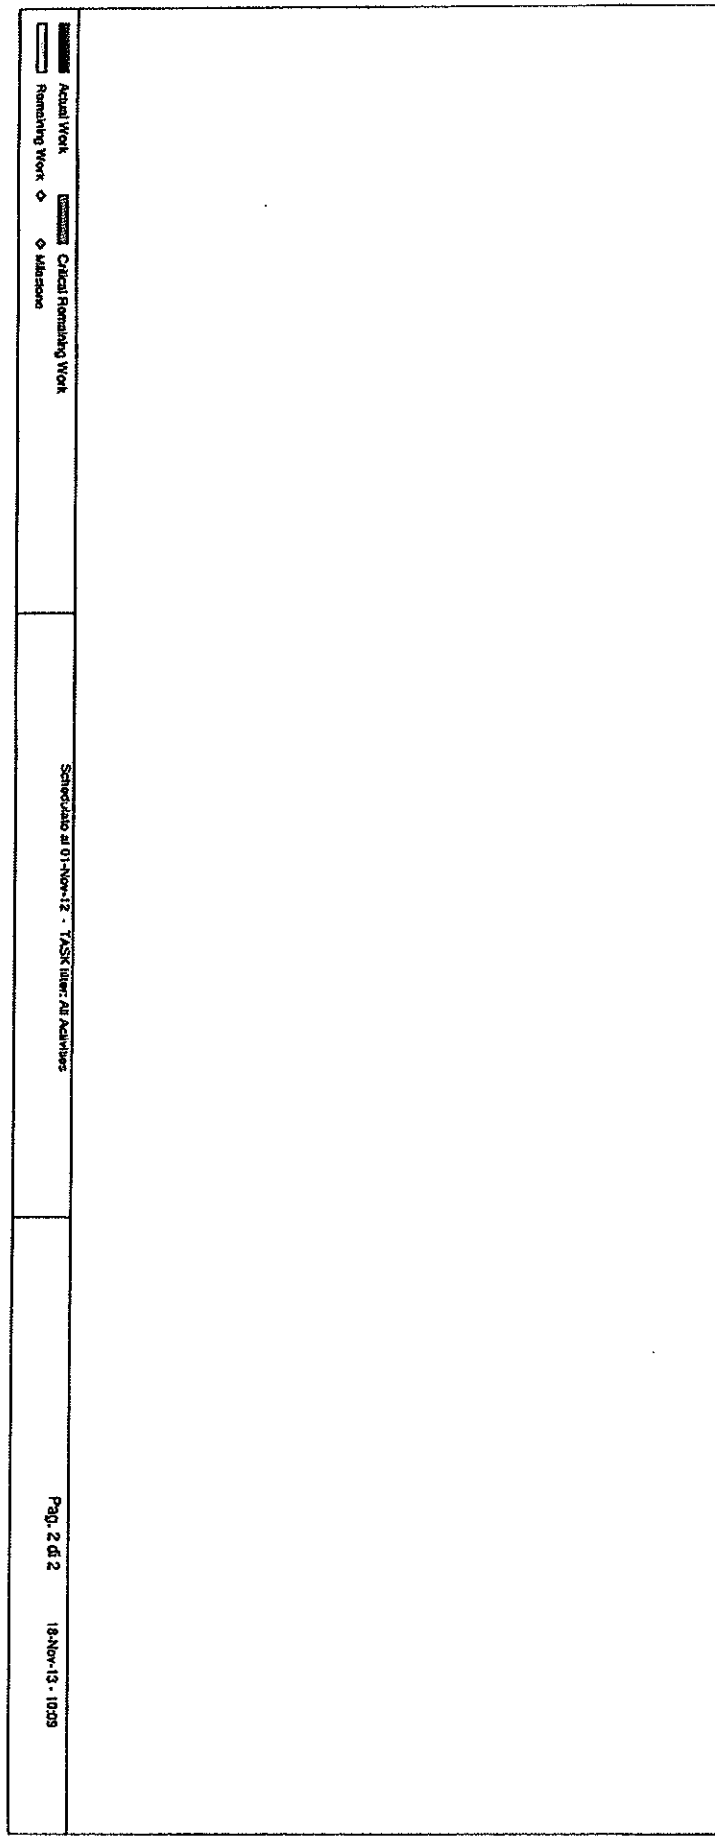

DIRPA S.c. a r.l.
Direttrice Perugia Ancona e Pedemontana delle Marche

Fabiano, 16 febbraio 2012

Prot. Quad_2012_02_6719_FG

Spett.le
QUADRILATERO
MARCHE - UMBRIA S.p.A.
Via Monzambano,10
00185 Roma

Alla c.a. *R.P.I.V. Ing. Andrea Simonini*
Alla c.a. *D. G. Arch. Fabrizio Romozzi*
Alla c.a. *R.U.P. Ing. Andrea Saralvo*

Oggetto: Affidamento a Contraente Generale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. f) della legge 443/2001, nonché art. 9 del D.lgs.vo 20.08.2002, n. 190, del sistema asse viario Marche - Umbria e Quadrilatero, maxi Lotto 2, direttrice Perugia Ancona, tratto "Planello - Valfabbrica" della SS 318 "di Valfabbrica", dei tratti "Fossato Vico - Cancelli" e "Albacina - Serra San Quirico" della SS 76 "Val d'Esino" e realizzazione della "Pedemontana delle Marche", tratto "Fabiano - Mucclia/Sfercia". (CUP F12C03000050020)
Incarico di Responsabile Ambientale.

Con la presente lo scrivente conferma che l'incarico di Responsabile Ambientale è stato conferito all'Ing. Claudio Lambertini il quale, nell'espletamento delle sue attività si avvarrà dei necessari specialisti settoriali in conformità alle linee guida per il monitoraggio ambientale par. 1.8 comma 2.

Distinti saluti

DIRPA S.c. a r.l.
L'Amministratore Delegato
Francesco Giuffrida

Presidente
Direttore Generale
Affari Legali
Amministrazione
P.A.V.
P.I.V.
Relazioni Esterne
Risorse Umane
RUP MXL 1
RUP MXL 2

DATA 16/02/2012
PROT. N. 22830

DIRPA S.c. a r.l.
Direttrice Perugia Ancona e Piedemontana delle Marche

ELENCO DEI SPECIALISTI SETTORIALI

Componente e/o fattore ambientale	Specialista
Atmosfera:	Ing. Sonia Vitellaro
Ambiente fisico:	Ing. Renato Morlando
Suolo e sottosuolo:	Dott. Geologo Francesco Morgante
Vegetazione e flora, fauna, ecosistemi:	Dott. Matteo Vetro Esperto Naturalista
Rumore e Vibrazioni	Ing. Alessandro Dinolfo
Campi Elettromagnetici:	Ing. Salvatore Dinolfo
Paesaggio:	Arch. Roberta Lambertini
Rifiuti -- Rocce e terra da scavo:	Ing. Antonio Orlando
Stato fisico dei luoghi, area di cantiere e viabilità:	Arch. Emiliano Capozza
Ambiente sociale:	Arch. Caterina Scamardella

QUADRILATERO

ProL. n. 2969-09

Roma, 21 dicembre 2009

RACCOMANDATA A/R

Spett.le **DIRPA S.C.a r.l.**
Via del Colle, 95
50041 CALENZANO (FI)

Spett.le **DIRPA S.C.a r.l.**
Via Brodolini, 81
60044 FABRIANO (AN)

Egr. **Direttore dei lavori**
(Ing. *Blagio Camaldo*)
c/o **DIRPA S.C.a R.L.**
Via Brodolini, 81
60044 FABRIANO (AN)


e p.c. Spett.le **Quadrilatero M. U. S.p.A.**
Alta Sorveglianza di Cantiere ML2
Via Brodolini, 81
60044 FABRIANO (AN)

OGGETTO: Opera strategica "Asse viario Marche Umbria - Quadrilatero di penetrazione", **Maxi Lotto n. 2:** lavori di completamento della direttrice Perugia - Ancona tramite realizzazione della SS 318 "di Valfabbrica", tratto Pianello - Valfabbrica, della SS 76 "Val d'Esino", tratti Fossato di Vico - Cancelli e Albacina - Serra San Quirico e realizzazione della "Pedemontana delle Marche", tratto Fabriano - Muccia/Sfercia (CUP F12C03000050020). Contratto rep. N. 59059 del 23/06/2006.
Monitoraggio Ambientale - Nomina del Referente Dott. Egidio Borsini.

Al sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 1.8 delle Linee Guida per il Progetto di Monitoraggio Ambientale delle Infrastrutture strategiche ed Insediamenti produttivi di cui al D.Lgs. n. 163/06, unite all'Allegato NG18 al C.S.A., si comunica il nominativo del **Dott. Geol. Egidio Borsini**, addetto alla geologia e all'ambiente presso l'Alta Sorveglianza del Maxi Lotto n. 2, quale referente del soggetto Aggiudicatore Società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. in materia di ambiente.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Andrea Simonini



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Fabrizio Romozzi



 **QUADRILATERO**

Sede Operativa – Alta Sorveglianza ML2
Via Dante Alighieri, 270A
60044 FABRIANO (AN)

Prot. n. 8768-12
Raccomandata A/R
Anticipata via fax

Roma, 16 Febbraio 2012

**Spett.le Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare**
*Commissione tecnica di Verifica dell'Impatto
Ambientale - VIA e VAS*
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
Alla c.a. del Presidente
Ing. G. Monteforte Specchi
Fax. 065722 3082

OGGETTO: Opera strategica "Asse viario Marche Umbria – Quadrilatero di penetrazione".
Maxi Lotto n. 2: lavori di completamento della direttrice Perugia – Ancona tramite
realizzazione della SS 318 "di Valfabbrica", tratto Pianello – Valfabbrica, della SS 76 "Val
d'Esino", tratti Fossato di Vico – Cancelli e Albacina – Serra San Quirico e realizzazione della
"Pedemontana delle Marche", tratto Fabriano – Muccia/Sfercia (CUP F12C03000050020).
Contratto rep. N. 59059 del 23/06/2006.

**Verifica di attuazione: Adeguamenti progettuali su progetti esecutivi per il Sublotto
1.1 – SS76 "Val d'Esino", tratti Fossato di Vico – Cancelli e Albacina – Serra San
Quirico e per il Sublotto 1.2 – SS318 "di Valfabbrica", tratto Pianello – Valfabbrica.**

(Rif. note MATTM –VIA VAS prot. n. CTVA-2012-0000422 del 03.02.2012 acquisita al Prot.
QMU n. 22631 del 06.02.2012 e prot. n. CTVA-2012-0000498 del 09.02.2012 acquisita al prot.
n. 22727 del 09.02.2012)

Con riferimento alle note di codesta Spett.le Commissione VIA-VAS specificate in oggetto e,
in particolare, al sollecito degli adempimenti già richiesti con la richiamata nota prot. DSA-
2009-26974 del 12 ottobre 2009, si trasmettono in allegato le seguenti documentazioni:

1. Nota di Sintesi sugli adempimenti di cui alla Delibera della Regione Marche DGR n. 1771/2008.
2. Relazioni illustrative delle rilevazioni Ante-Operam sulle componenti acque superficiali-acque sotterranee relative ai Sublotti 1.1.A e 1.1.B.
3. Manuale di Gestione Ambientale del Cantieri del Contraente Generale DIRPA Scarl.
4. Copia della nomina del Referente Ambientale del Soggetto Aggiudicatore Soc. Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.
5. Copia della lettera di Incarico di Responsabile Ambientale conferito dal Contraente Generale DIRPA Scarl.
6. Crono-programmi dei lavori relativi al Sublotto 1.1 (A e B) – SS76 e al Sublotto 1.2 – SS318 (Perizie di Variante in corso di istruttoria per l'approvazione).

Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. – Soggetta alla direzione e al coordinamento dell'Anas S.p.A.
Via Monzambano, 10 – 00185 Roma
Capitale Sociale euro 50.000.000,00 di cui versati euro 38.781.500,00
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07555981005 R.E.A. 1039626
Tel. +39 06845601 – Fax + 39 0684560549 - quadrilaterospa@postacert.stradeanas.it





Si evidenzia che agli adempimenti richiesti con la nota sopra richiamata si è provveduto parzialmente, in quanto le attività esecutive sono state espletate solo in parte nel periodo 2009 - 2011, in conseguenza di problematiche tecniche ed esecutive, nonché relative a difficoltà gestionali con il Contraente Generale aggiudicatario dei lavori. Infatti, la BTP S.p.A., azionista del Contraente Generale DIRPA Scrl e principale affidatario di quest'ultima, a seguito di rilevanti problematiche di natura finanziaria riscontrate già dal 2009, è stata assoggettata a vari provvedimenti da parte del Tribunale di Prato, dal 2010 fino al dicembre 2011, come da documentazione allegata.

In particolare, le lavorazioni finora eseguite, non interessate dalle varianti in corso di istruttoria, sono prevalentemente relative agli scavi delle gallerie e, pertanto, le attività di monitoraggio ambientale si sono concentrate sulle seguenti componenti impattate:

- acque superficiali;
- acque profonde;
- vibrazioni.

Alla luce di quanto sopra esposto, anche in considerazione delle recenti avverse condizioni meteorologiche che tuttora non consentono un'agevole percorrenza del cantiere, si chiede a Codesta Spettabile Commissione di posticipare la data del sopralluogo già fissato per il 23 febbraio p.v.; ciò anche per consentire alla scrivente Società di poter integrare la documentazione con la parte afferente i lavori ancora da eseguire.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Andrea Saralvo

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Fabrizio Romozzi

Allegati: c.s.

ALICCATO
PPTA 9268-12
10/12/2012



OGGETTO: Opera strategica "Asse viario Marche Umbria - Quadrilatero di penetrazione".

Maxi Lotto n. 2: lavori di completamento della direttrice Perugia - Ancona tramite realizzazione della SS 318 "di Valfabbrica", tratto Pianello - Valfabbrica, della SS 76 "Val d'Esino", tratti Fossato di Vico - Cancelli e Albacina - Serra San Quirico e realizzazione della "Pedemontana delle Marche", tratto Fabriano - Muccia/Sfercia (CUP F12C03000050020).

Contratto rep. N. 59059 del 23/06/2006.

Delibera della Giunta Regionale delle Marche DGR n. 1771 del 01.12.2008 - Adempimenti in materia di ambiente

NOTA DI SINTESI

Si rappresenta, in primo luogo, che le prescrizioni concernenti gli aspetti ambientali, contenute nella DGR 1771/2008 in oggetto - riportata integralmente in allegato (All. n. 1) - sono limitate alla sola opera "Viadotto Serra San Quirico 2 - Nord", per la quale è stata rilevata la potenziale interferenza con l'acquifero delle sorgenti di Gorgovivo, gestite dall'omonimo Consorzio. Infatti, le altre opere e le cantierizzazioni previste dal progetto esecutivo risultano conformi al progetto definitivo approvato dal CIPE e alle vigenti norme in materia di ambiente.

In particolare, per quanto attiene al Viadotto sopra menzionato, nel prendere atto del parere positivo espresso dal Consorzio Gorgovivo in data 13/11/2008, la Regione, con la detta Delibera ha prescritto che "...le fondazioni del viadotto compreso tra le pile 1n e 6n vengano riprogettate e fondate esclusivamente sulla formazione del deposito alluvionale di base, se non per il semplice appoggio sullo strato resistente...".

Si riportano di seguito gli adempimenti messi in atto dalla scrivente Società, in qualità di Soggetto Aggiudicatore dell'opera strategica, nonché gli eventi salienti occorsi.

- La Delibera della Regione Marche n. 1771 del 01/012/2008 è stata fatta propria dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare con parere DSA-2009-0026979 del 12/10/2009, prescrivendo la riprogettazione del Viadotto Serra San Quirico.
- Con la Perizia n. 1, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Soc. Quadrilatero del 28/10/2009, è stata autorizzata l'esecuzione di nuovi sondaggi in corrispondenza delle pile del viadotto Serra San Quirico 2 - Nord, per una somma di € 34.938,16.

Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. - Soggetta alla direzione e al coordinamento dell'Anas S.p.A.
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma
Capitale Sociale euro 50.000.000,00 di cui versati euro 38.781.500,00
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07555981005 R.E.A. 1039626
Tel. +39 06845601 - Fax + 39 0684560540 - quadrilaterospa@posteceri.stradeanas.it



M

[Handwritten signature]



- In data 18/05/2010 Il Contraente Generale, con nota Quad_2010_05_2608_SDL ha trasmesso gli elaborati riguardanti il Viadotto Serra San Quirico, in recepimento delle prescrizioni della DGR Regione Marche n. 1771/2008.
- Il Consorzio Gorgovivo ha espresso parere favorevole sui detti elaborati progettuali con nota prot. 439 del 22/07/2010.
- Il Contraente Generale ha successivamente trasmesso una rielaborazione della documentazione progettuale con alcune modifiche sulle fondazioni.
- In data 27/04/2011 la Soc. Quadrilatero (con nota prot. QMU 6708-11) ha avviato la procedura di cui all'art. 169 c. 4 del D.Lgs 163/06 presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Marche.
- Rispetto a tale procedura sono pervenuti i seguenti pareri:
 - Parere positivo del consorzio Gorgovivo n. 207 del 11 maggio 2011
 - Parere positivo con prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in data 05 settembre 2011 prot. DG/PBAAC/34.19.04/27639
 - Parere favorevole della Regione Marche con DGR 1121 del 01/08/2011
- Decorsi i termini previsti dall'art. 169 c. 4 del D.Lgs. 163/06, si è proceduto alla ratifica dell'approvazione del progetto del Viadotto Serra San Quirico 2 -Nord da parte del C.d.A. della Soc. Quadrilatero in data 14/11/2011, così come comunicato al Contraente Generale con nota 7866-11 del 18/11/2011.
- In data 05.12.2011 il Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori.

Roma, 15 febbraio 2012.

II. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Andrea Saralvo

All.:c.s.
