


PRESCRIZIONE 6 - Cronoprogramma chiusura Nastri e Torri

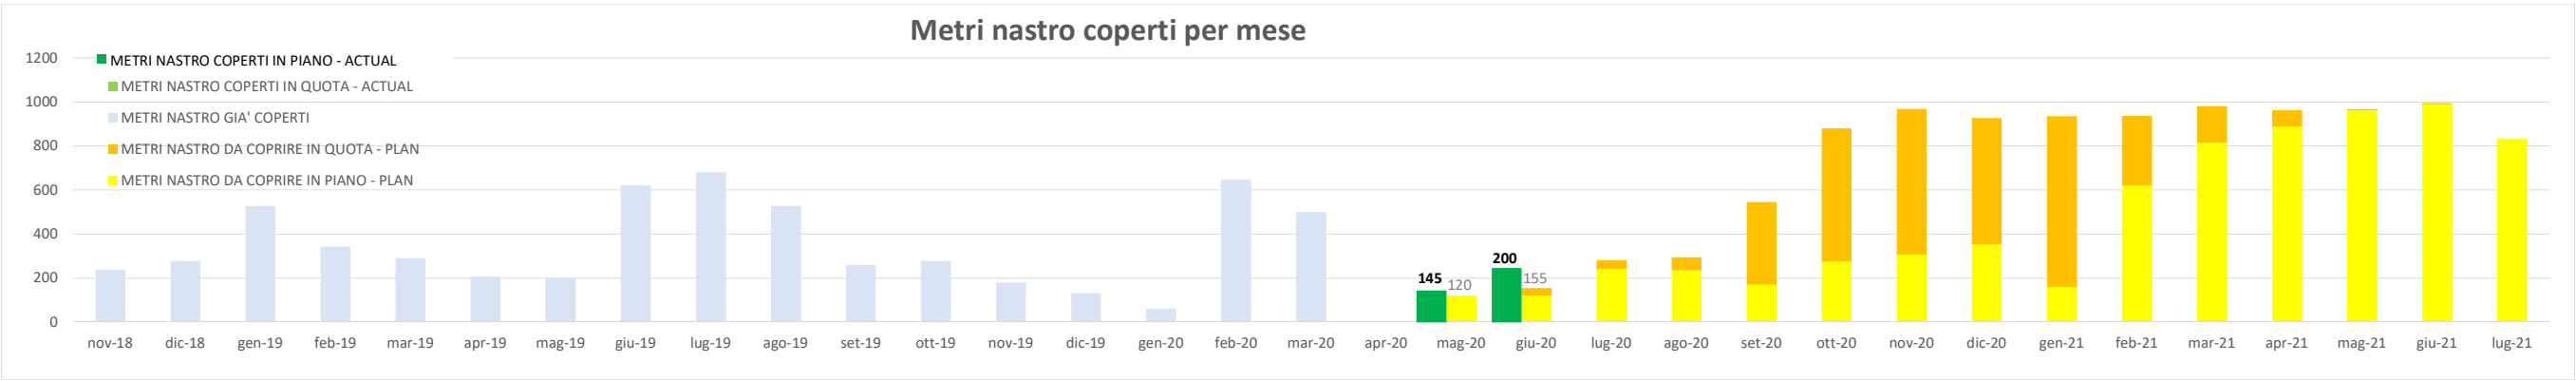

Nel mese di Maggio 2020 coperti 145 metri a fronte di 120 metri pianificati.
Nel mese di Giugno 2020 coperti 200 metri a fronte di 155 metri pianificati.
In totale dall'inizio della ripresa dei cantieri post emergenza sanitaria, coperti 345 metri a fronte di 275 metri pianificati (+ 25% rispetto al piano)
