


PRESCRIZIONE 6 - Cronoprogramma chiusura Nastri e Torri

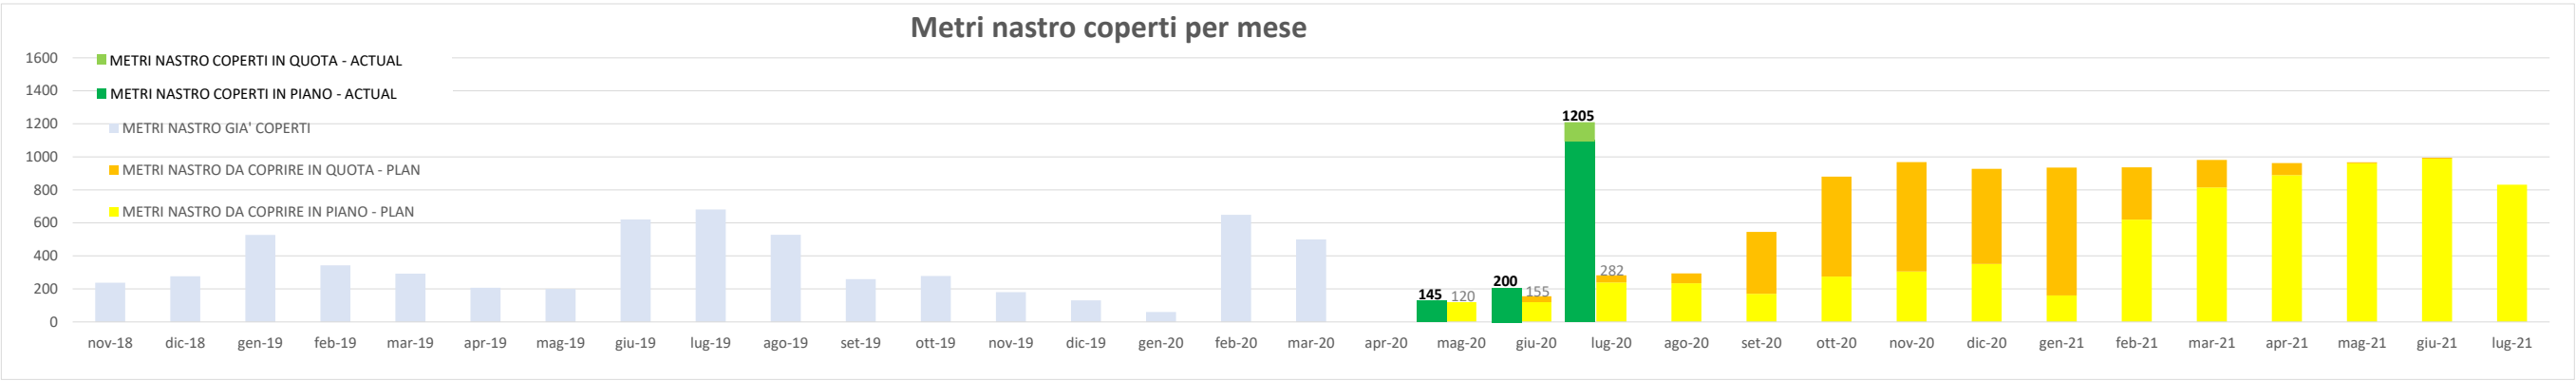

Nel mese di Maggio 2020 coperti 145 metri a fronte di 120 metri pianificati.  
Nel mese di Giugno 2020 coperti 200 metri a fronte di 155 metri pianificati.  
Nel mese di Luglio 2020 coperti 1205 metri a fronte di 282 metri pianificati.  
In totale dall'inizio della ripresa dei cantieri post emergenza sanitaria, coperti 1550 metri a fronte di 557 metri pianificati  
Per quanto riguarda i nastri in quota, dall'inizio della ripresa dei cantieri post emergenza sanitaria, coperti 135m a fronte di 78m pianificati
