


PRESCRIZIONE 6 - Cronoprogramma chiusura Nastri e Torri

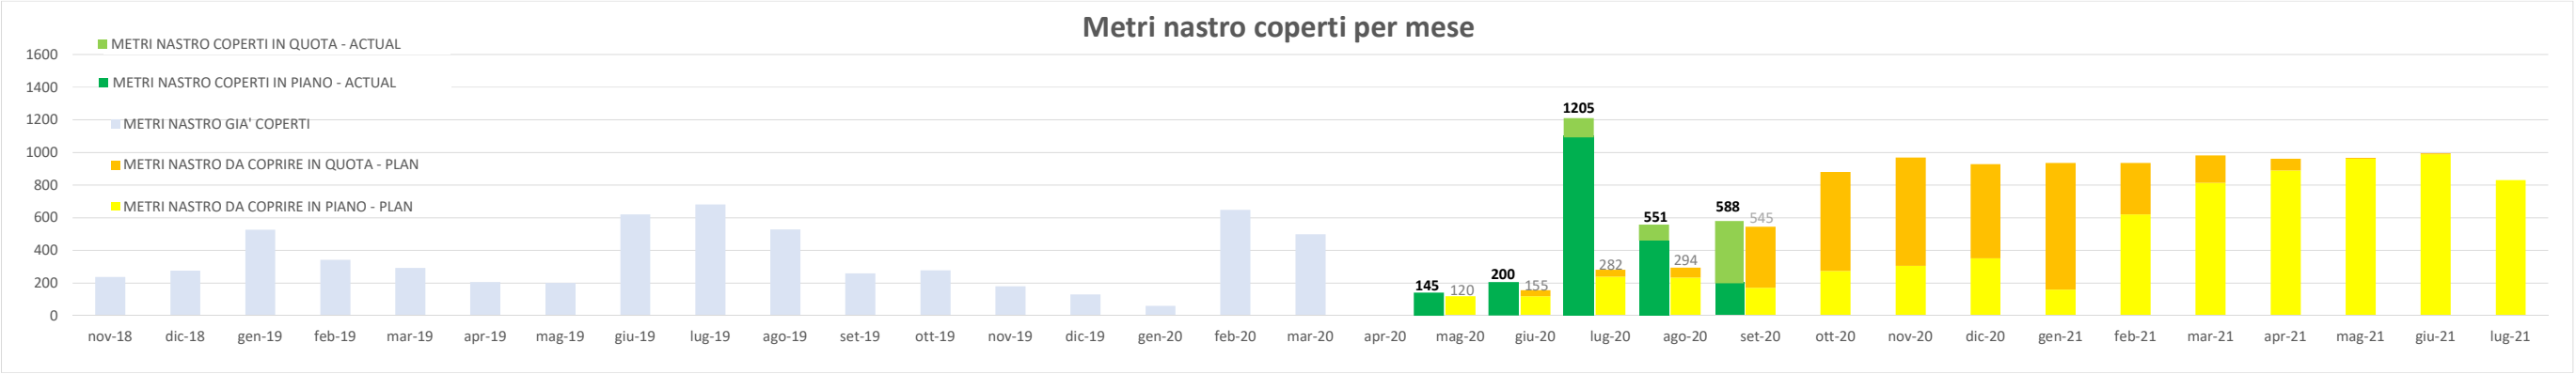

Nel mese di Settembre 2020 (aggiornamento al 17.09) coperti 588 metri a fronte di 545 metri pianificati (+8%)
In totale dall'inizio della ripresa dei cantieri post emergenza sanitaria, coperti 2689 metri a fronte di 1397 metri pianificati (+92%)
Per quanto riguarda i nastri in quota, dall'inizio della ripresa dei cantieri post emergenza sanitaria, coperti 636m a fronte di 512m pianificati (+24%)
