


PRESCRIZIONE 6 - Cronoprogramma chiusura Nastri e Torri

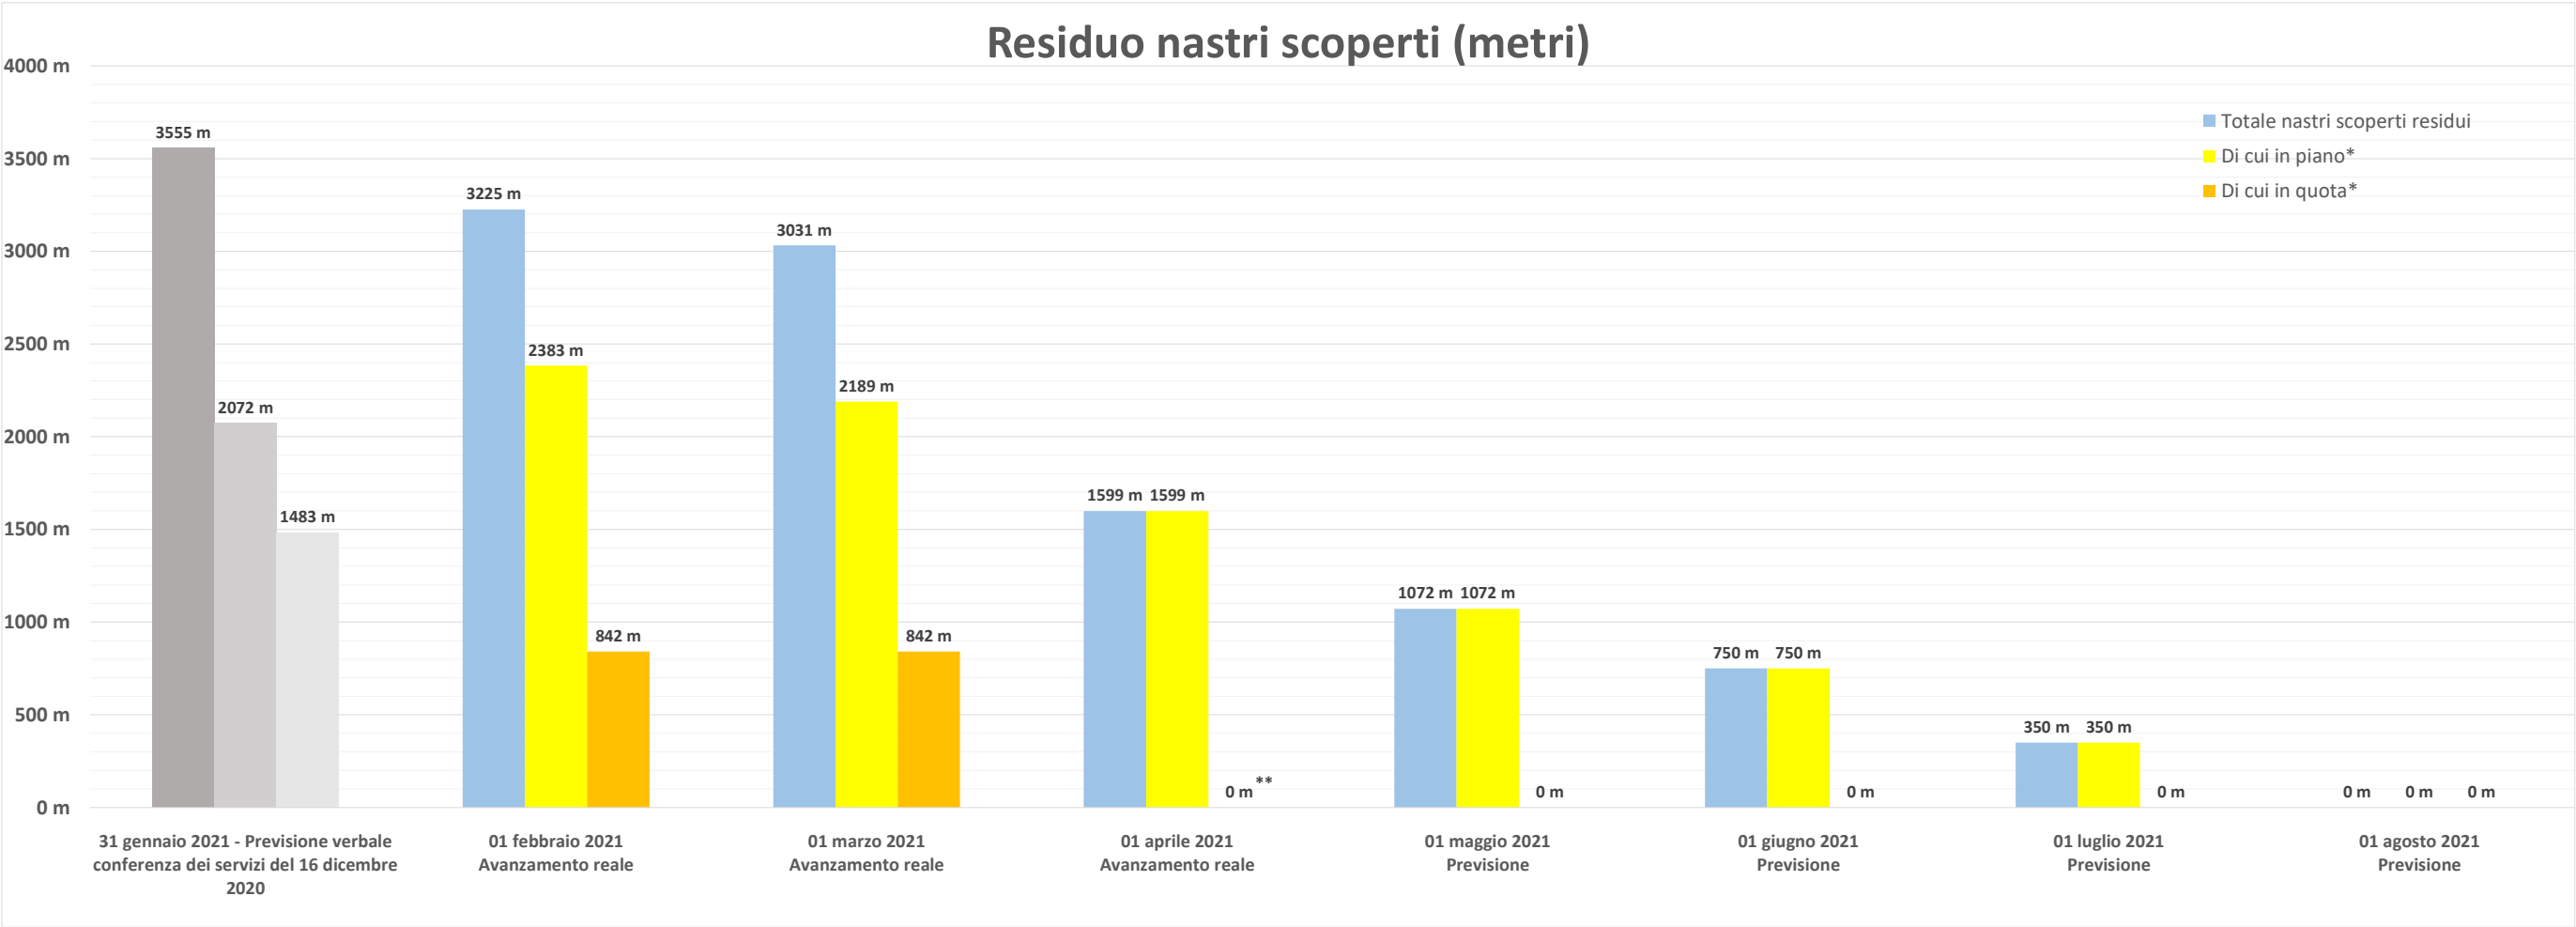

	31 gennaio 2021 - Previsione verbale conferenza dei servizi del 16 dicembre 2020	01 febbraio 2021 Avanzamento reale	01 marzo 2021 Avanzamento reale	01 aprile 2021 Avanzamento reale	01 maggio 2021 Previsione	01 giugno 2021 Previsione	01 luglio 2021 Previsione	01 agosto 2021 Previsione
Totale nastri scoperti residui	3555	3225	3031	1599	1072	750	350	0
Di cui in piano*	2072	2383	2189	1599	1072	750	350	0
Di cui in quota*	1483	842	842	0	0	0	0	0

** Nastro non in esercizio dalla fermata di AFO/4 già avviata che si concluderà il 09/04/2021
