


FASE 6

1. Demolizione parziale paratie di pali della camera di varo in corrispondenza del tombino.
2. Realizzazione concio lato Sud C5 (L = 11.88 m).
3. Realizzazione canale lato Sud con gabbioni e muri ad U in c.a.

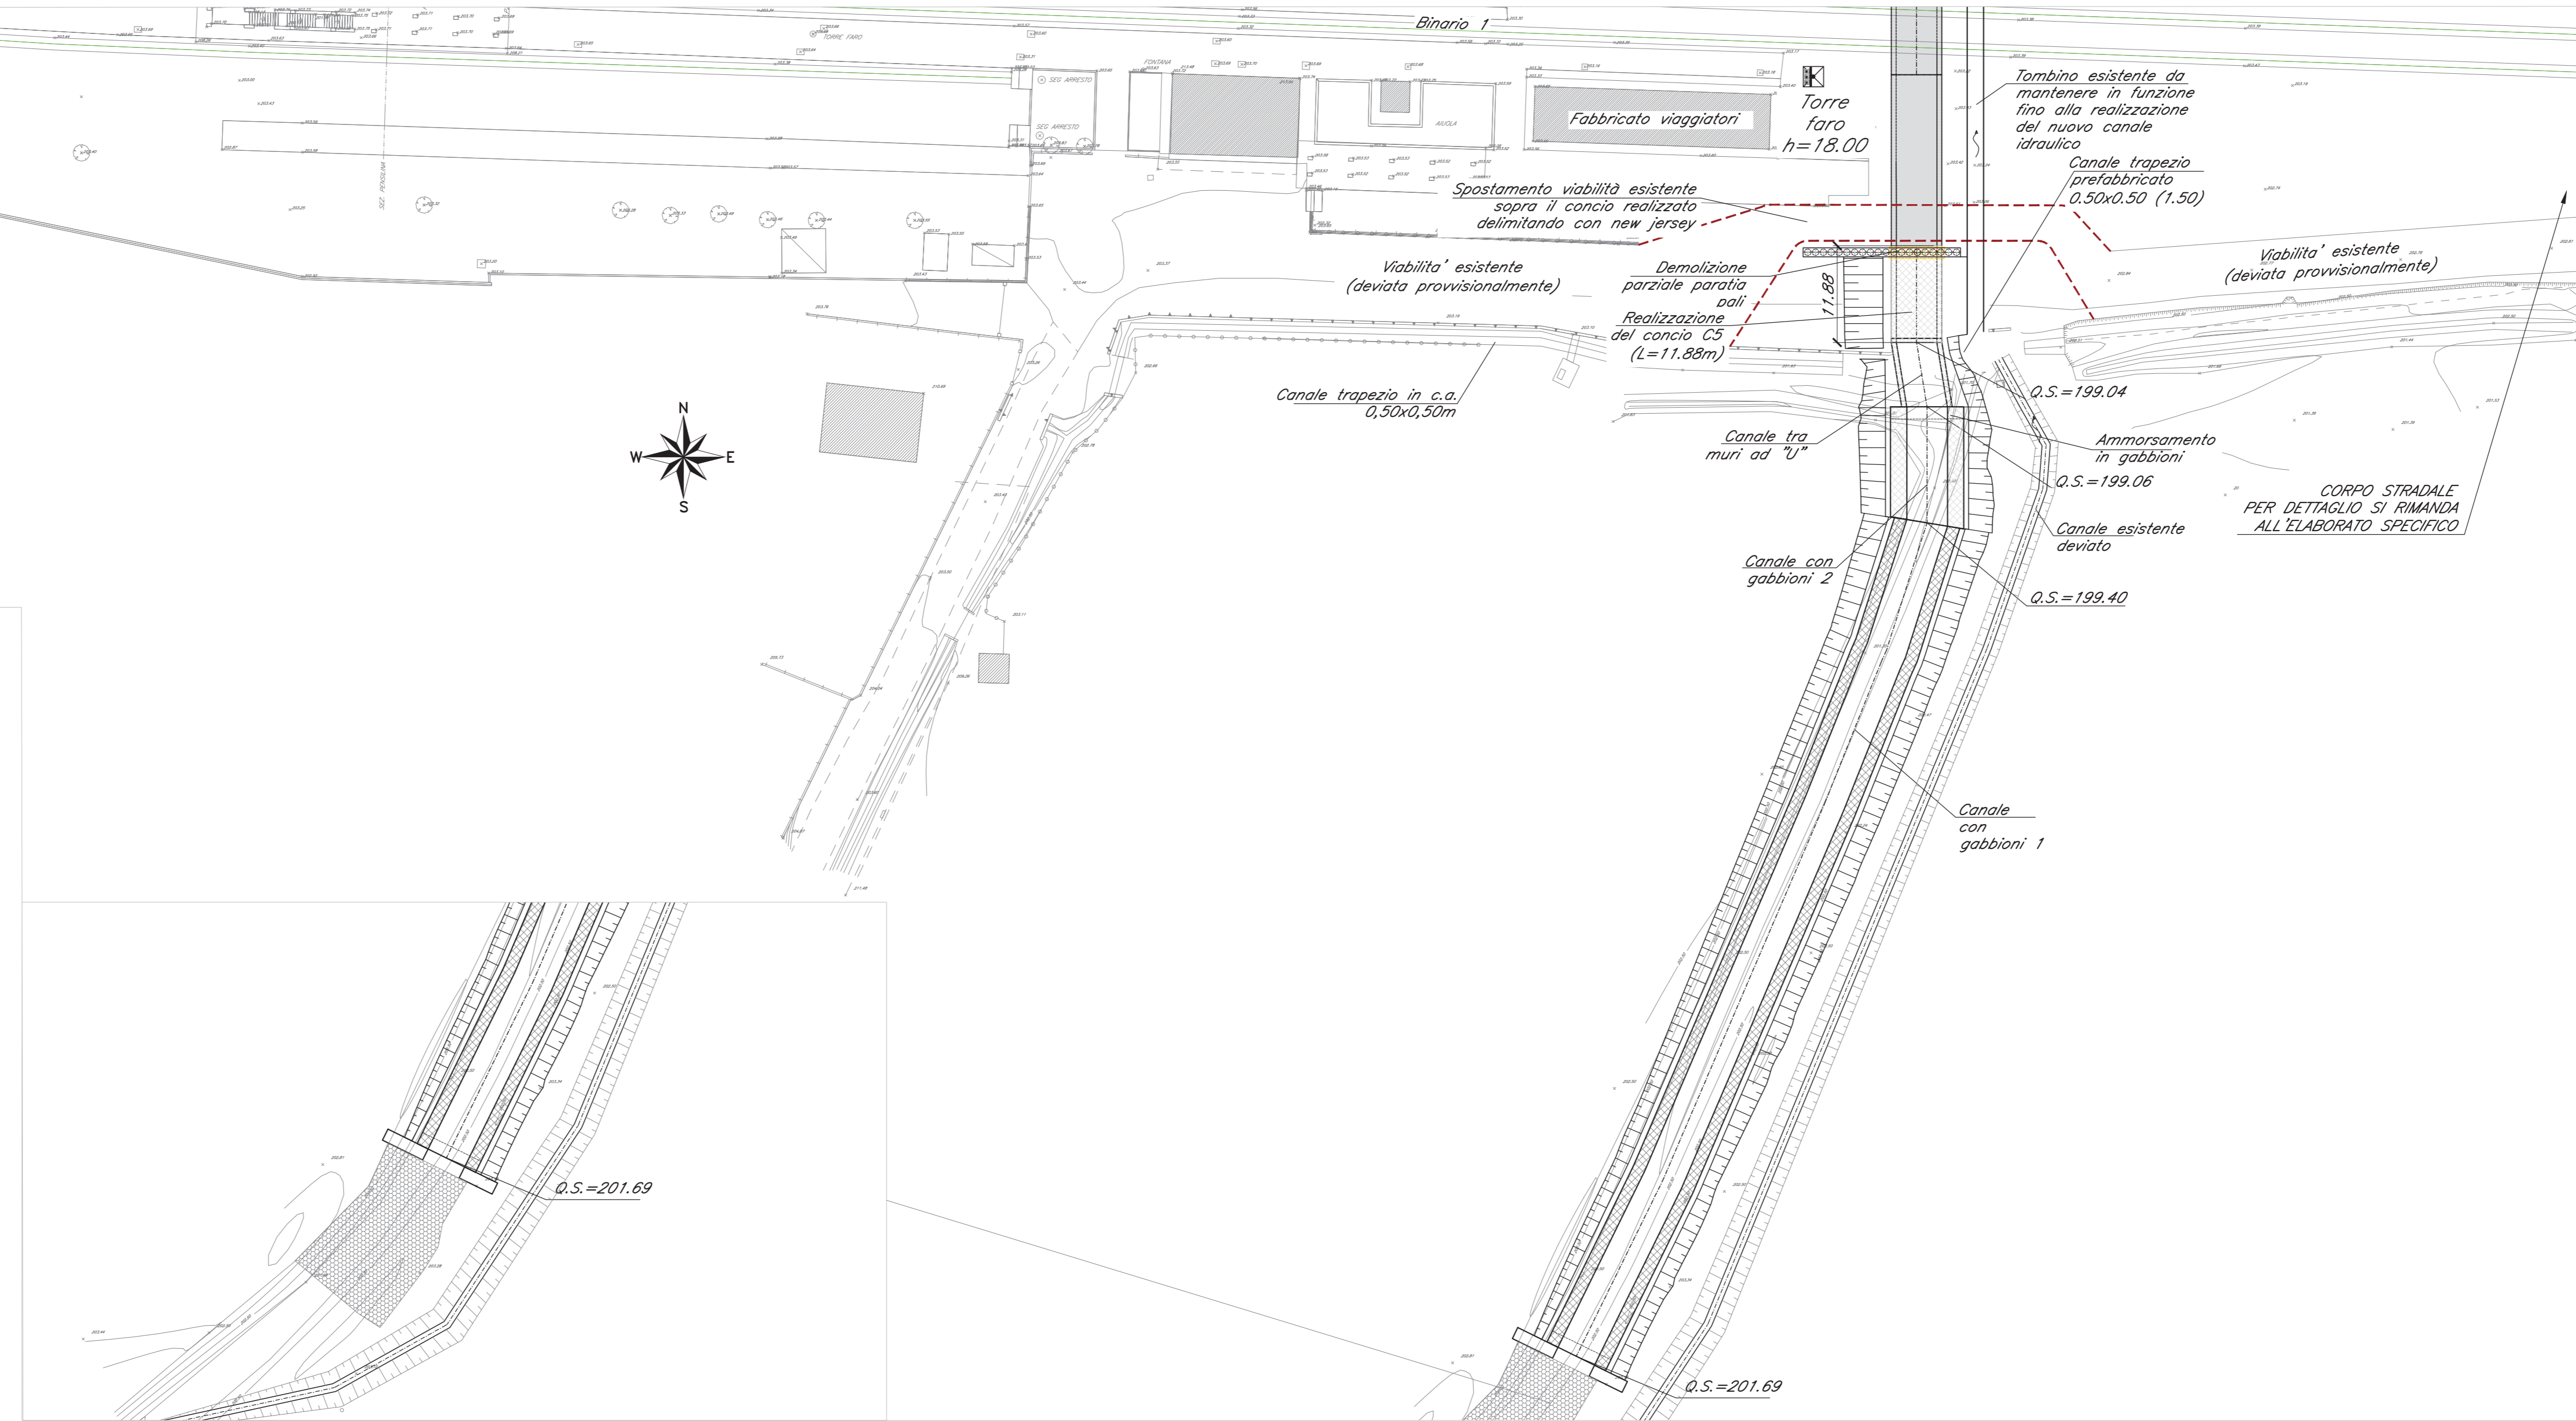

LEGENDA BINARI


- DISMESSO
- DISMESSO TEMPORANEO
- IN ESERCIZIO

LEGENDA DEMOLIZIONI

- AREA DEMOLITA FASE ATTUALE
- AREA IN COSTRUZIONE

FASE 7

1. Riempimento in magrone del tombino esistente.
2. Riempimento in magrone della vasca fino alla quota di sfioro nel collettore esistente.
3. Chiusura del sottopasso pedonale esistente mediante una tamponatura con blocchi di calcestruzzo.
4. Riempimento in magrone del sottopasso pedonale esistente.
5. Ripristino viabilità doppio senso, demolizione viabilità provvisoria.
6. Sistemazione idraulica del fosso trapezio.
7. Sistemazione di due fossi a terra paralleli al canale con gabioni.
8. Completamento del raccordo del canale 50x50 L=17.00 m
9. Ripristino muro recinzione FS L=46.50 m.
10. Elementi di finitura.

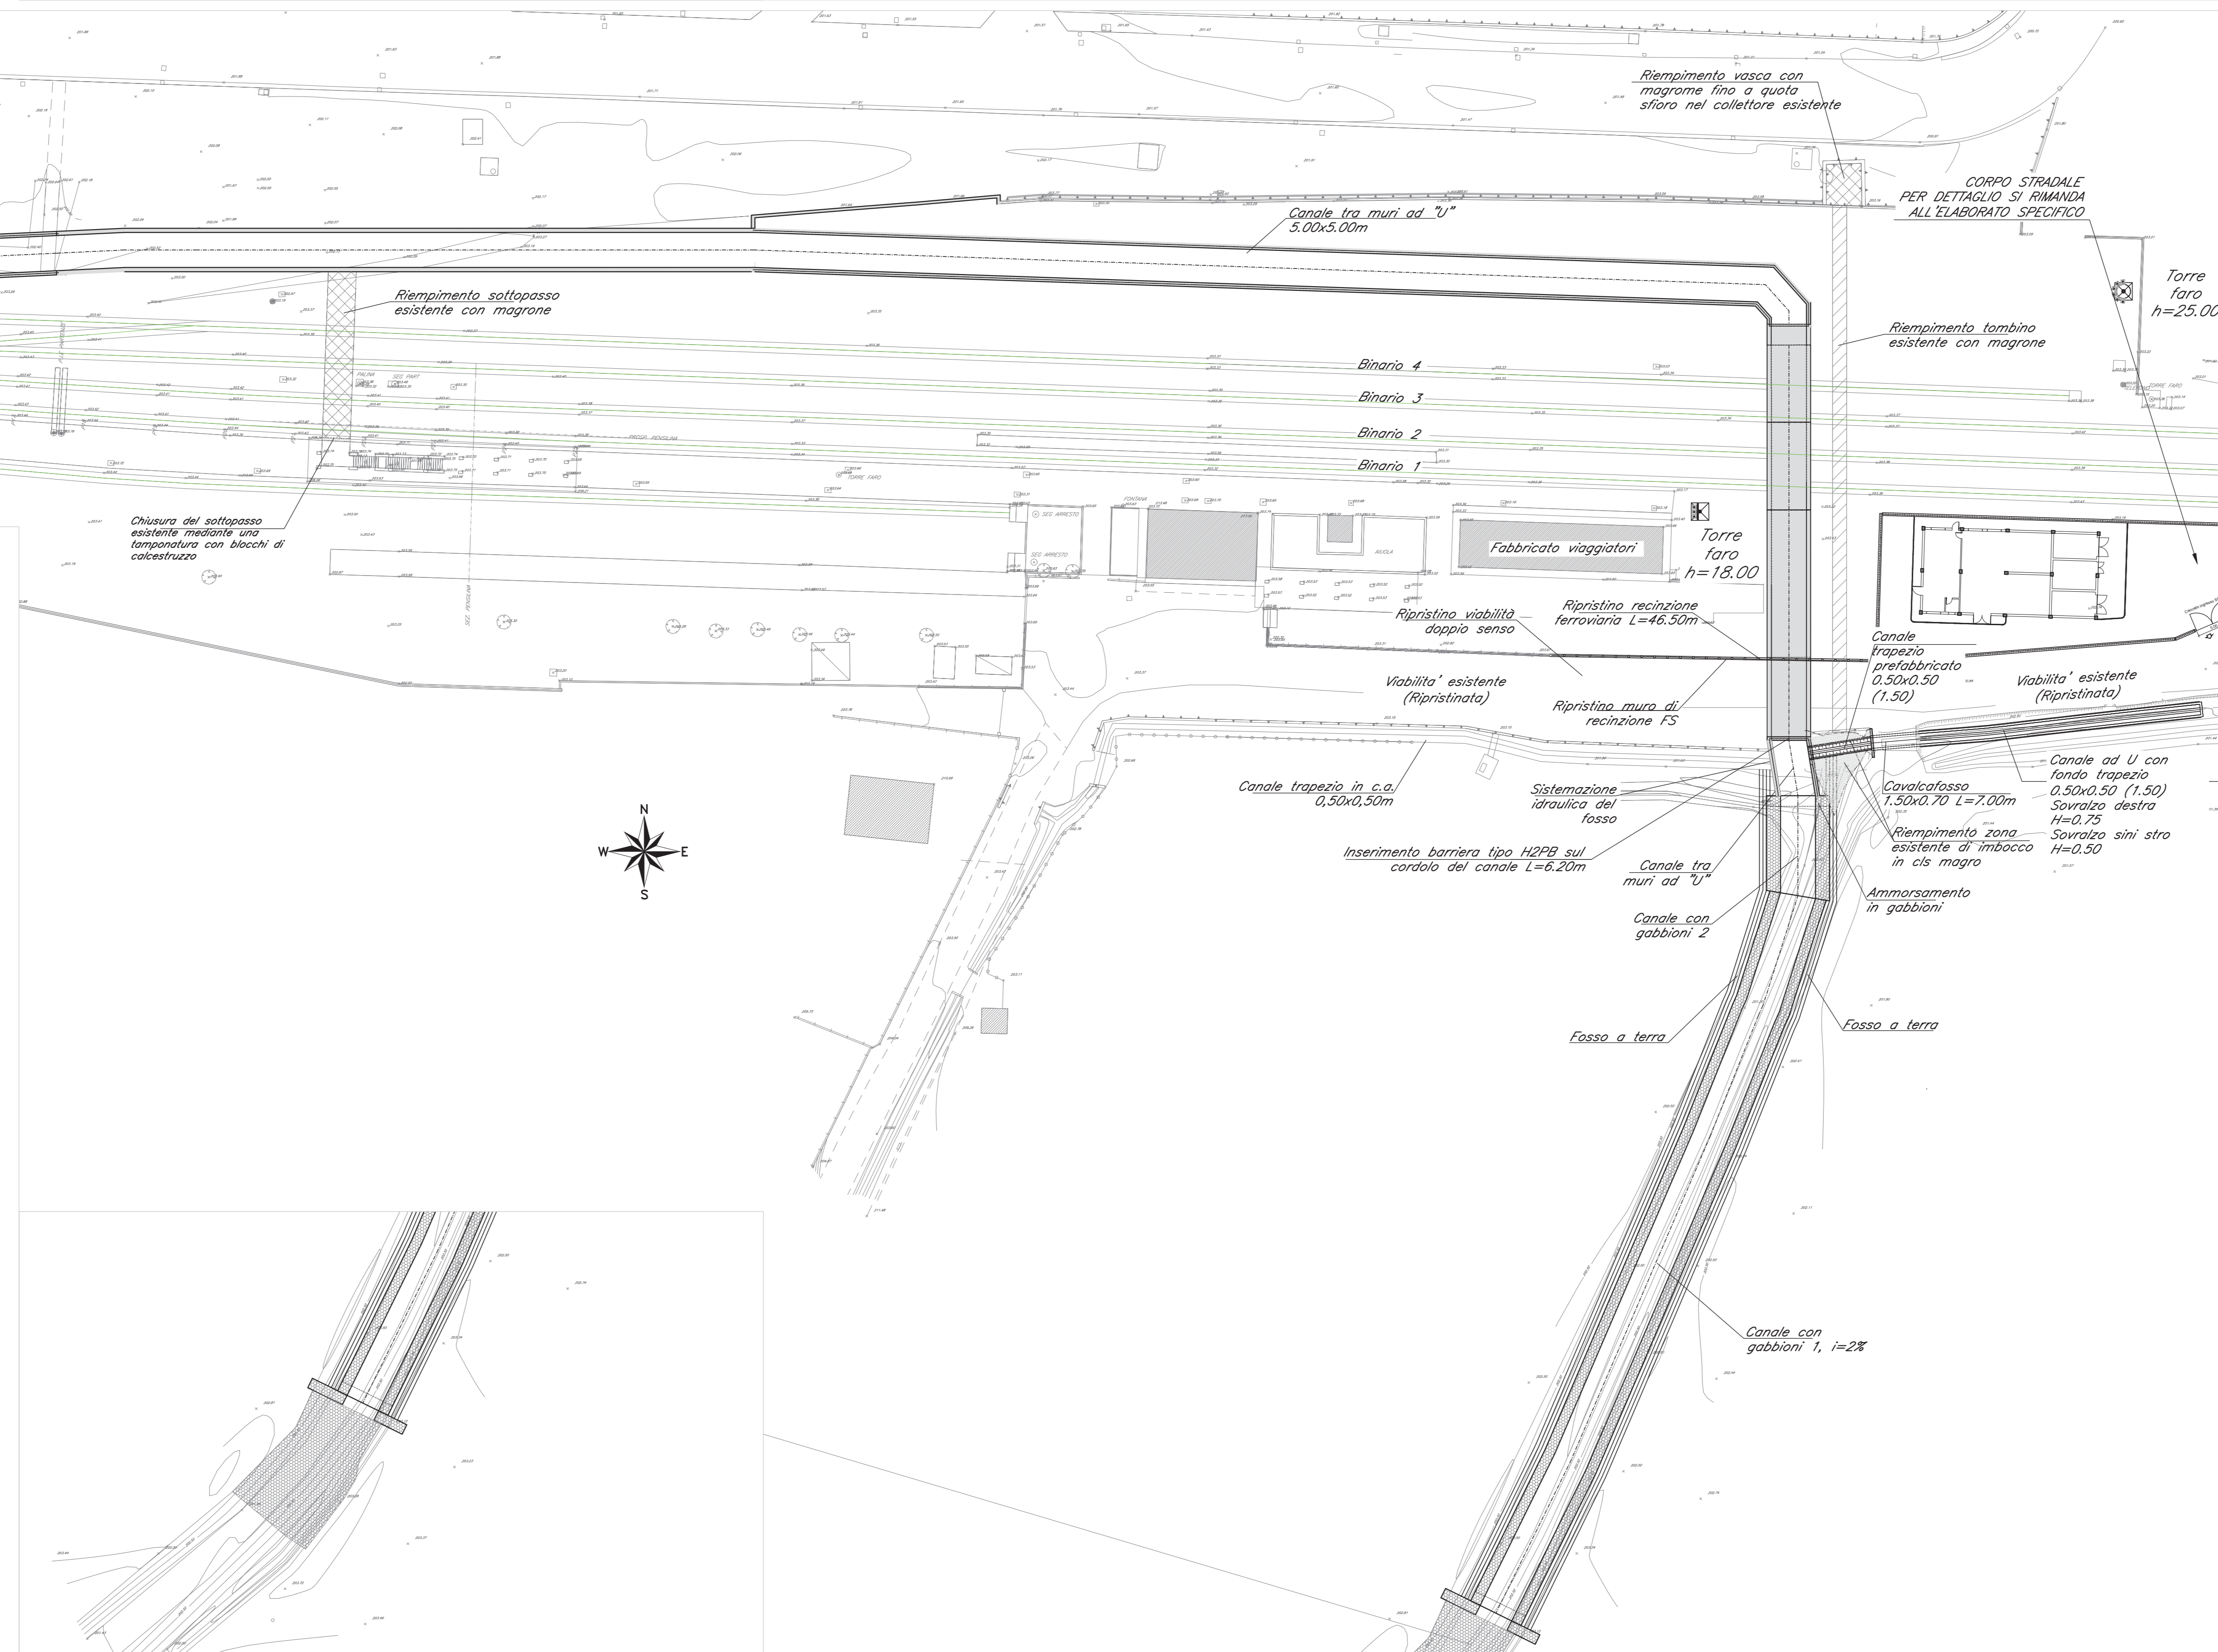

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DELLA DIRETTRICE FERROVIARIA NAPOLI-BARI-LECCE-TARANTO

U.O. INFRASTRUTTURE SUD

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA POTENZA-FOGGIA - AMMODERNAMENTO
SOTTOPROGETTO 2 - ELETTRIFICAZIONE, RETTIFICAZIONE DI TRACCIATO, SOTTOPRESSIONE P.L. E CONSOLIDAMENTO SEDE

LOTTO 1.1 - ELETTRIFICAZIONE P.M. CERVARO - ROCCHETTA - S.NICOLA DI MELFI
CANALE DI MELFI
PLANIMETRIA FASI REALIZZATIVE 3 DI 3

SCALA:

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IA4J	11	E	78	PZ	IN0100	003	D

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMMISSIONE ESERCITIVA	A. Di Fabio	Settembre 2018	S. Frascà/C. Trillo	Settembre 2018	G. Longo	Settembre 2018	01 Settembre 2018
B	REVISIONE	A. La Trana	Settembre 2018	G. Frascà	Settembre 2018	G. Longo	Settembre 2018	01 Settembre 2018
C	REVISIONE	G. Proietti	Settembre 2018	D. Caputo	Settembre 2018	G. Longo	Settembre 2018	01 Settembre 2018
D	REVISIONE A SEGUITO DI UN'ALTRA	G. Proietti	Settembre 2018	G. Longo	Settembre 2018	G. Longo	Settembre 2018	01 Settembre 2018
