



PIANTA 7 di 7
Scala 1:100

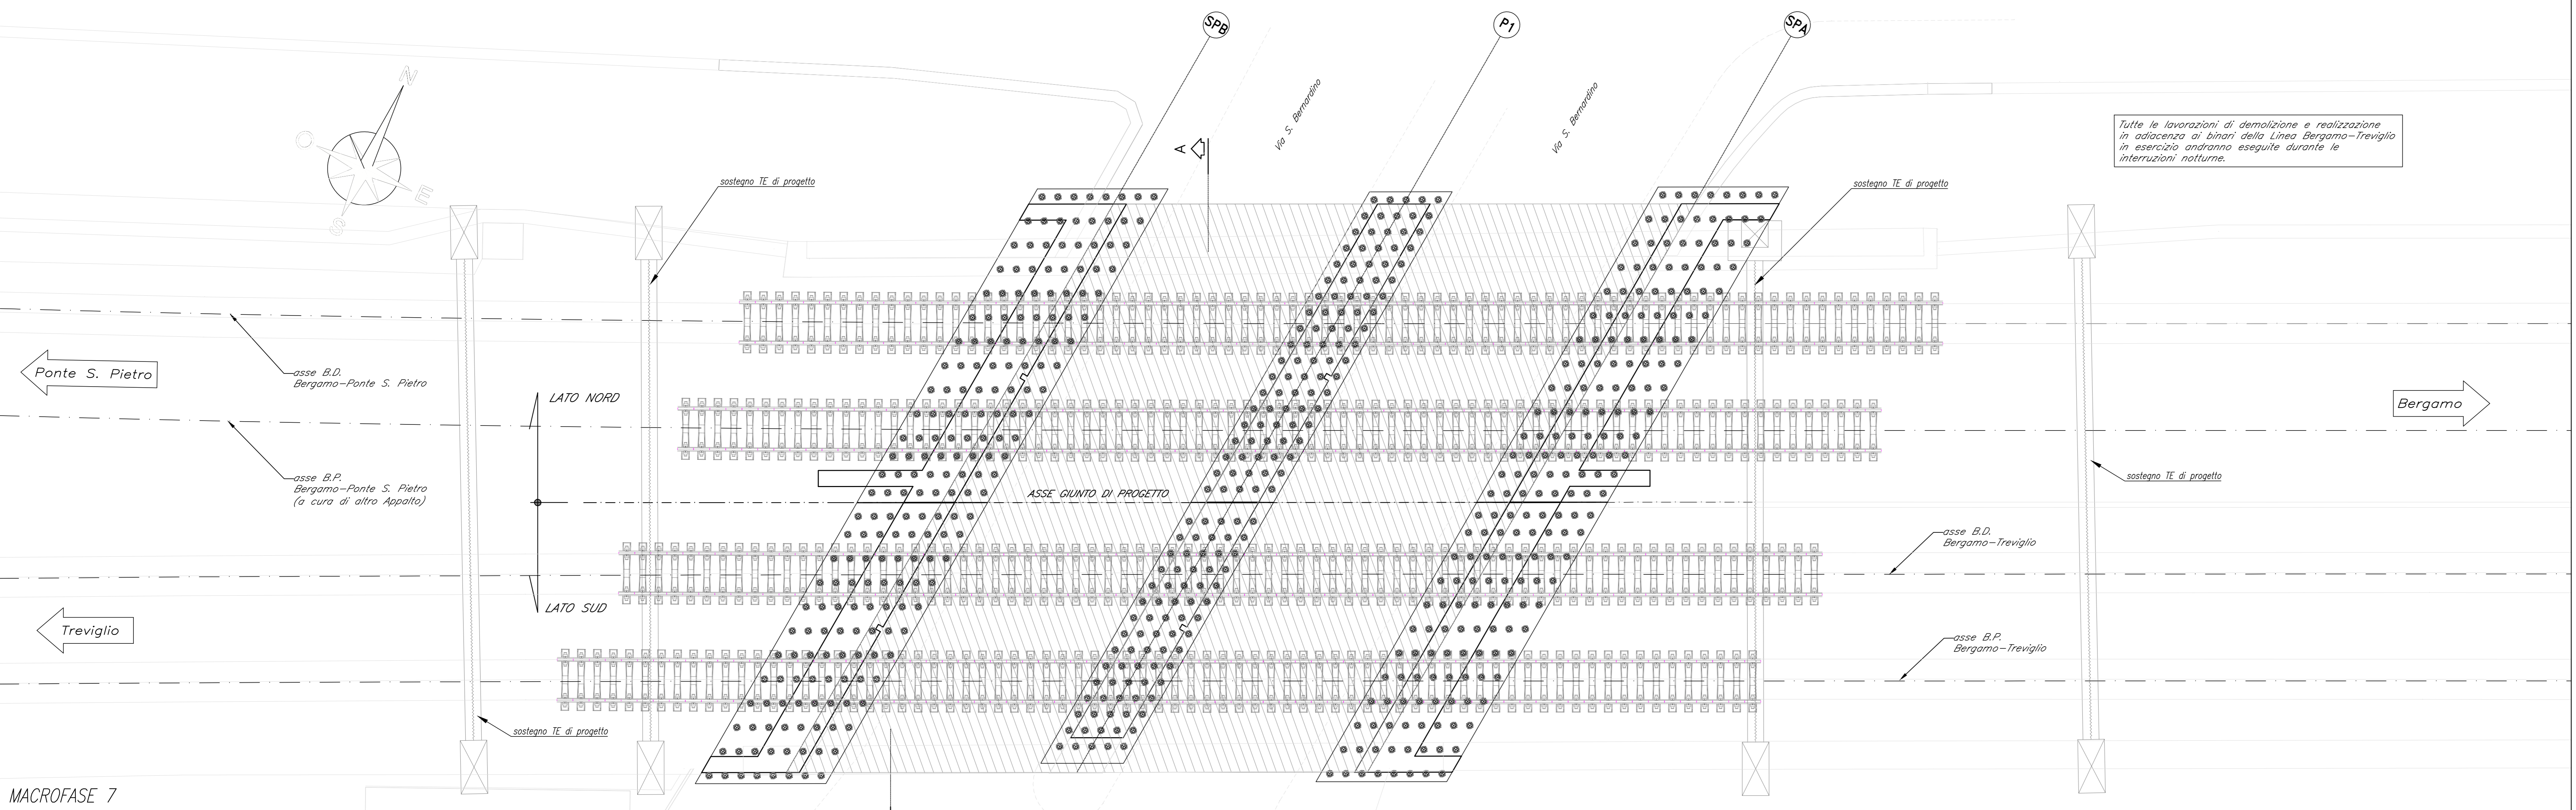

Tutte le lavorazioni di demolizione e realizzazione in aderenza ai binari della Linea Bergamo-Treviglio in esercizio andranno eseguite durante le interruzioni notturne.

- MACROFASE 7**
- 7a) Realizzazione di tutte le parti in elevazione delle spalle e della pila in progetto lato Sud;
 - 7b) Varo degli impalcati a cassone portaballast autoportante in acciaio lato Sud;
 - 7c) Realizzazione e ripristino del corpo stradale ferroviario lato Sud;
 - 7d) Completamento e posa in opera di ulteriori sostegni TE di progetto sia lato Est che lato Ovest funzionali alla Linea Bergamo-Ponte S. Pietro le cui fondazioni lato Nord sono state realizzate nella MACROFASE 4 (p.to 4c));
 - 7e) Opere di completamento e finitura;
 - 7f) Riapertura al traffico veicolare di Via S. Bernardino;
 - 7g) Posizionamento della Linea Bergamo-Treviglio in configurazione definitiva sulla metà lato Sud del PONTE su Via S. Bernardino in progetto;
 - 7h) A cura di altro Appalto: posa in opera dell'armamento funzionale al B.P. della Linea Bergamo-Ponte S. Pietro ed apertura all'esercizio ferroviario dello stesso sulla metà lato Nord del PONTE su Via S. Bernardino di progetto;
 - 7i) Posa in opera dell'armamento funzionale al B.D. della Linea Bergamo-Ponte S. Pietro ed apertura all'esercizio ferroviario dello stesso sulla metà lato Nord del PONTE su Via S. Bernardino di progetto.

SEZIONE A-A
Scala 1:100

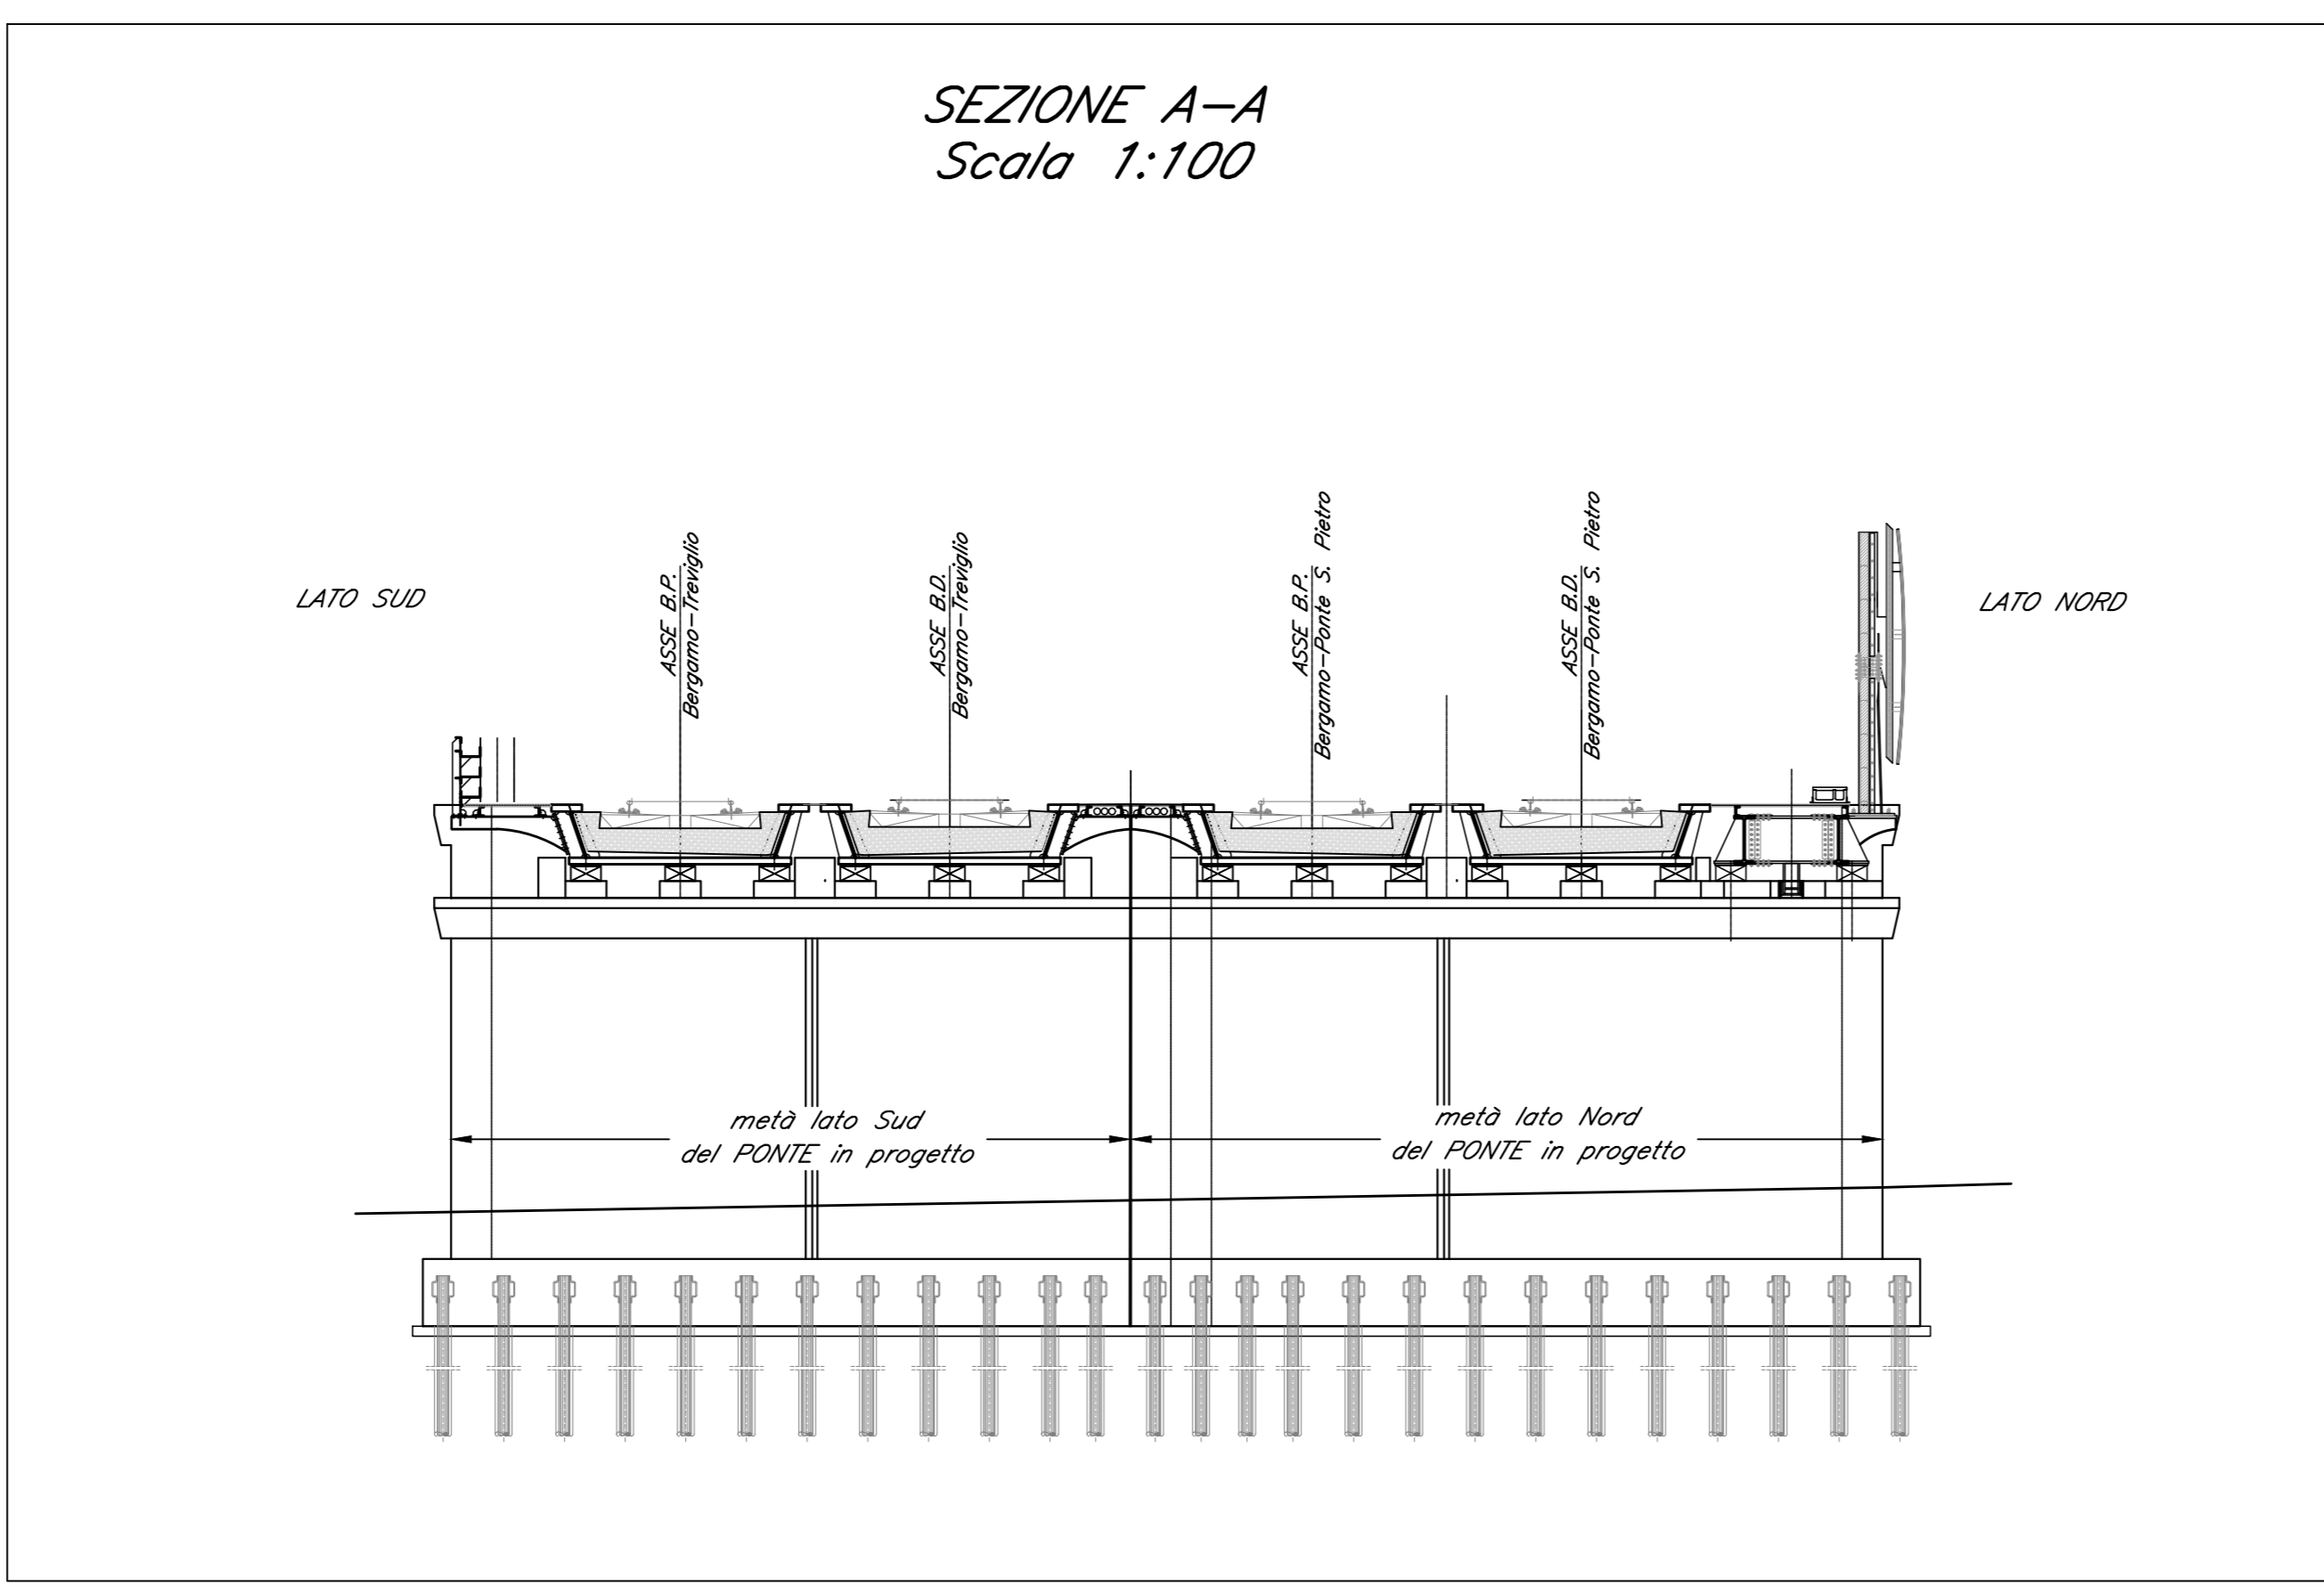

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

CUP: J64H17000140001

S.O. OPERE CIVILI

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO PONTE S.PIETRO - BERGAMO - MONTELO

LOTTO 9: Opere Civili e Impianti Tecnologici di Piazzale per il completamento del raddoppio della linea Ponte SP - Bergamo e per lo spostamento provvisorio della linea Treviglio - Bergamo

V103 - PONTE SU VIA S. BERNARDINO
FASI REALIZZATIVE - TAV. 4 di 4

SCALA: VARIE

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	C. Grimaldi	Feb. 2021	T. Albertini	Feb. 2021	M. Bertagnoni	Feb. 2021		
B	Emissione per nuove rotte INF	T. Albertini	Lug. 2021	M. Bertagnoni	Lug. 2021		Lug. 2021		

File: NB1R09D09PZV10300006B n. Elab.:
