


PIANTA SCAVI

Scale 1:200


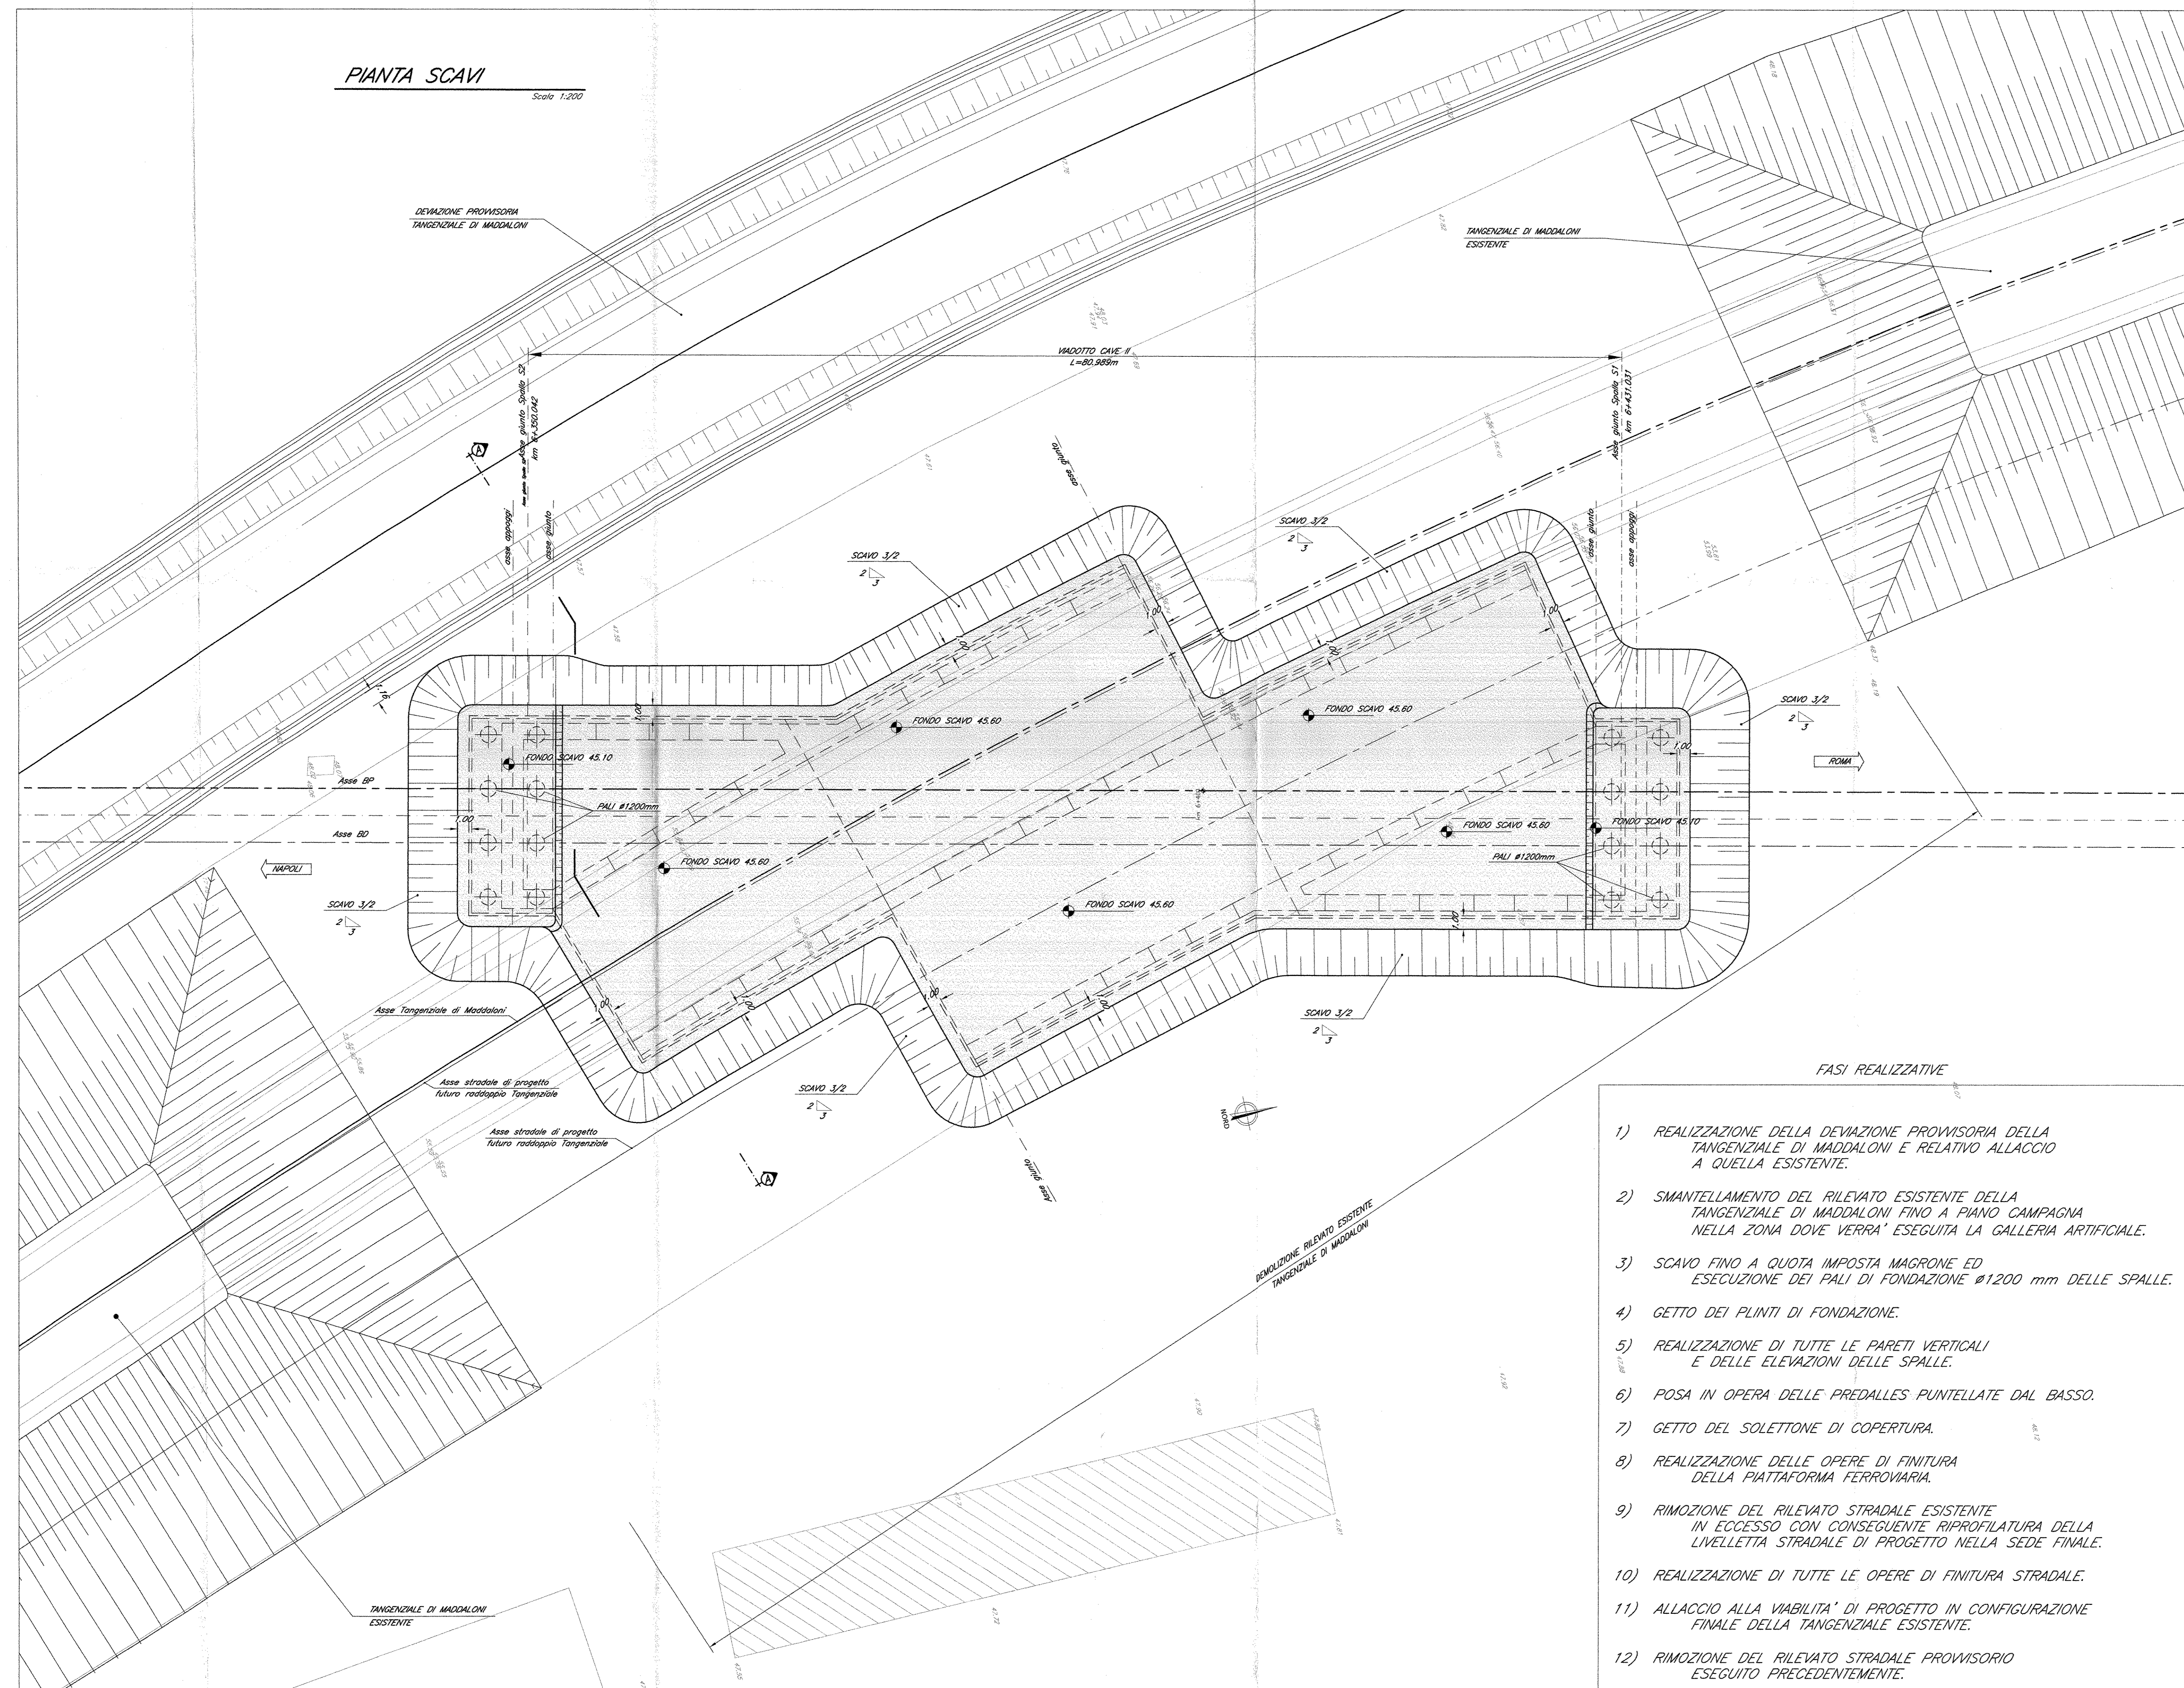


FASI REALIZZATIVE

- 1) REALIZZAZIONE DELLA DEVIAZIONE PROVVISORIA DELLA TANGENZIALE DI MADDALONI E RELATIVO ALLACCIO A QUELLA ESISTENTE.
- 2) SMANTELLAMENTO DEL RILEVATO ESISTENTE DELLA TANGENZIALE DI MADDALONI FINO A PIANO CAMPAGNA NELLA ZONA DOVE VERRA' ESEGUITA LA GALLERIA ARTIFICIALE.
- 3) SCAVO FINO A QUOTA IMPOSTA MAGNONE ED ESECUZIONE DEI PALI DI FONDAZIONE Ø1200 mm DELLE SPALLE.
- 4) GETTO DEI PLINTI DI FONDAZIONE.
- 5) REALIZZAZIONE DI TUTTE LE PARETI VERTICALI E DELLE ELEVAZIONI DELLE SPALLE.
- 6) POSA IN OPERA DELLE PREDALLES PUNTELLATE DAL BASSO.
- 7) GETTO DEL SOLETTONE DI COPERTURA.
- 8) REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI FINITURA DELLA PIATTAFORMA FERROVIARIA.
- 9) RIMOZIONE DEL RILEVATO STRADALE ESISTENTE IN ECCESSO CON CONSEGUENTE RIPROFILATURA DELLA LIVELLATA STRADALE DI PROGETTO NELLA SEDE FINALE.
- 10) REALIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERE DI FINITURA STRADALE.
- 11) ALLACCIO ALLA VIABILITA' DI PROGETTO IN CONFIGURAZIONE FINALE DELLA TANGENZIALE ESISTENTE.
- 12) RIMOZIONE DEL RILEVATO STRADALE PROVVISORIO ESEGUITO PRECEDENTEMENTE.

SEZIONE A-A

Scale 1:100

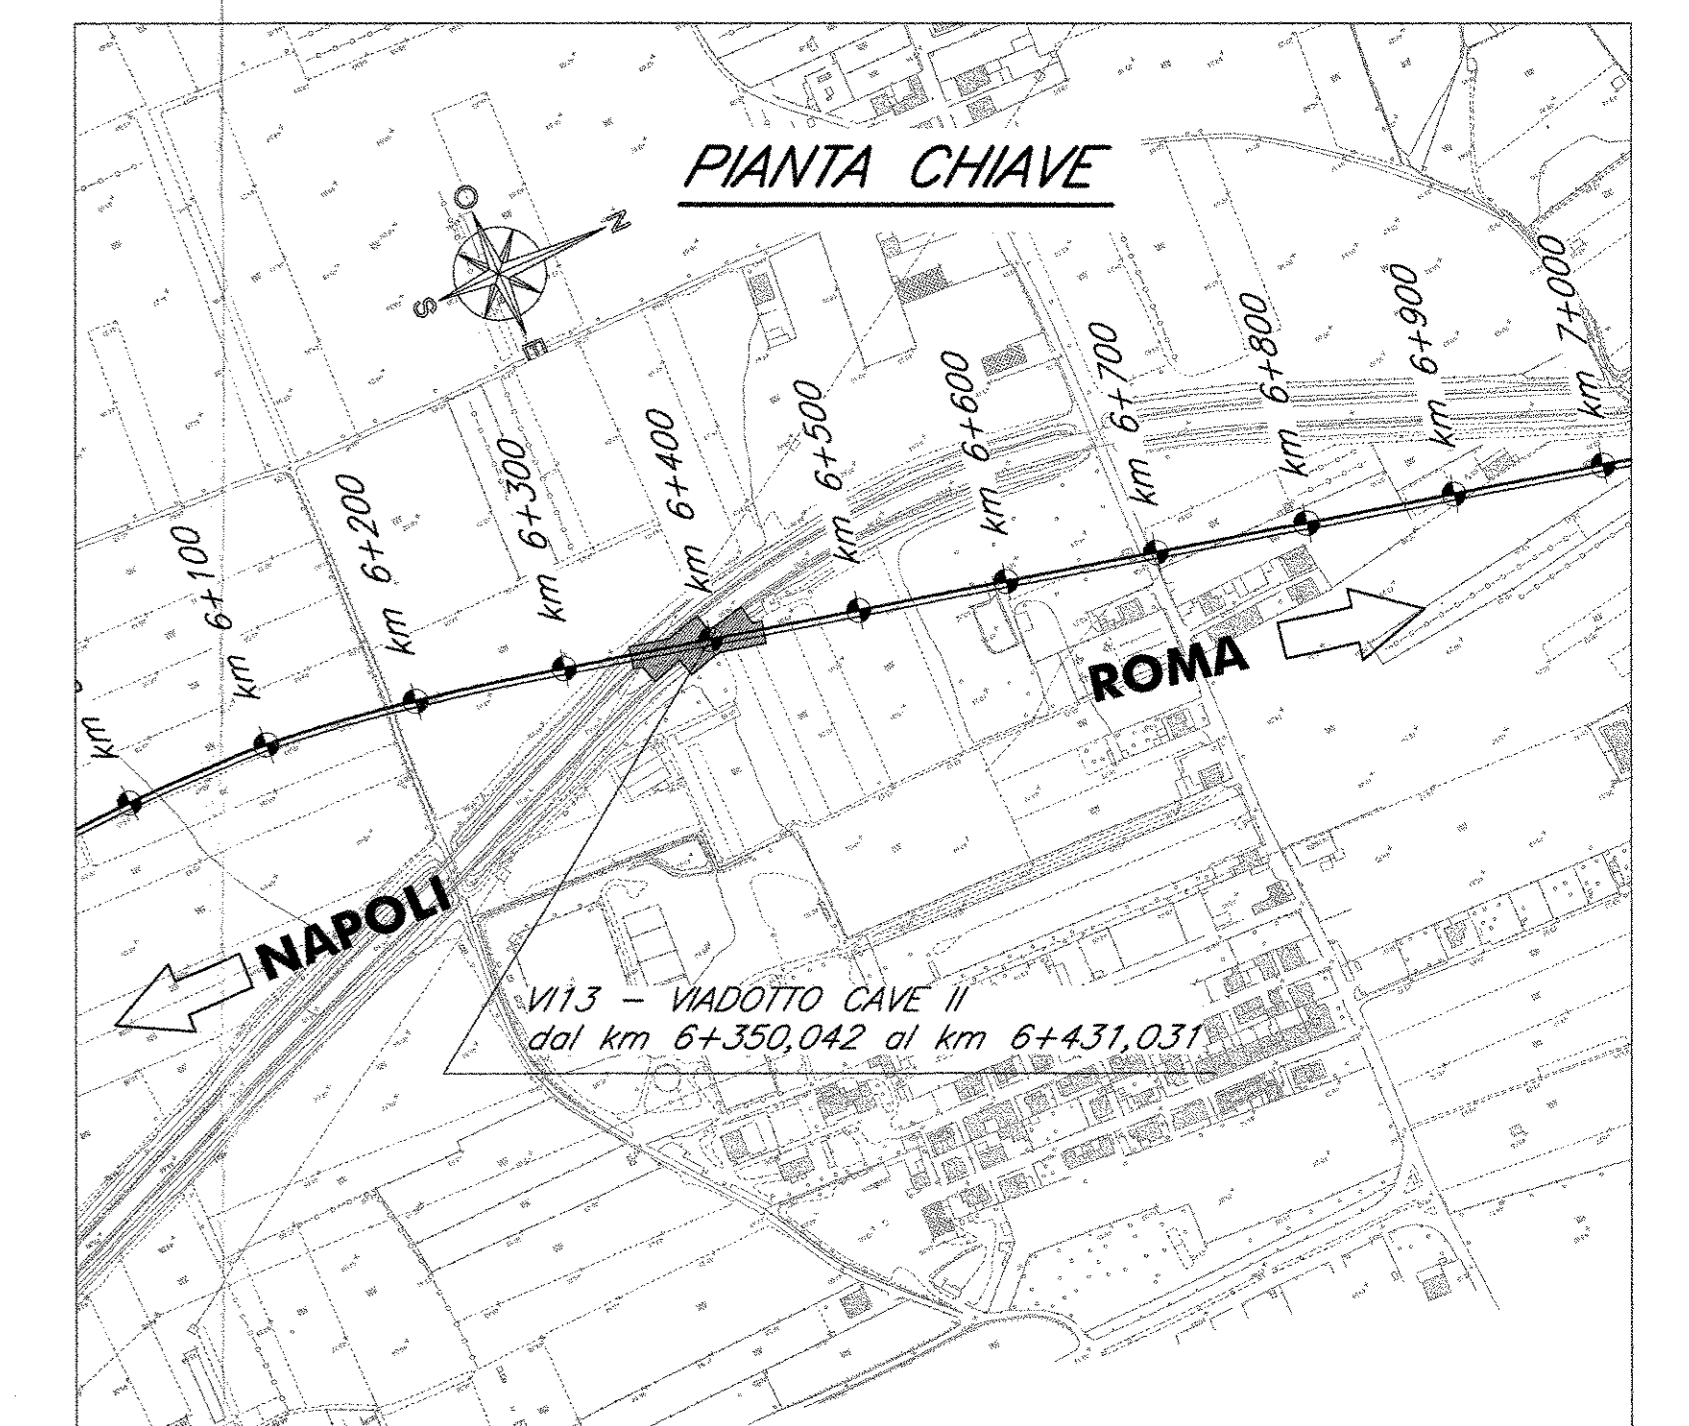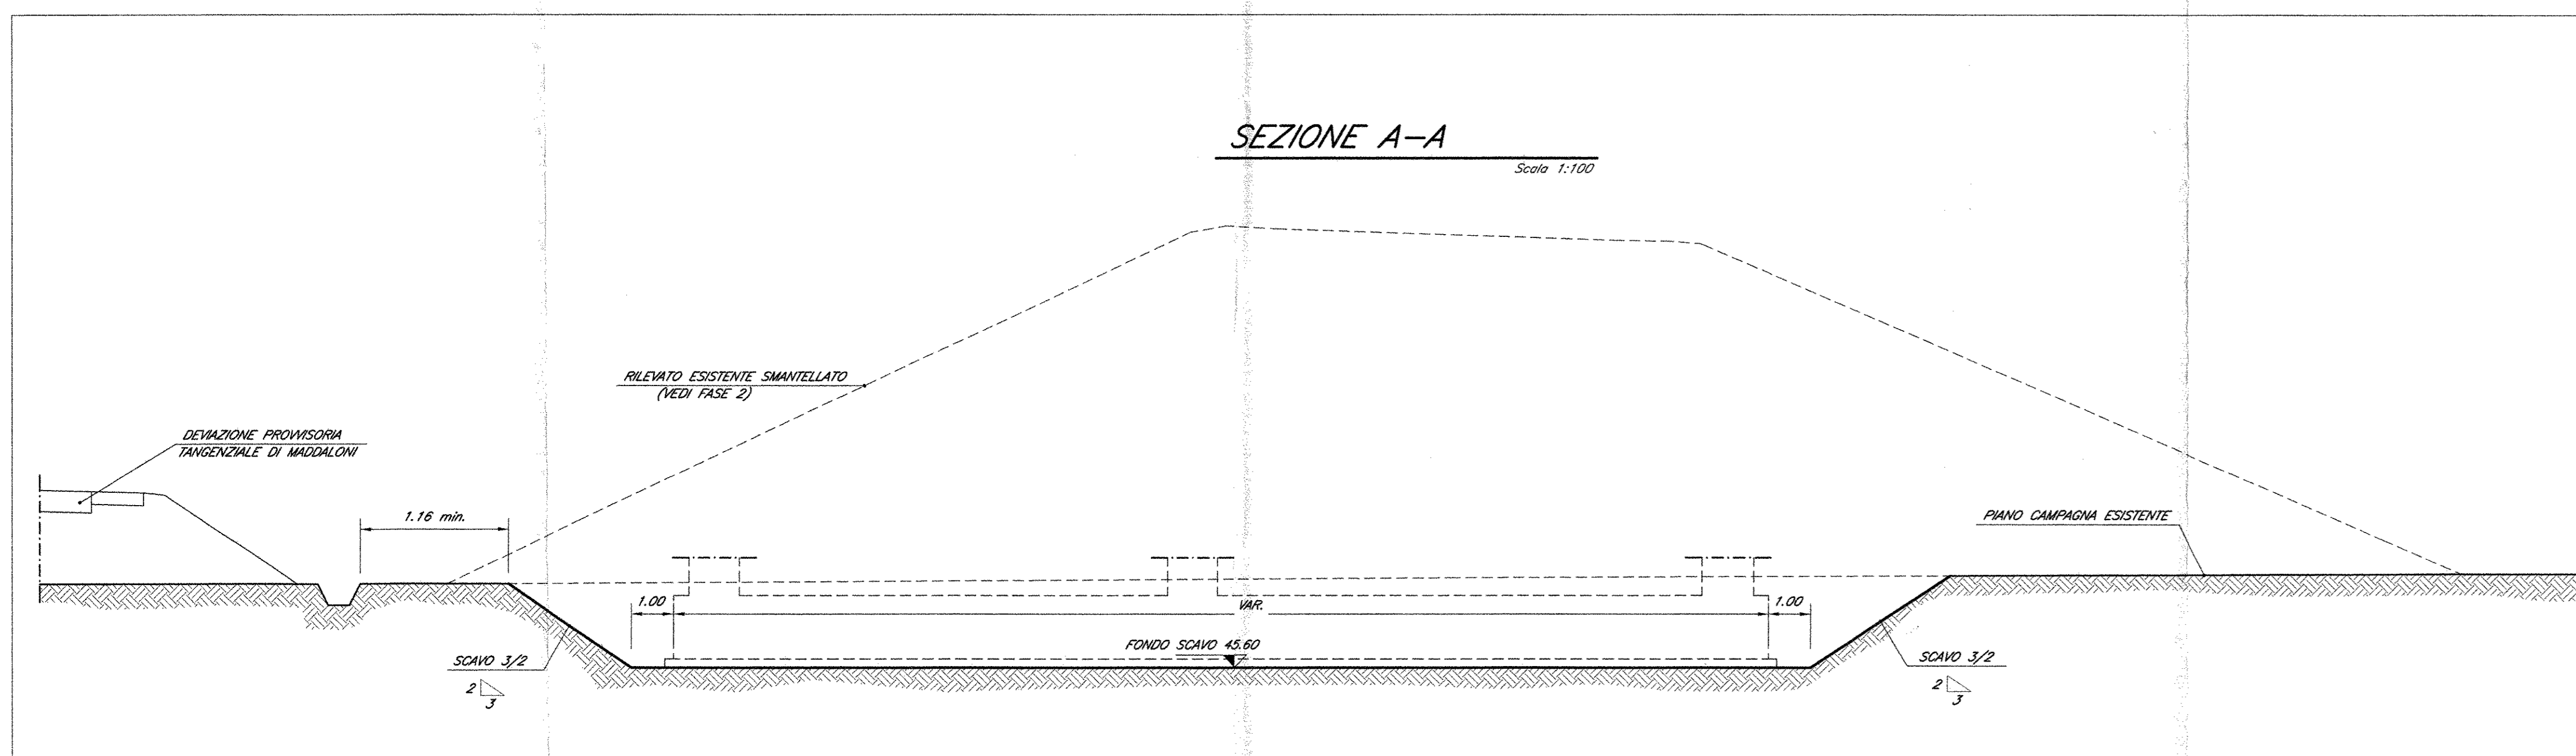

NOTE:

- 1) Per la tabella materiali e note generali fare riferimento al documento "FOFO1009100000001 - Tabella Materiali e Note generali".
- 2) Verniciatura delle superfici esterne in elevazione.

COMMITTENTE:



DIREZIONE INVESTIMENTI  
PROGRAMMA NODO DI NAPOLI

PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA  
U.O. STRUTTURE

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI  
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO  
1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE DI MADDALONI

PONTI E VIADOTTI

VIADOTTO dal km 6+350,042 al km 6+431,031: Viadotto Cave II

Pianta scavi e fasi realizzative

SCALA:

varie

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

IF0F 01 D 09 PZ VI1300 001 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore	Data
A	Emissione Esecutiva	A. Tosari	Lug 2015	T. Alberici	Lug 2015	F. Cerrone	Lug 2015	AGM	Lug 2015
