

# AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003



## PROGETTO DEFINITIVO PARCO EOLICO MONTI ALÀ DEI SARDI

Titolo elaborato:

### CRONOPROGRAMMA

PD	LT	GD	EMISSIONE	12/05/23	0	0
REDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV	

#### PROPONENTE



**PONENTE PRIME S.R.L.**

VIA A. DE GASPERI N. 8  
74023 GROTTAGLIE (TA)

#### CONSULENZA



**GE.CO.D'OR S.R.L.**

VIA A. DE GASPERI N. 8  
74023 GROTTAGLIE (TA)

#### PROGETTISTA

ING. GAETANO D'ORONZIO  
VIA GOITO 14 – COLOBRARO (MT)

Codice  
MAEG005

Formato  
A4

Scala  
/

Foglio  
1 di 4

Indice

1	<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
2	<b>CRONOPROGRAMMA</b>	<b>4</b>


## 1 PREMESSA

La “**Ponente Prime s.r.l.**” è una società costituita per realizzare un impianto eolico in Sardegna, denominato “**Parco Eolico Monti Alà dei Sardi**”, nel territorio del Comune di Monti e Alà dei Sardi, (Provincia di Sassari), della potenza totale di 86,4 MW e con punto di connessione a 150 kV in corrispondenza della stazione elettrica RTN Terna “Buddusò” 150 kV nel Comune di Buddusò (SS).

A tale scopo la Ge.co.D’Or. s.r.l., società italiana impegnata nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare focus nel settore dell’eolico e proprietaria della suddetta società, si è occupata della progettazione definitiva per la richiesta di Autorizzazione Unica (AU) alla costruzione e l’esercizio del suddetto impianto eolico e della relativa Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA).



**Figura 1.1:** Localizzazione Parco Eolico Monti Alà dei Sardi

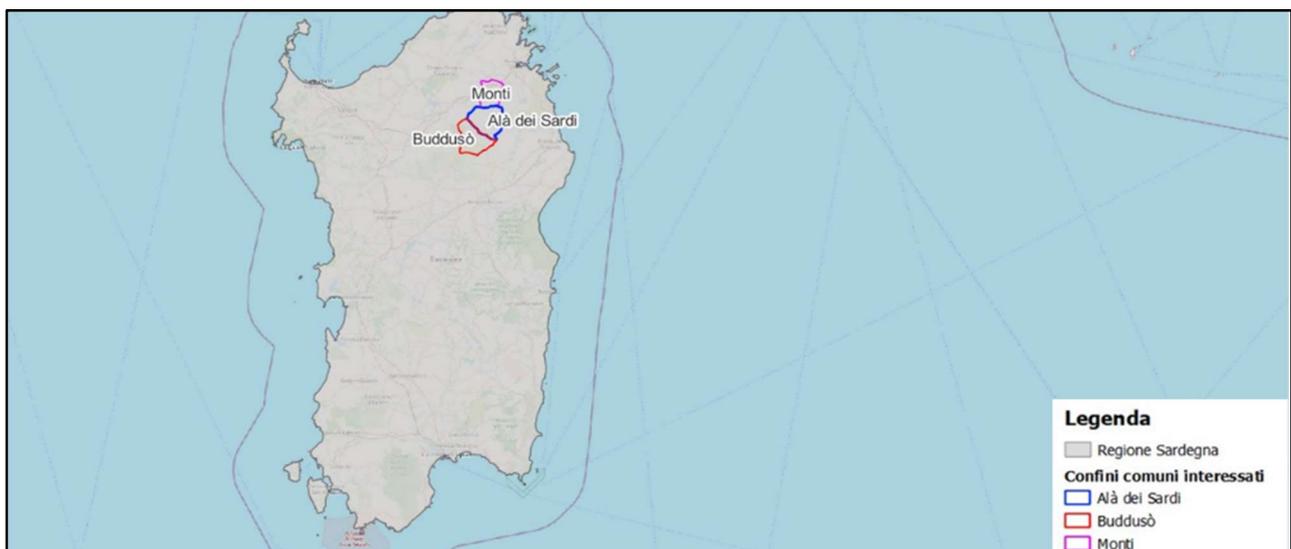

**Figura 1.2:** Localizzazione Parco Eolico Monti Alà dei Sardi con individuazione dei Comuni interessati

L'impianto eolico presenta una potenza totale pari a 86,4 MW ed è costituito da 12 aerogeneratori, di potenza nominale pari a 7,2 MW (modello Vestas V172 con altezza torre pari a 114 m e rotore pari a 172 m).

Il presente documento riporta il Cronoprogramma di sintesi per la realizzazione del progetto.

## 2 CRONOPROGRAMMA

Parco Eolico Monti Alà dei Sardi												
Cronoprogramma (mesi)												
Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Allestimento Cantiere</b>												
Realizzazione viabilità di cantiere												
Realizzazione piazzole di montaggio												
<b>Realizzazione fondazioni aerogeneratori</b>												
Completamento viabilità e piazzole di montaggio												
Realizz. sottostazione di trasformazione SEU 150/33 kV												
Realizzazione linee di distribuzione Media Tensione												
Realizzazione linea di collegamento AT												
<b>Montaggio Aerogeneratori</b>												
<b>Energizzazione Sottostazione e impianto eolico</b>												
Commissioning aerogeneratori												
<b>Entrate in esercizio impianto eolico</b>												
Ripristino opere civile e definizione piazzole definitive												
Chiusura cantiere												

**Tabella 2.1:** Cronoprogramma Parco Eolico Monti Alà dei Sardi
