



CANTIERI DALLA PK 3+387,50 ALLA PK 6+809,00				
Codice	Descrizione	Superficie	Opera di competenza	Varco di accesso
DT02bis	DEPOSITO TEMPORANEO	12.300,00 MQ	Area per depositi terra per la gestione dei materiali prodotti dagli scavi nella eventuale indisponibilità dei siti di conferimento definitivo. L'area fungerà da polmone di accumulo per tutte le opere alla galleria artificiale GA01 e alla galleria naturale GN01 lato Termoli.	3 e 4
AT04	AREA TECNICA	15.000,00 MQ	L'area tecnica funge da cantiere di imbocco per la galleria artificiale GA01 e galleria naturale GN01 e le opere provvisorie G01 lato Termoli.	2
DT02	DEPOSITO TEMPORANEO	14.500,00 MQ	Area per depositi terra per la gestione dei materiali prodotti dagli scavi nella eventuale indisponibilità dei siti di conferimento definitivo. L'area fungerà da polmone di accumulo per tutte le opere alla galleria artificiale GA01 e alla galleria naturale GN01 lato Termoli.	1
AS03	AREA STOCCAGGIO	10.000,00 MQ	L'area di stoccaggio verrà impiegata per lo stoccaggio dello scavo della galleria artificiale GA01 e della galleria naturale GN01 lato Termoli.	2

OPERE DA REALIZZARE LUNGO LINEA			
Codice	Descrizione	km inizio - fine	
VI02	Viadotto	dai Km 3+387,50	al Km 5+147,50
TR04	Trincea di affiancamento	dai Km 5+147,50	al Km 5+229,15
GA01	Galleria artificiale	dai Km 5+229,15	al Km 5+256,90
GN01	Galleria naturale	dai Km 5+256,90	al Km 6+809,00

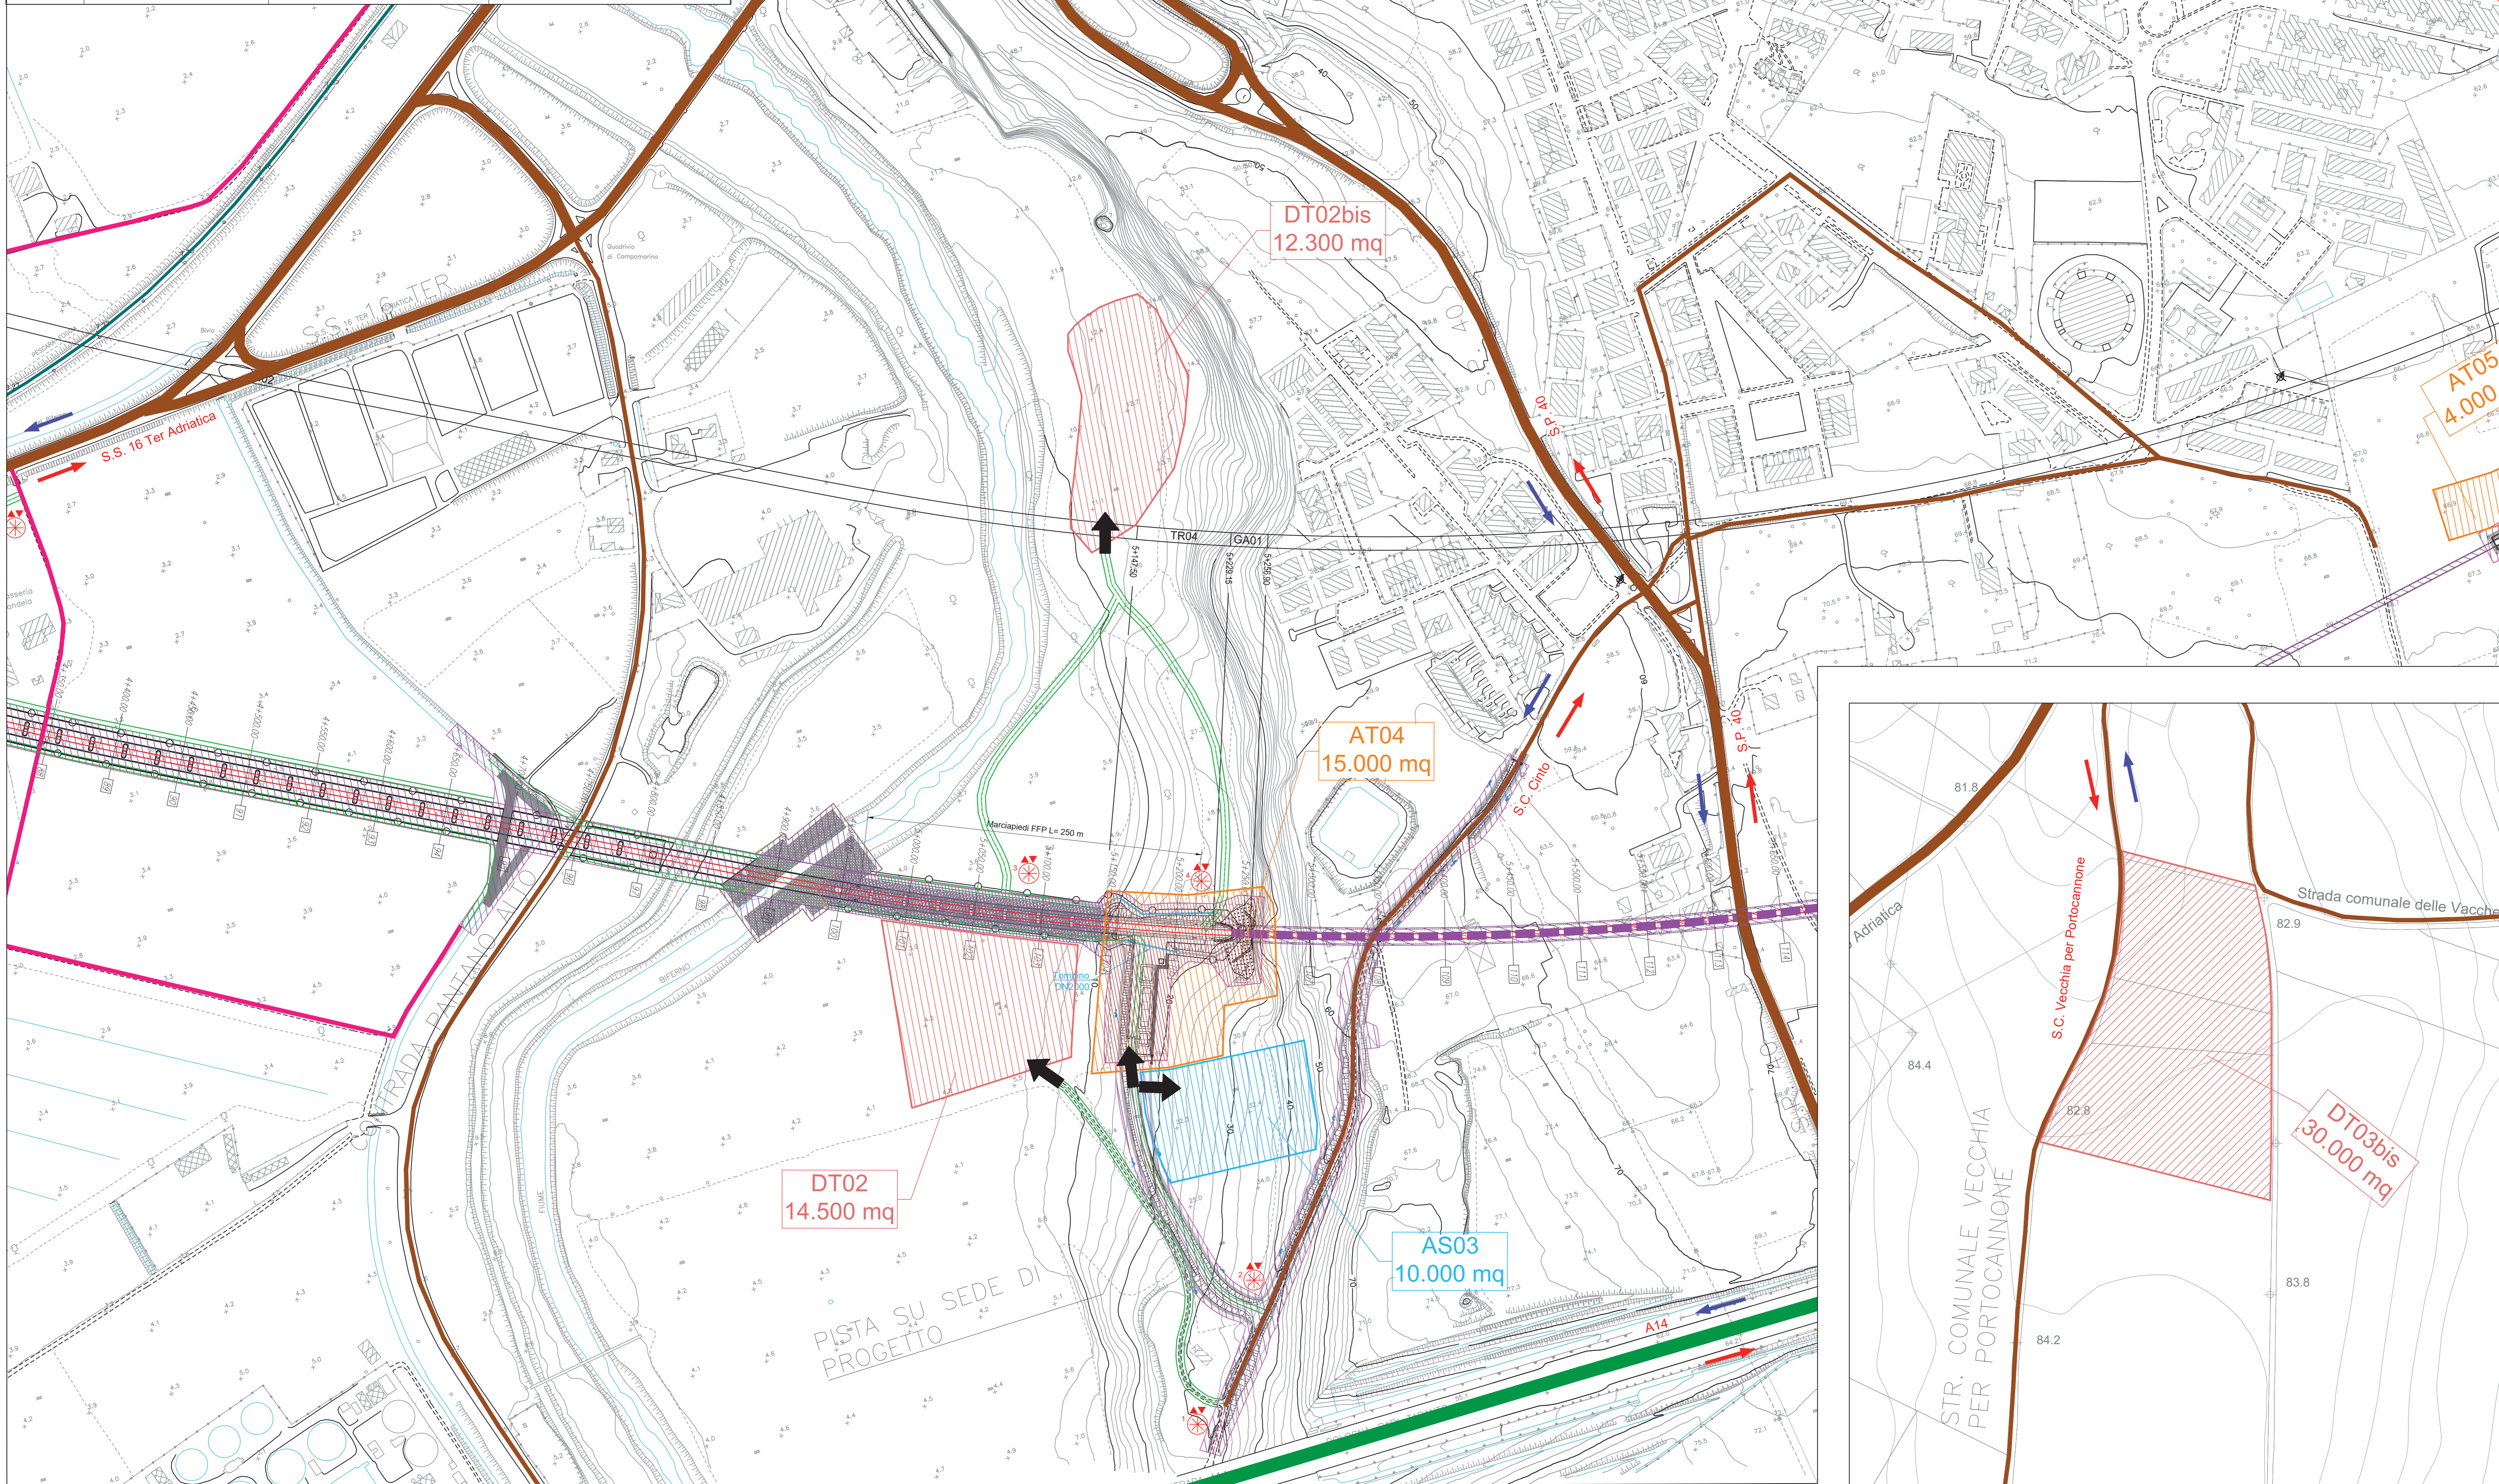

LEGENDA			
CANTIERI		VIABILITÀ	
Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
[Pattern]	CB - CANTIERE BASE	[Line]	LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO
[Pattern]	CO - CANTIERE OPERATIVO	[Line]	LINEA FERROVIARIA ESISTENTE
[Pattern]	CA - CANTIERE DI ARMAMENTO	[Line]	AUTOSTRADA A14
[Pattern]	AT - AREA TECNICA	[Line]	VIABILITÀ PRINCIPALE
[Pattern]	AS - AREA STOCCAGGIO	[Line]	VIABILITÀ SECONDARIA
[Pattern]	AL - AREA DI LAVORO	[Line]	VIABILITÀ DA ADEGUARE
[Pattern]	AD - AREA DIMISSIONE	[Line]	PISTA DI CANTIERE
[Pattern]	DT - DEPOSITO TEMPORANEO	[Line]	LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO A CURA DI ALTRO APPALTA
[Pattern]	AREA DI CANTIERE A CURA DI ALTRO APPALTA	[Line]	PROSPETTIVA FOTOGRAFICA
[Arrow]	ACCESSO AI CANTIERI	[Symbol]	VARCO DI ACCESSO
		[Symbol]	SENSI DI MARCIA

TABELLA DEI CANTIERI			
Codice	Descrizione	Comune	Superficie
CB01	CANTIERE BASE PER LAVORI DA INIZIO INTERVENTO A FINE VARIANTE	CAMPOMARINO (CB)	8,500 mq
CB02	CANTIERE BASE PER LAVORI DA FINE VARIANTE A FINE INTERVENTO	CHEITI (FG)	20,000 mq
CO01	CANTIERE OPERATIVO	TERMOLI (CB)	11,000 mq
CO02	CANTIERE OPERATIVO	CAMPOMARINO (CB)	10,000 mq
CO03	CANTIERE OPERATIVO	CHEITI (FG)	30,000 mq
AT02	AREA TECNICA	TERMOLI (CB)	3,000 mq
AT03	AREA TECNICA	TERMOLI (CB)	9,000 mq
AT04	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	15,000 mq
AT05	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	4,000 mq
AT06	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	6,700 mq
AT07	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	9,000 mq
AT08	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	4,000 mq
AT09	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	2,600 mq
AT10	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	5,600 mq
AT11	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	9,100 mq
AT12	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	900 mq
AS01	AREA DI STOCCAGGIO	TERMOLI (CB)	3,900 mq
AS02	AREA DI STOCCAGGIO	TERMOLI (CB)	8,400 mq
AS03	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	10,000 mq
AS04	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	15,000 mq
AS05	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	11,500 mq
AS06	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	11,500 mq
AS07	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	900 mq
AS08	AREA DI STOCCAGGIO	CHEITI (FG)	5,000 mq
AS09	AREA DI STOCCAGGIO	CHEITI (FG)	7,500 mq
AS10	AREA DI STOCCAGGIO	SERRACAPRIOLA (FG)	10,000 mq
CA01	CANTIERE DI ARMAMENTO ALL'INTERNO DELLA STAZIONE FS DI TERMOLI	TERMOLI (CB)	13,000 mq
CA02	CANTIERE PER DIMISSIONE L.S. ALL'INTERNO DELLA STAZ. FS DI CAMPOMARINO	CAMPOMARINO (CB)	2,500 mq
CA03	CANTIERE DI ARMAMENTO DA ALLESTIRE IN ADIACENZA AL SEDILE IN PROGETTO ALLA FERMAIA FS DI NUOVA CETERNA (ATTUALMENTE FUORI USO)	SERRACAPRIOLA (FG)	14,400 mq
ASD01	CANTIERE PER LA DIMISSIONE DELLA L.S. ADIACENTE ALLA FERMAIA FS DI NUOVA CETERNA (ATTUALMENTE FUORI USO)	CAMPOMARINO (CB)	5,000 mq
ASD02	CANTIERE PER DIMISSIONE L.S. ALL'INTERNO DELLA STAZ. FS DI CHEITI	CAMPOMARINO (CB)	3,300 mq
DT01	DEPOSITO TEMPORANEO	TERMOLI (CB)	21,500 mq
DT02	DEPOSITO TEMPORANEO	TERMOLI (CB)	14,500 mq
DT02bis	DEPOSITO TEMPORANEO	TERMOLI (CB)	12,300 mq
DT03bis	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	30,000 mq
DT03	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	36,000 mq
DT04	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	28,800 mq
DT05	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	16,000 mq
DT06	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	20,000 mq
DT07	DEPOSITO TEMPORANEO	CHEITI (FG)	15,000 mq
DT08	DEPOSITO TEMPORANEO	SERRACAPRIOLA (FG)	21,000 mq

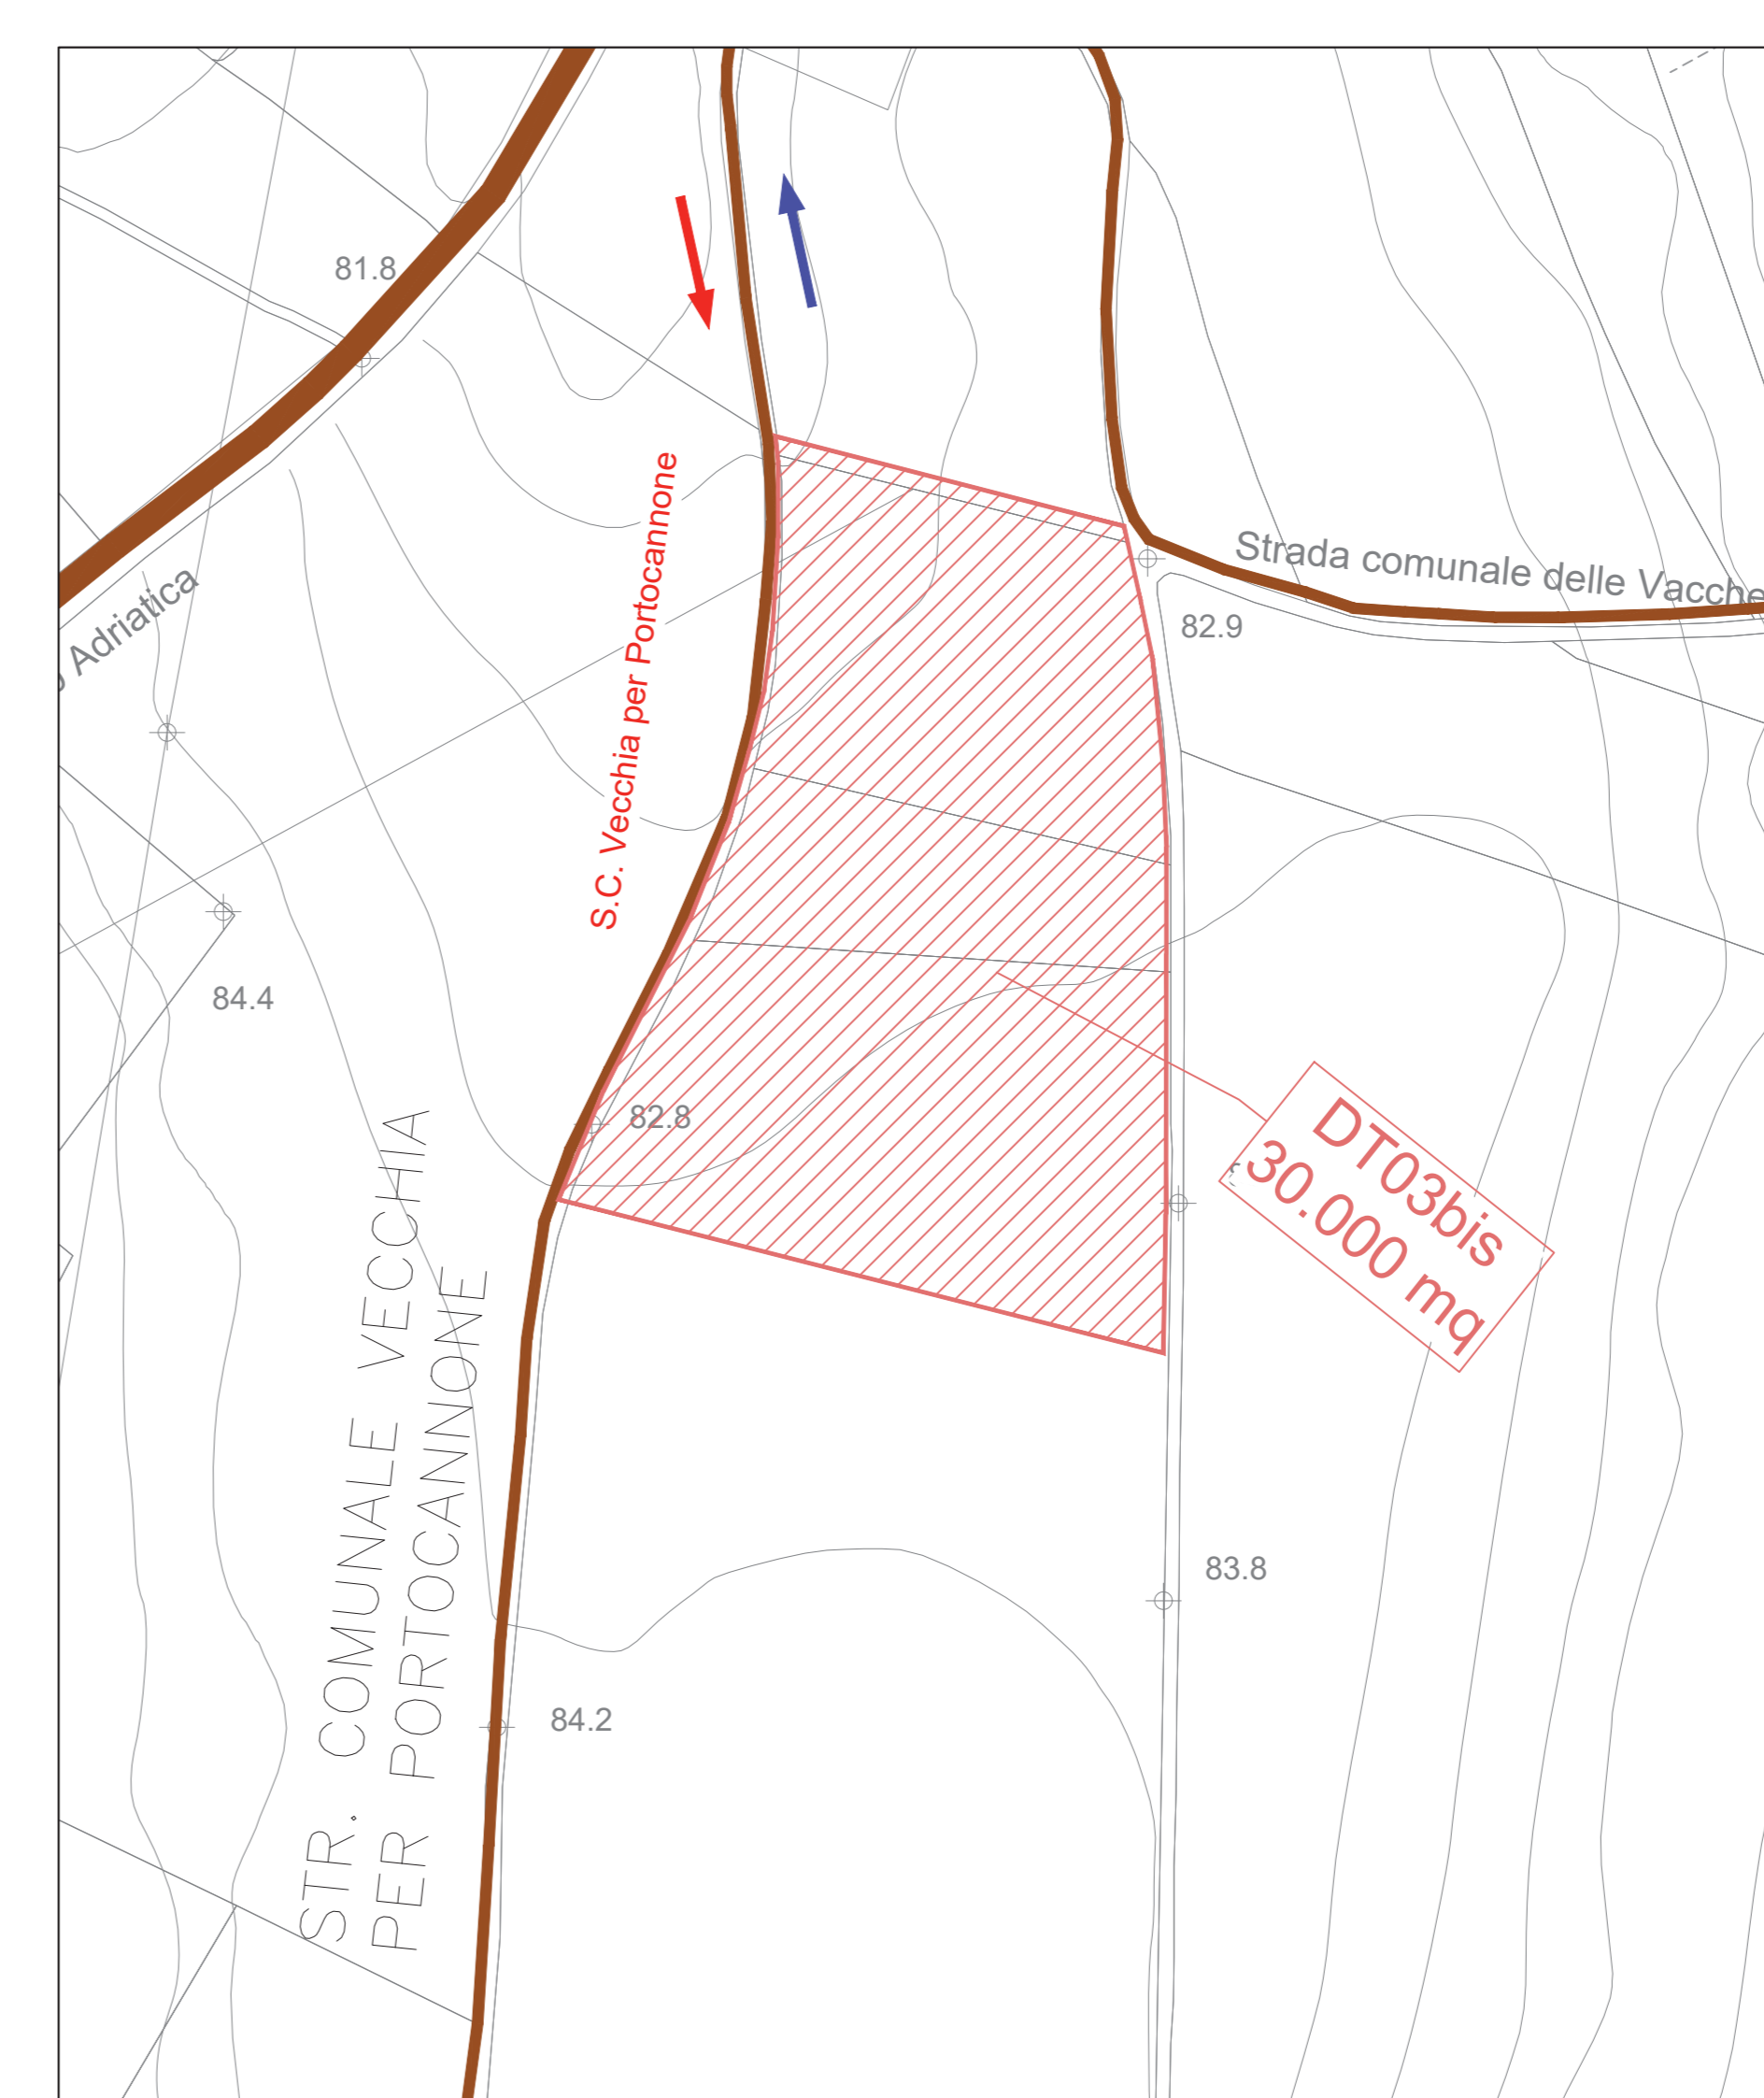

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
 DIREZIONE INVESTIMENTI
 DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
 DIRETTRICE SUO - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTAZIONE: **ACOSTINO** COSTRUZIONI INGEN. **ATLANTE**

MANDATARIA: **HUB** MANDANTI: **ITV pro**

PROGETTO ESECUTIVO
LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Planimetria di dettaglio viabilità e aree di cantiere tav. 4 di 17
 DAL KM 3+387,50 AL KM 6+809,00

APALTAZIONE: **ACOSTINO** COSTRUZIONI INGEN. **ATLANTE** PROGETTAZIONE: **HUB** MANDANTI: **ITV pro** SCALA: 1:2.000

COMMESSA: LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

L10B 02 E ZI P6 CA000 004 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	in viale	[Signature]	24/10/22	[Signature]	24/10/22	[Signature]	25/10/22		

File: L10B02EZZP6CA00001-17A.DWG n. Elab.: _____
