
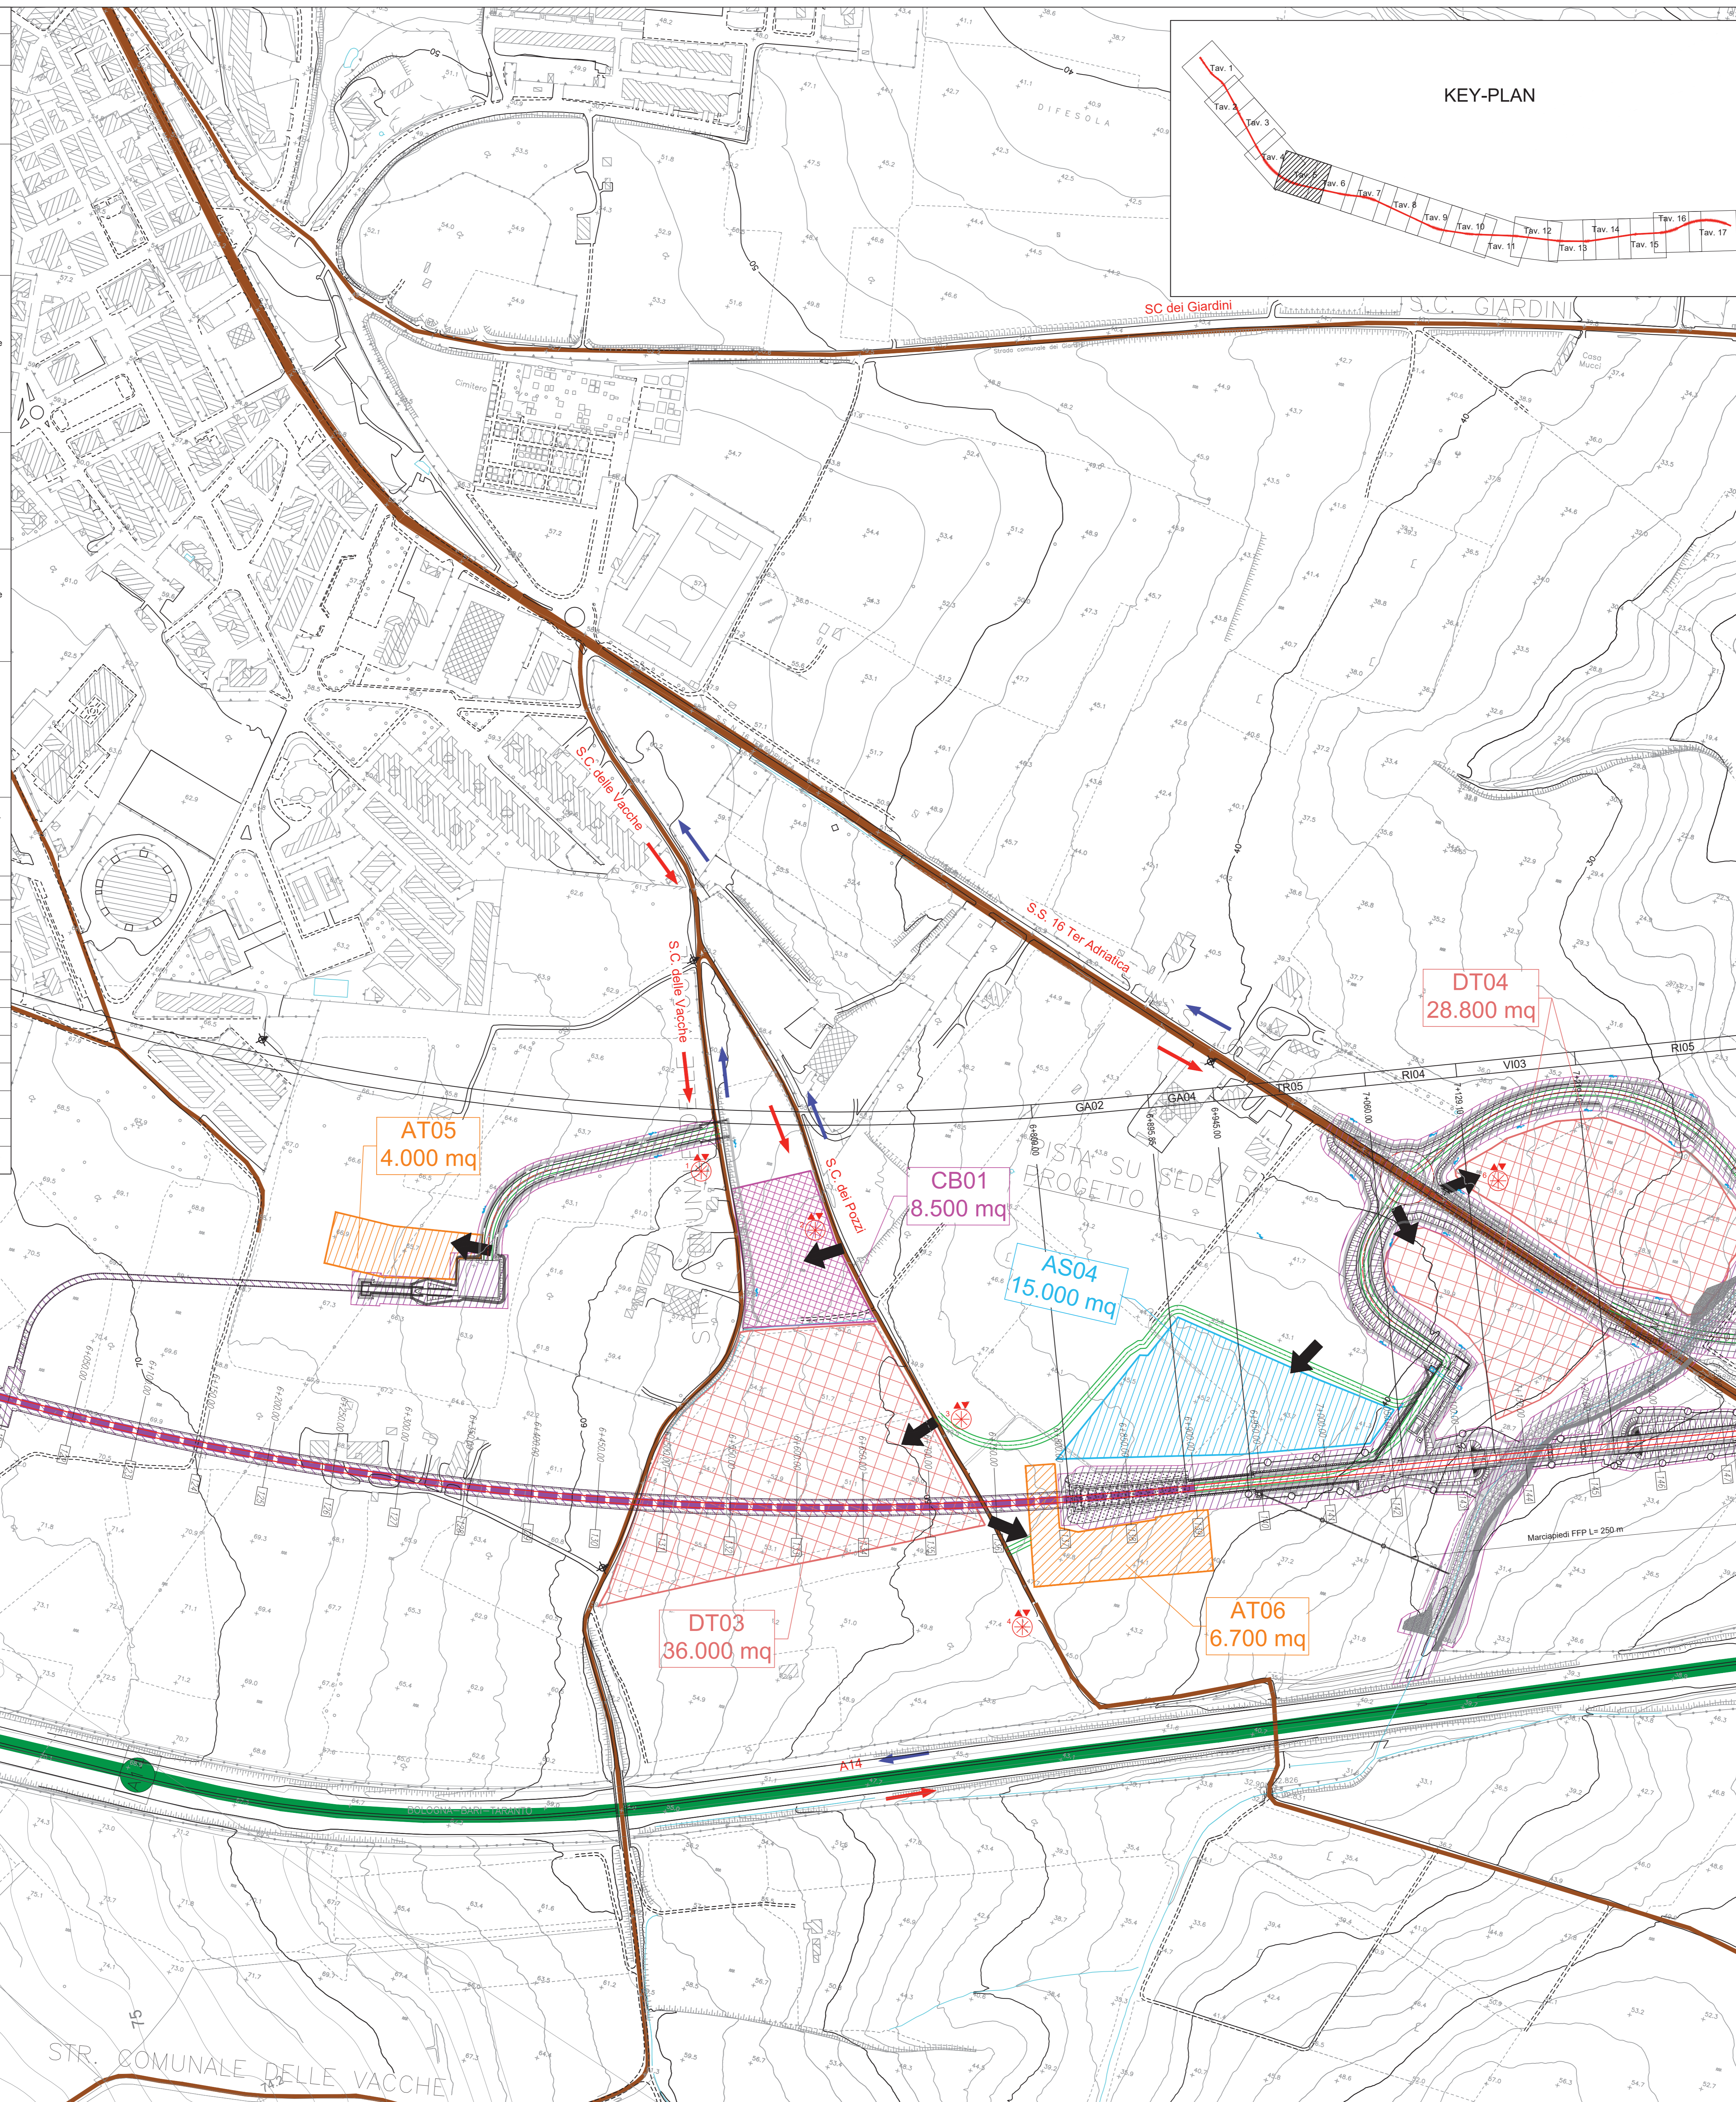


CANTIERI DALLA PK 5+256,90 ALLA PK 6+895,85				
Codice	Descrizione	Superficie	Opera di competenza	Varco di accesso
AT05	AREA TECNICA	4.000,00 MQ	L'area tecnica funge da cantiere di imbocco per lo scavo della finestra d'accesso alla galleria naturale GN01.	1
CB01	CANTIERE BASE	8.500,00 MQ	SUPPORTO LOGISTICO AI CO01 E CO02 - da RI03 a VI03 SUPPORTO LOGISTICO PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE, DEMOLIZIONI, SERVIZI INTERFERENTI, BOL. E OPERE PRIMI 90 GIORNI (GI01, GI02, GA04, NV03, GA05, VI03, VI01, RI04, TR05, VI02, NI10, BR01)	2
AS04	AREA STOCCAGGIO	15.000,00 MQ	L'area di stoccaggio verrà impiegata per lo stoccaggio dello scavo galleria naturale GN01 e le gallerie artificiali GA02, GA03, GA04, GA05 lato Ripalta. Preliminarmente tale area darà supporto anche alle attività connesse alle demolizioni dei manufatti esistenti e i servizi interferenti riconducibili alle attività propedeutiche. Pertanto tale area sarà resa immediatamente operativa.	3
DT03	DEPOSITO TEMPORANEO	36.000,00 MQ	Area per depositi terra per la gestione dei materiali prodotti dagli scavi nella eventuale indisponibilità dei siti di conferimento definitivo. L'area fungerà da palomine di accumulo per tutte le opere alle gallerie artificiali GA02, GA03, GA04, GA05 e la galleria naturale GN01 lato Ripalta.	3
DT04	DEPOSITO TEMPORANEO	28.800,00 MQ	Area per depositi terra per la gestione dei materiali prodotti dagli scavi nella eventuale indisponibilità dei siti di conferimento definitivo. L'area fungerà da palomine di accumulo per tutte le opere alle gallerie artificiali GA02, GA03, GA04, GA05 e la galleria naturale GN01 lato Ripalta.	6
AT06	AREA TECNICA	6.800,00 MQ	L'area tecnica funge da cantiere di imbocco per lo scavo della galleria naturale GN01 lato Ripalta. Preliminarmente tale area darà supporto anche alle attività connesse alle demolizioni dei manufatti esistenti e i servizi interferenti riconducibili alle attività propedeutiche e le opere provvisorie GI02. Pertanto tale area sarà resa immediatamente operativa.	4
CA02	CANTIERE PER DIMISSIONE	2.500,00 MQ	L'area funge da supporto per le attività di dimissione della linea storica. Sarà destinata in parte allo stoccaggio del materiale proveniente dallo smantellamento della sovrastruttura ferroviaria.	5

OPERE DA REALIZZARE LUNGO LINEA			
Codice	Descrizione	km inizio - fine	
GN01	Galleria naturale	dal Km 5+256,90	al Km 6+899,00
GA02	Galleria artificiale	dal Km 6+809,00	al Km 6+895,85
GA04	Galleria artificiale	dal Km 6+895,85	al Km 6+945,00
TR05	Trincea di affiancamento	dal Km 6+945,00	al Km 7+060,00
RI04	Rilevato in affiancamento	dal Km 7+060,00	al Km 7+129,10
VI03	Viadotto	dal Km 7+129,10	al Km 7+219,10
RI05	Rilevato in affiancamento	dal Km 7+219,10	al Km 7+397,50
GA05	Galleria artificiale	dal Km 7+397,50	dal Km 7+423,75
TR06	Trincea di affiancamento	dal Km 7+423,75	al Km 7+711,39

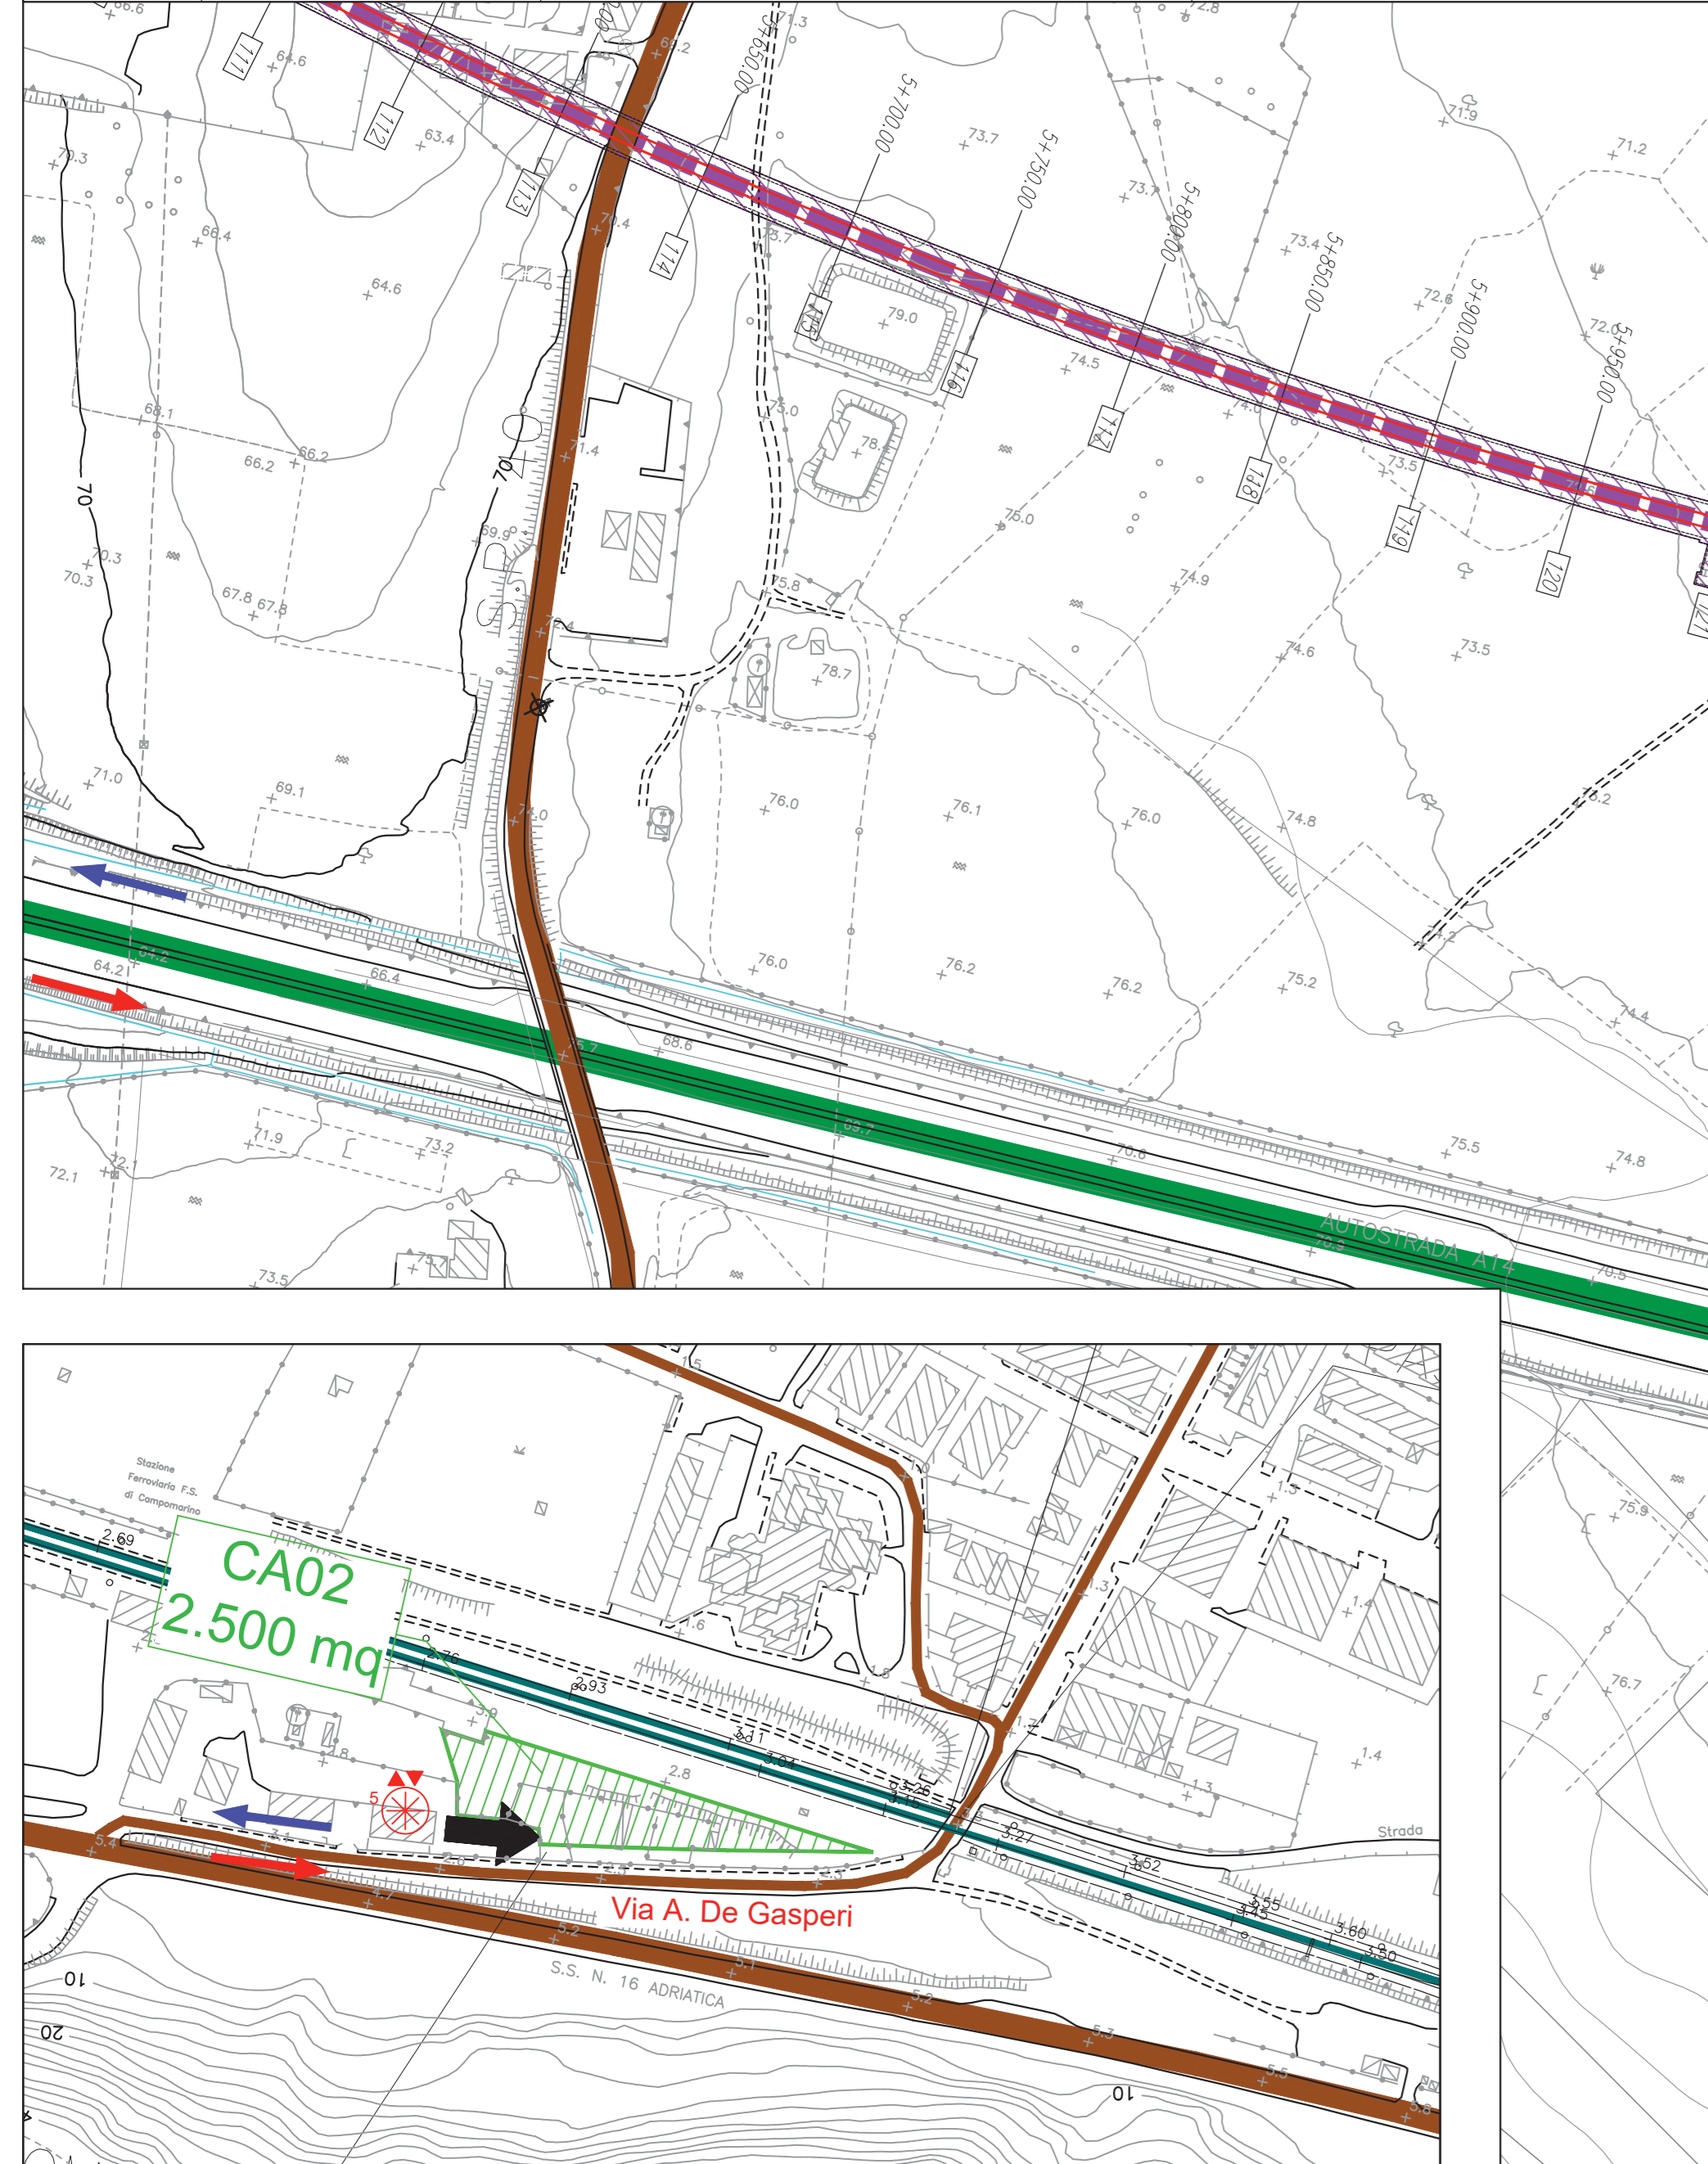

LEGENDA			
CANTIERI		VIABILITÀ	
	CB - CANTIERE BASE		LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO
	CO - CANTIERE OPERATIVO		LINEA FERROVIARIA ESISTENTE
	CA - CANTIERE DI ARMAMENTO		AUTOSTRADA A14
	AS - AREA STOCCAGGIO		VIABILITÀ PRINCIPALE
	AL - AREA DI LAVORO		VIABILITÀ SECONDARIA
	AD - AREA DIMISSIONE		VIABILITÀ DA ADEGUARE
	DT - DEPOSITO TEMPORANEO		PISTA DI CANTIERE
	AREA DI CANTIERE A CURA DI ALTRO APPALTO		LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO A CURA DI ALTRO APPALTO
	ACCESSO AI CANTIERI		PROSPETTIVA FOTOGRAFICA
	SENSI DI MARCIA		VARCO DI ACCESSO

TABELLA DEI CANTIERI			
Codice	Descrizione	Comune	Superficie
CB01	CANTIERE BASE PER LAVORI DA INIZIO INTERVENTO A FINE VARIANTE	CAMPOMARINO (CB)	8.500 mq
CO02	CANTIERE BASE PER LAVORI DA FINE VARIANTE A FINE INTERVENTO	CHELTI (CO)	20.000 mq
CO01	CANTIERE OPERATIVO	TERMUOLI (CO)	11.000 mq
CO02	CANTIERE OPERATIVO	CAMPOMARINO (CB)	10.000 mq
CO03	CANTIERE OPERATIVO	CHELTI (CO)	30.000 mq
AT02	AREA TECNICA	TERMUOLI (CB)	3.000 mq
AT03	AREA TECNICA	TERMUOLI (CB)	9.000 mq
AT04	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	15.000 mq
AT05	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	4.000 mq
AT06	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	6.700 mq
AT07	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	9.000 mq
AT08	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	4.000 mq
AT09	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	2.600 mq
AT10	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	5.600 mq
AT11	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	9.100 mq
AT12	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	900 mq
AS01	AREA DI STOCCAGGIO	TERMUOLI (CB)	3.900 mq
AS02	AREA DI STOCCAGGIO	TERMUOLI (CB)	8.400 mq
AS03	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	10.000 mq
AS04	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	15.000 mq
AS05	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	11.500 mq
AS06	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	11.500 mq
AS07	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	900 mq
AS08	AREA DI STOCCAGGIO	CHELTI (CO)	5.000 mq
AS09	AREA DI STOCCAGGIO	CHELTI (CO)	7.500 mq
AS10	AREA DI STOCCAGGIO	SERRACAPROLA (FG)	10.000 mq
CA01	CANTIERE DI ARMAMENTO ALL'INTERNO DELLA STAZIONE FS DI TERMUOLI	TERMUOLI (CB)	13.000 mq
CA02	CANTIERE PER DIMISSIONE L.S. ALL'INTERNO DELLA STAZIONE FS DI CAMPOMARINO	CAMPOMARINO (CB)	2.500 mq
CA03	CANTIERE DI ARMAMENTO DA ALESSANDRIA IN ADESIONE AL SEDIME IN PROGETTO	SERRACAPROLA (FG)	14.400 mq
ASD01	CANTIERE PER LA DIMISSIONE DELLA L.S. ADIACENTE ALLA FERMATA FS DI NUOVA CLITERNA (ATTUALMENTE FUORI USO)	CAMPOMARINO (CB)	5.000 mq
ASD02	CANTIERE PER DIMISSIONE L.S. ALL'INTERNO DELLA STAZIONE FS DI CHELTI	CAMPOMARINO (CB)	3.300 mq
DT01	DEPOSITO TEMPORANEO	TERMUOLI (CB)	21.500 mq
DT02	DEPOSITO TEMPORANEO	CHELTI (CO)	14.500 mq
DT02bis	DEPOSITO TEMPORANEO	TERMUOLI (CB)	12.300 mq
DT03bis	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	30.000 mq
DT03	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	36.000 mq
DT04	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	28.800 mq
DT05	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	16.000 mq
DT06	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	20.000 mq
DT07	DEPOSITO TEMPORANEO	CHELTI (CO)	15.000 mq
DT08	DEPOSITO TEMPORANEO	SERRACAPROLA (FG)	21.000 mq

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTORE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **ACOSTINO** COSTRUZIONI, **ATALENTI** MANDATARI

PROGETTAZIONE: **HUB** MANDATARI, **pro** MANDATARI

PROGETTO ESECUTIVO
LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Planimetria di dettaglio viabilità e aree di cantiere tav. 5 di 17
DAL KM 5+256,90 AL KM 6+895,85

APPALTATORE: **ACOSTINO** COSTRUZIONI, **ATALENTI** MANDATARI
PROGETTAZIONE: **HUB** MANDATARI, **pro** MANDATARI
SCALA: 1:2.000

COMMESSA: L10B 02 E ZI P6 CA000B 005 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Planimetria	S. Mannoia	24/10/22	S. Cantata	24/10/22	T. Pella	25/10/22	
B	Revisione aggiornata plani	S. Mannoia	14/11/22	S. Cantata	16/11/22	T. Pella	16/11/22	

File: L10B02EZZP6CA000005B.DWG n. Elab.: 1
