


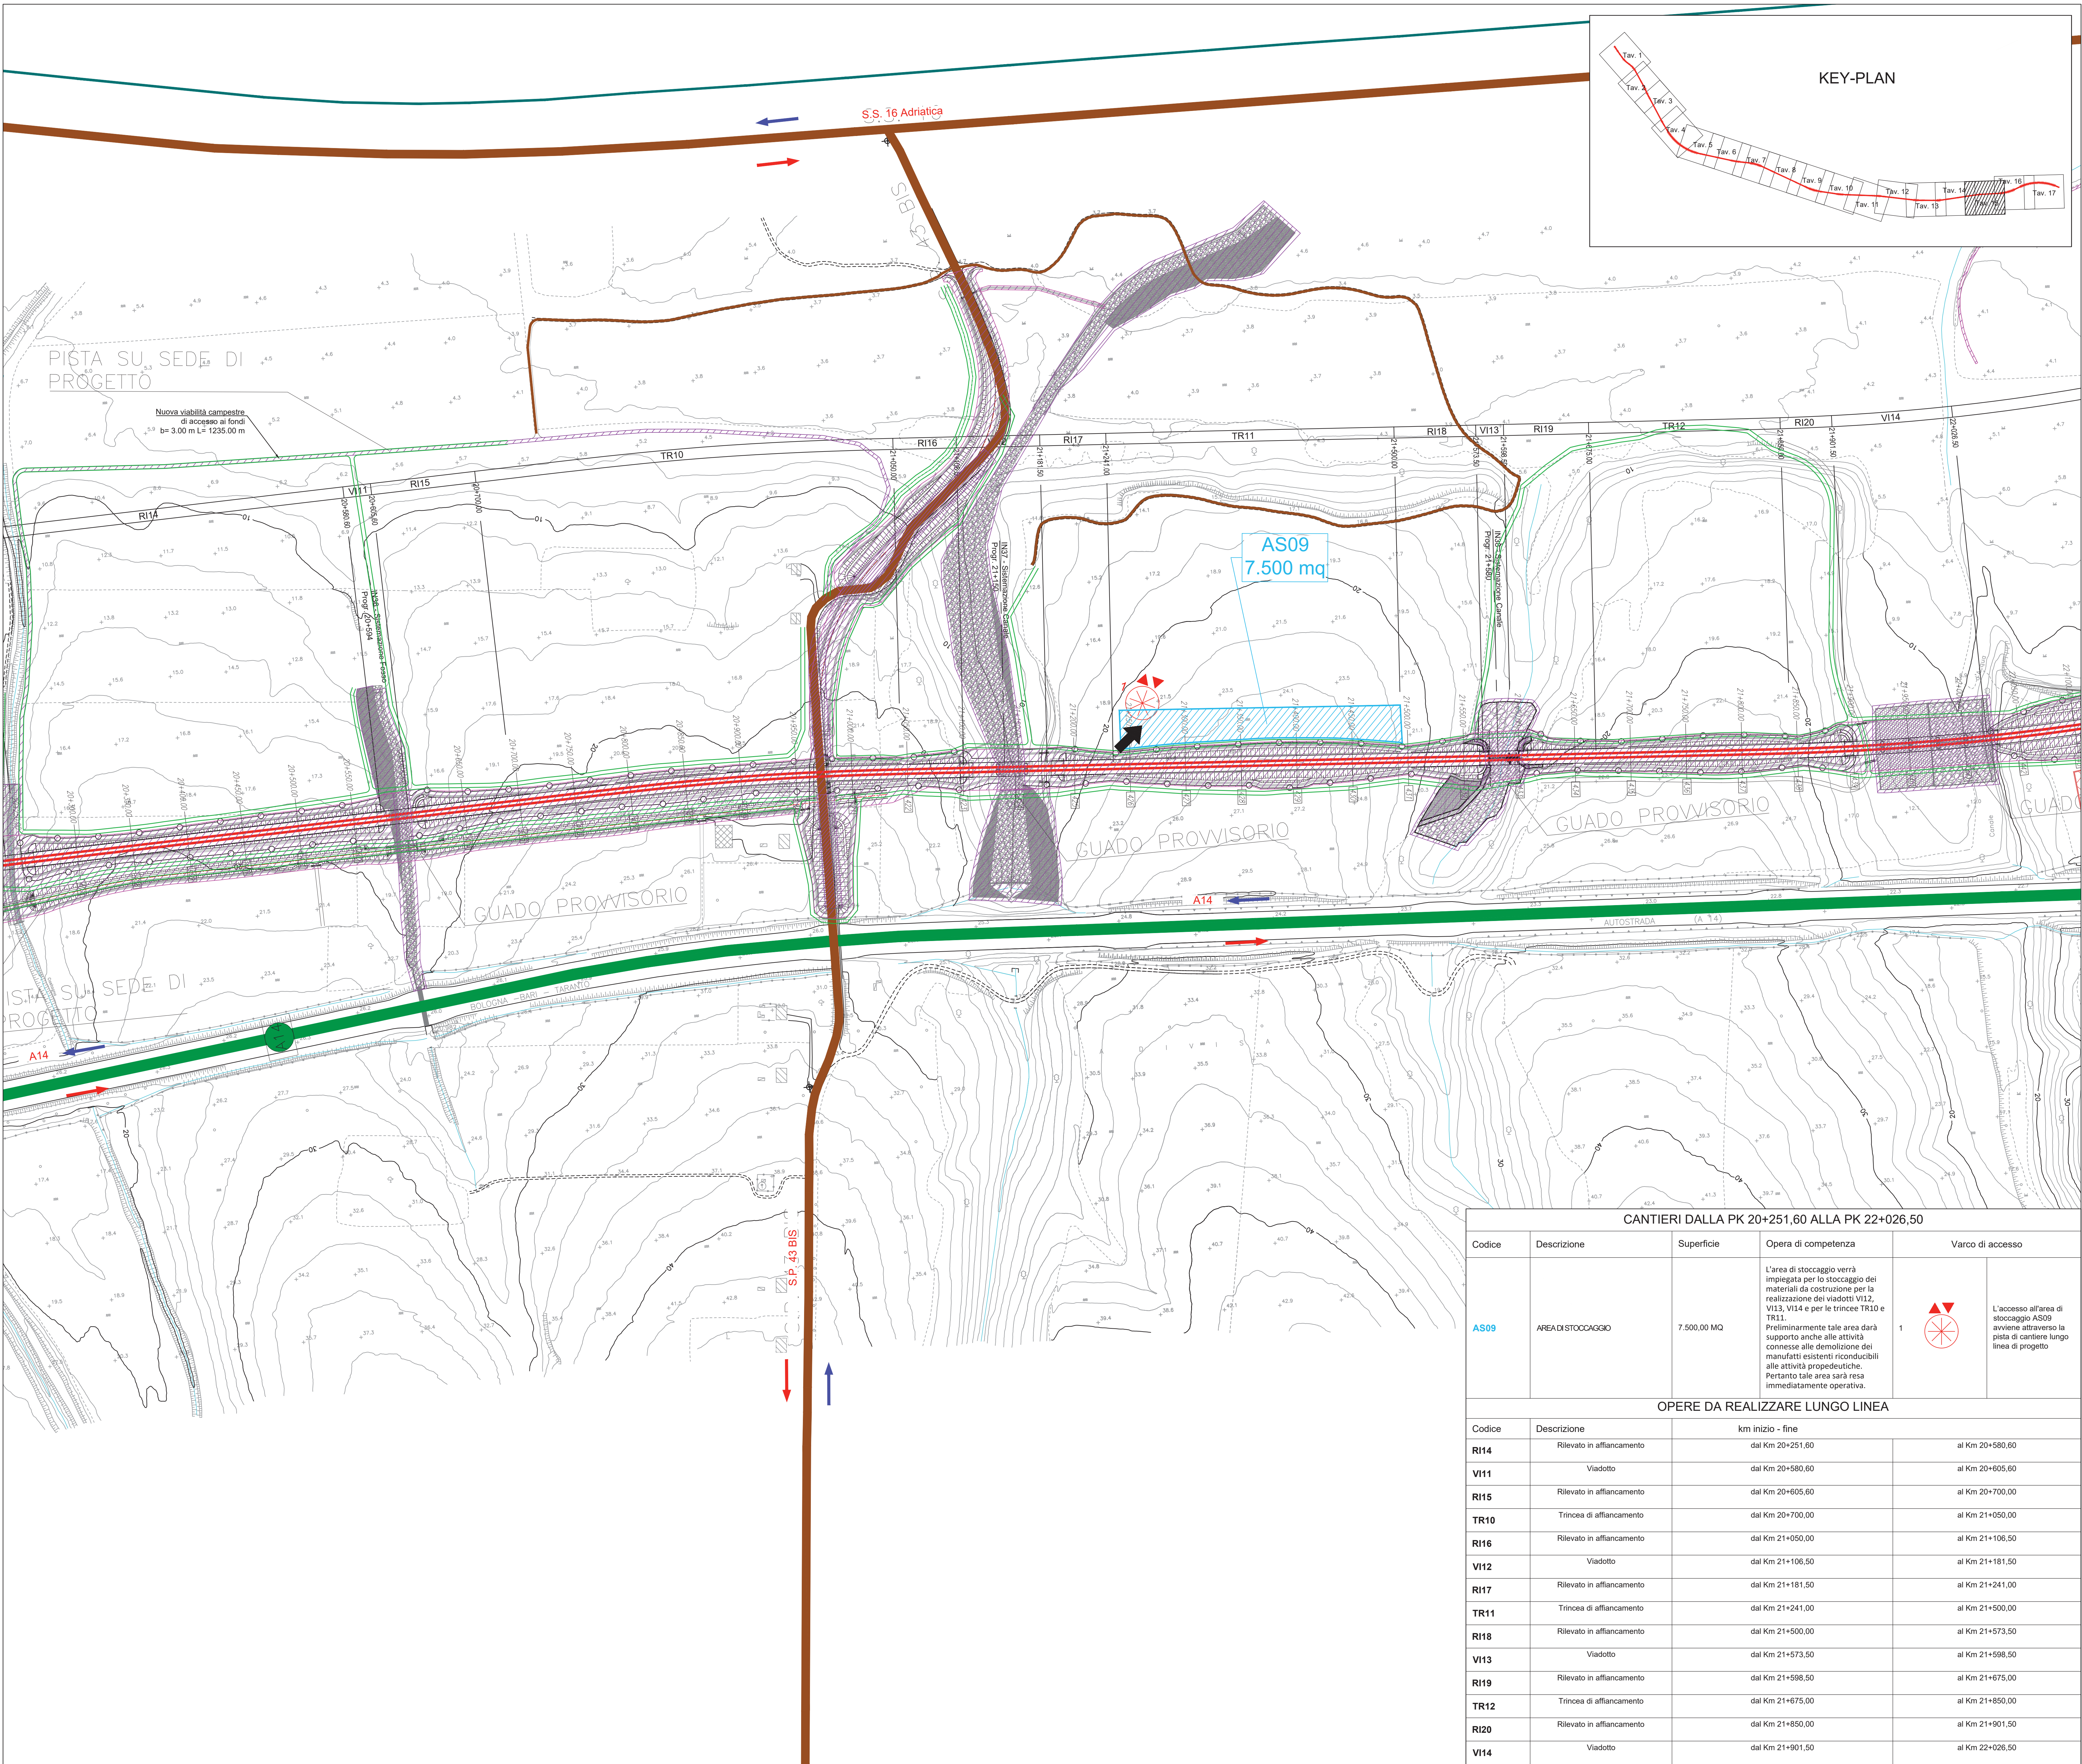

LEGENDA			
CANTIERI		VIABILITÀ	
Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	CB - CANTIERE BASE		LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO
	CO - CANTIERE OPERATIVO		LINEA FERROVIARIA ESISTENTE
	CA - CANTIERE DI ARMAMENTO		AUTOSTRADA A14
	AT - AREA TECNICA		VIABILITÀ PRINCIPALE
	AS - AREA STOCCAGGIO		VIABILITÀ SECONDARIA
	AL - AREA DI LAVORO		VIABILITÀ DA ADEGUARE
	ASD - AREA DISMISSIONE		PISTA DI CANTIERE
	DT - DEPOSITO TEMPORANEO		LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO A CURA DI ALTRO APPALTO
	AREA DI CANTIERE A CURA DI ALTRO APPALTO		PROSPETTIVA FOTOGRAFICA
	ACCESSO AI CANTIERI		VARCO DI ACCESSO
			SENSI DI MARCIA

TABELLA DEI CANTIERI			
Codice	Descrizione	Comune	Superficie
CB01	CANTIERE BASE PER LAVORI DA INIZIO INTERVENTO A FINE VARIANTE	CAMPOMARINO (CB)	8.500 mq
CB02	CANTIERE BASE PER LAVORI DA FINE VARIANTE A FINE INTERVENTO	CHEUTI (FG)	20.000 mq
CO01	CANTIERE OPERATIVO	TERMOLI (CB)	11.000 mq
CO02	CANTIERE OPERATIVO	CAMPOMARINO (CB)	10.000 mq
CO03	CANTIERE OPERATIVO	CHEUTI (FG)	30.000 mq
AT02	AREA TECNICA	TERMOLI (CB)	3.000 mq
AT03	AREA TECNICA	TERMOLI (FG)	9.000 mq
AT04	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	15.000 mq
AT05	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	4.000 mq
AT06	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	6.700 mq
AT07	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	9.000 mq
AT08	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	4.000 mq
AT09	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	2.600 mq
AT10	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	5.600 mq
AT11	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	9.100 mq
AT12	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	900 mq
AS01	AREA DI STOCCAGGIO	TERMOLI (CB)	3.900 mq
AS02	AREA DI STOCCAGGIO	TERMOLI (FG)	8.400 mq
AS03	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	10.000 mq
AS04	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	15.000 mq
AS05	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	11.500 mq
AS06	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	11.500 mq
AS07	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	900 mq
AS08	AREA DI STOCCAGGIO	CHEUTI (FG)	5.000 mq
AS09	AREA DI STOCCAGGIO	CHEUTI (FG)	7.500 mq
AS10	AREA DI STOCCAGGIO	SERRACAPROLA (FG)	10.000 mq
CA01	CANTIERE DI ARMAMENTO ALL'INTERNO DELLA STAZIONE FS DI TERMOLI	TERMOLI (CB)	13.000 mq
CA02	CANTIERE PER DISMISSIONE L.S. ALL'INTERNO DELLA STAZIONE FS DI CAMPOMARINO	CAMPOMARINO (CB)	2.500 mq
CA03	CANTIERE DI ARMAMENTO DA ALESTRE IN ADEGENZA AL SEDIME IN PROGETTO	SERRACAPROLA (FG)	14.400 mq
ASD01	CANTIERE PER LA DISMISSIONE DELLA L.S. ADJACENTE ALLA FERMATA FS DI NUOVA ELITERNA (ATTUALMENTE FUORI USO)	CAMPOMARINO (CB)	5.000 mq
ASD02	CANTIERE PER DISMISSIONE L.S. ALL'INTERNO DELLA STAZIONE FS DI CHEUTI	CAMPOMARINO (CB)	3.300 mq
DT01	DEPOSITO TEMPORANEO	TERMOLI (CB)	21.500 mq
DT02	DEPOSITO TEMPORANEO	TERMOLI (FG)	14.500 mq
DT02bis	DEPOSITO TEMPORANEO	TERMOLI (CB)	12.300 mq
DT03bis	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	30.000 mq
DT04	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	36.000 mq
DT05	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	28.800 mq
DT06	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	16.000 mq
DT07	DEPOSITO TEMPORANEO	CHEUTI (FG)	20.000 mq
DT08	DEPOSITO TEMPORANEO	SERRACAPROLA (FG)	15.000 mq
			21.000 mq

CANTIERI DALLA PK 20+251,60 ALLA PK 22+026,50				
Codice	Descrizione	Superficie	Opera di competenza	Varco di accesso
AS09	AREA DI STOCCAGGIO	7.500,00 MQ	L'area di stoccaggio verrà impiegata per lo stoccaggio dei materiali da costruzione per la realizzazione dei viadotti V112, V113, V114 e per le trincee TR10 e TR11. Preliminarmente tale area darà supporto anche alle attività connesse alla demolizione dei manufatti esistenti riconducibili alle attività propedeutiche. Pertanto tale area sarà resa immediatamente operativa.	1  L'accesso all'area di stoccaggio AS09 avviene attraverso la pista di cantiere lungo linea di progetto
OPERE DA REALIZZARE LUNGO LINEA				
Codice	Descrizione	km inizio - fine		
R114	Rilevato in affiancamento	dal Km 20+251,60		al Km 20+580,60
V111	Viadotto	dal Km 20+580,60		al Km 20+605,60
R115	Rilevato in affiancamento	dal Km 20+605,60		al Km 20+700,00
TR10	Trincea di affiancamento	dal Km 20+700,00		al Km 21+050,00
R116	Rilevato in affiancamento	dal Km 21+050,00		al Km 21+106,50
V112	Viadotto	dal Km 21+106,50		al Km 21+181,50
R117	Rilevato in affiancamento	dal Km 21+181,50		al Km 21+241,00
TR11	Trincea di affiancamento	dal Km 21+241,00		al Km 21+500,00
R118	Rilevato in affiancamento	dal Km 21+500,00		al Km 21+573,50
V113	Viadotto	dal Km 21+573,50		al Km 21+598,50
R119	Rilevato in affiancamento	dal Km 21+598,50		al Km 21+675,00
TR12	Trincea di affiancamento	dal Km 21+675,00		al Km 21+850,00
R120	Rilevato in affiancamento	dal Km 21+850,00		al Km 21+901,50
V114	Viadotto	dal Km 21+901,50		al Km 22+026,50

COMMITTENTE:

R.F.I. - RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:

AGOSTINO
COSTRUZIONI
MANDATARIA

ATLANTE
MANDANTI

APPALTATORE:

ATLANTE
MANDATARIA

pro
MANDANTI

PROGETTAZIONE:

pro
MANDATARIA

pro
MANDANTI

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Planimetria di dettaglio viabilità e aree di cantiere tav. 15 di 17

DAL KM 20+251,60 AL KM 22+026,50

APPALTATORE

PROGETTAZIONE

SCALA:

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO

1 : 2 000

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC.

OPERADISCIPLINA

PROGR.

REV.

L10B

02

E

ZZ

P6

CA0000

015

A

Revis.

Descrizione

Stato

Data

Verificato

Data

Approvato

Data

Autorizzato

Data

A

Prova

Stato

20/10/22

Stato

20/10/22

Approvato

20/10/22

Autorizzato

20/10/22

File: L10B02EZZP6CA000001-17A.DWG

n. Elab.:
