

D 1 08

DEPOSITO TEMPORANEO CON AREA PARI A 21.000,00 mq

PLANIMETRIA DEPOSITO TEMPORANEO
Scala 1:200

UTILIZZO DELL'AREA

Area per depositi terra per la gestione dei materiali prodotti dagli scavi
nella eventuale indisponibilità dei siti di conferimento definitivo. L'area
fungerà da polmone di accumulo per tutte le opere sulla linea, le

interferenze e per le nuove viabilità fino alla fine dell'intervento.

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE
FASE 1: rimozione della vegetazione ;
FASE 2: scotico, livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato 28.800 mq;
FASE 3: installazione della recipzione Tipo B 726 ml:

FASE 3: installazione della recinzione Tipo B 726 ml;
FASE 4: approntamento del cantiere e realizzazione degli impianti di cantiere.

	ALLESTIMENTI DI CANTIERE					
quantità allestimento	tipo di allestimento					
1	Prefabbricato modulare ad uso uffici; dim. 6,08x2.4m					
6	Bagni chimici con lavabo					
1	Pesa					
5	Stalli auto Stalli mezzi d'opera					
7						

APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO/IDRICO


La fornitura di energia elettrica del cantiere avviene mediante l'utilizzo di un gruppo elettrogeno da 20 kW. I lampioni per l'illuminazione delle aree di cantiere saranno alimentati da pannelli fotovoltaici.


L'alimentazione idrica dei baraccamenti avviene mediante una vasca di riserva idrica di 2.000 lt


IMPIANTI DI CANTIERE
Impianto idrico sanitario
impianto di smaltimento acque
Impianto elettrico
Impianto Illuminazione con pannelli fotovoltaici

Impianto di terra

			LEGENDA	<u> </u>	
MODULI PREFABBRICATI		AREE ED ELEMENTI INTERNI AL CANTIERE		VIABILITÀ	
Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
01	Prefabbricato punto di consegna MT	12	Tendostruttura		Percorsi viabilità mis
02	Prefabbricato Cabina di trasformazione MT/BT	13	Area deposito carburanti	>>	Percorsi viabilità pesa
03	Prefabbricato Guardiola	14	Impianto di betonaggio	→	Percorsi viabilità legge
04)	Magazzino	15	Impianto lavaruote		
05	Prefabbricato Spogliatoi e wc	16	Vasca di recupero acque		
06	Prefabbricato officina	17	Vasca di stoccaggio acque		
07	Dormitori	18	Impianto vagliatura/frantumazione mobile		
08)	Mensa	19	Vasca di sedimentazione		
09	Uffici	20	Assemblaggio armature e casseri		
10	Blocco per sistema di recupero delle acque durante lo scavo in galleria	21	Isola ecologica		
11)	Infermeria		Zona stoccaggio terre		
			Recinzione Tipo A		
			Recinzione Tipo B		
			Recinzione Tipo C		
			Dannalla siasa da vasinziana		

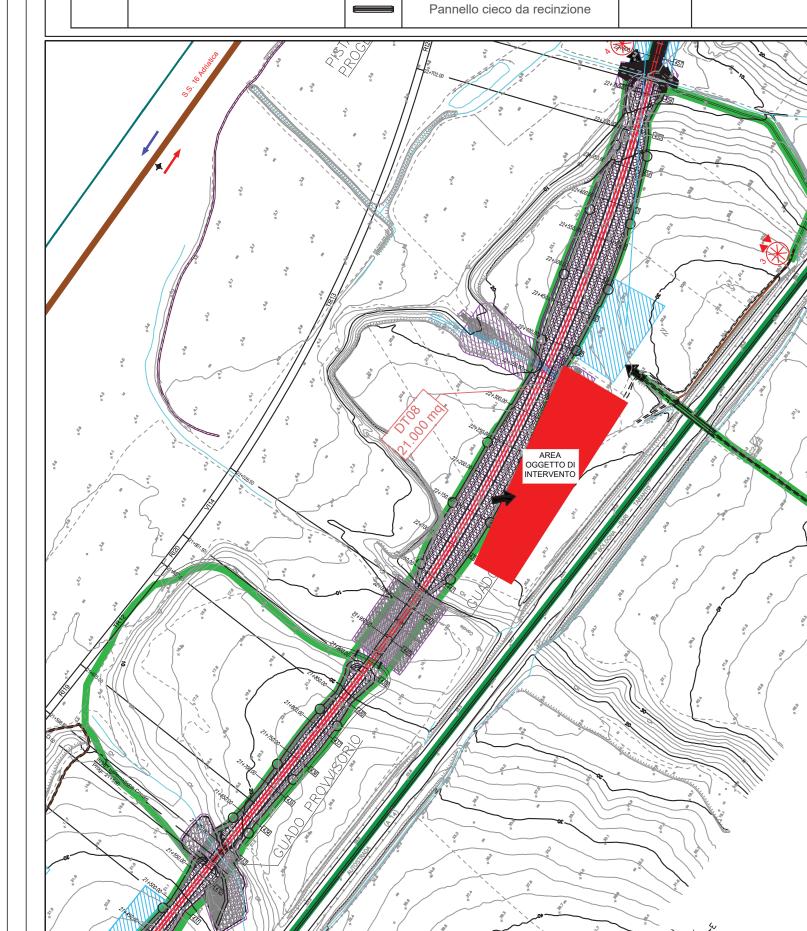

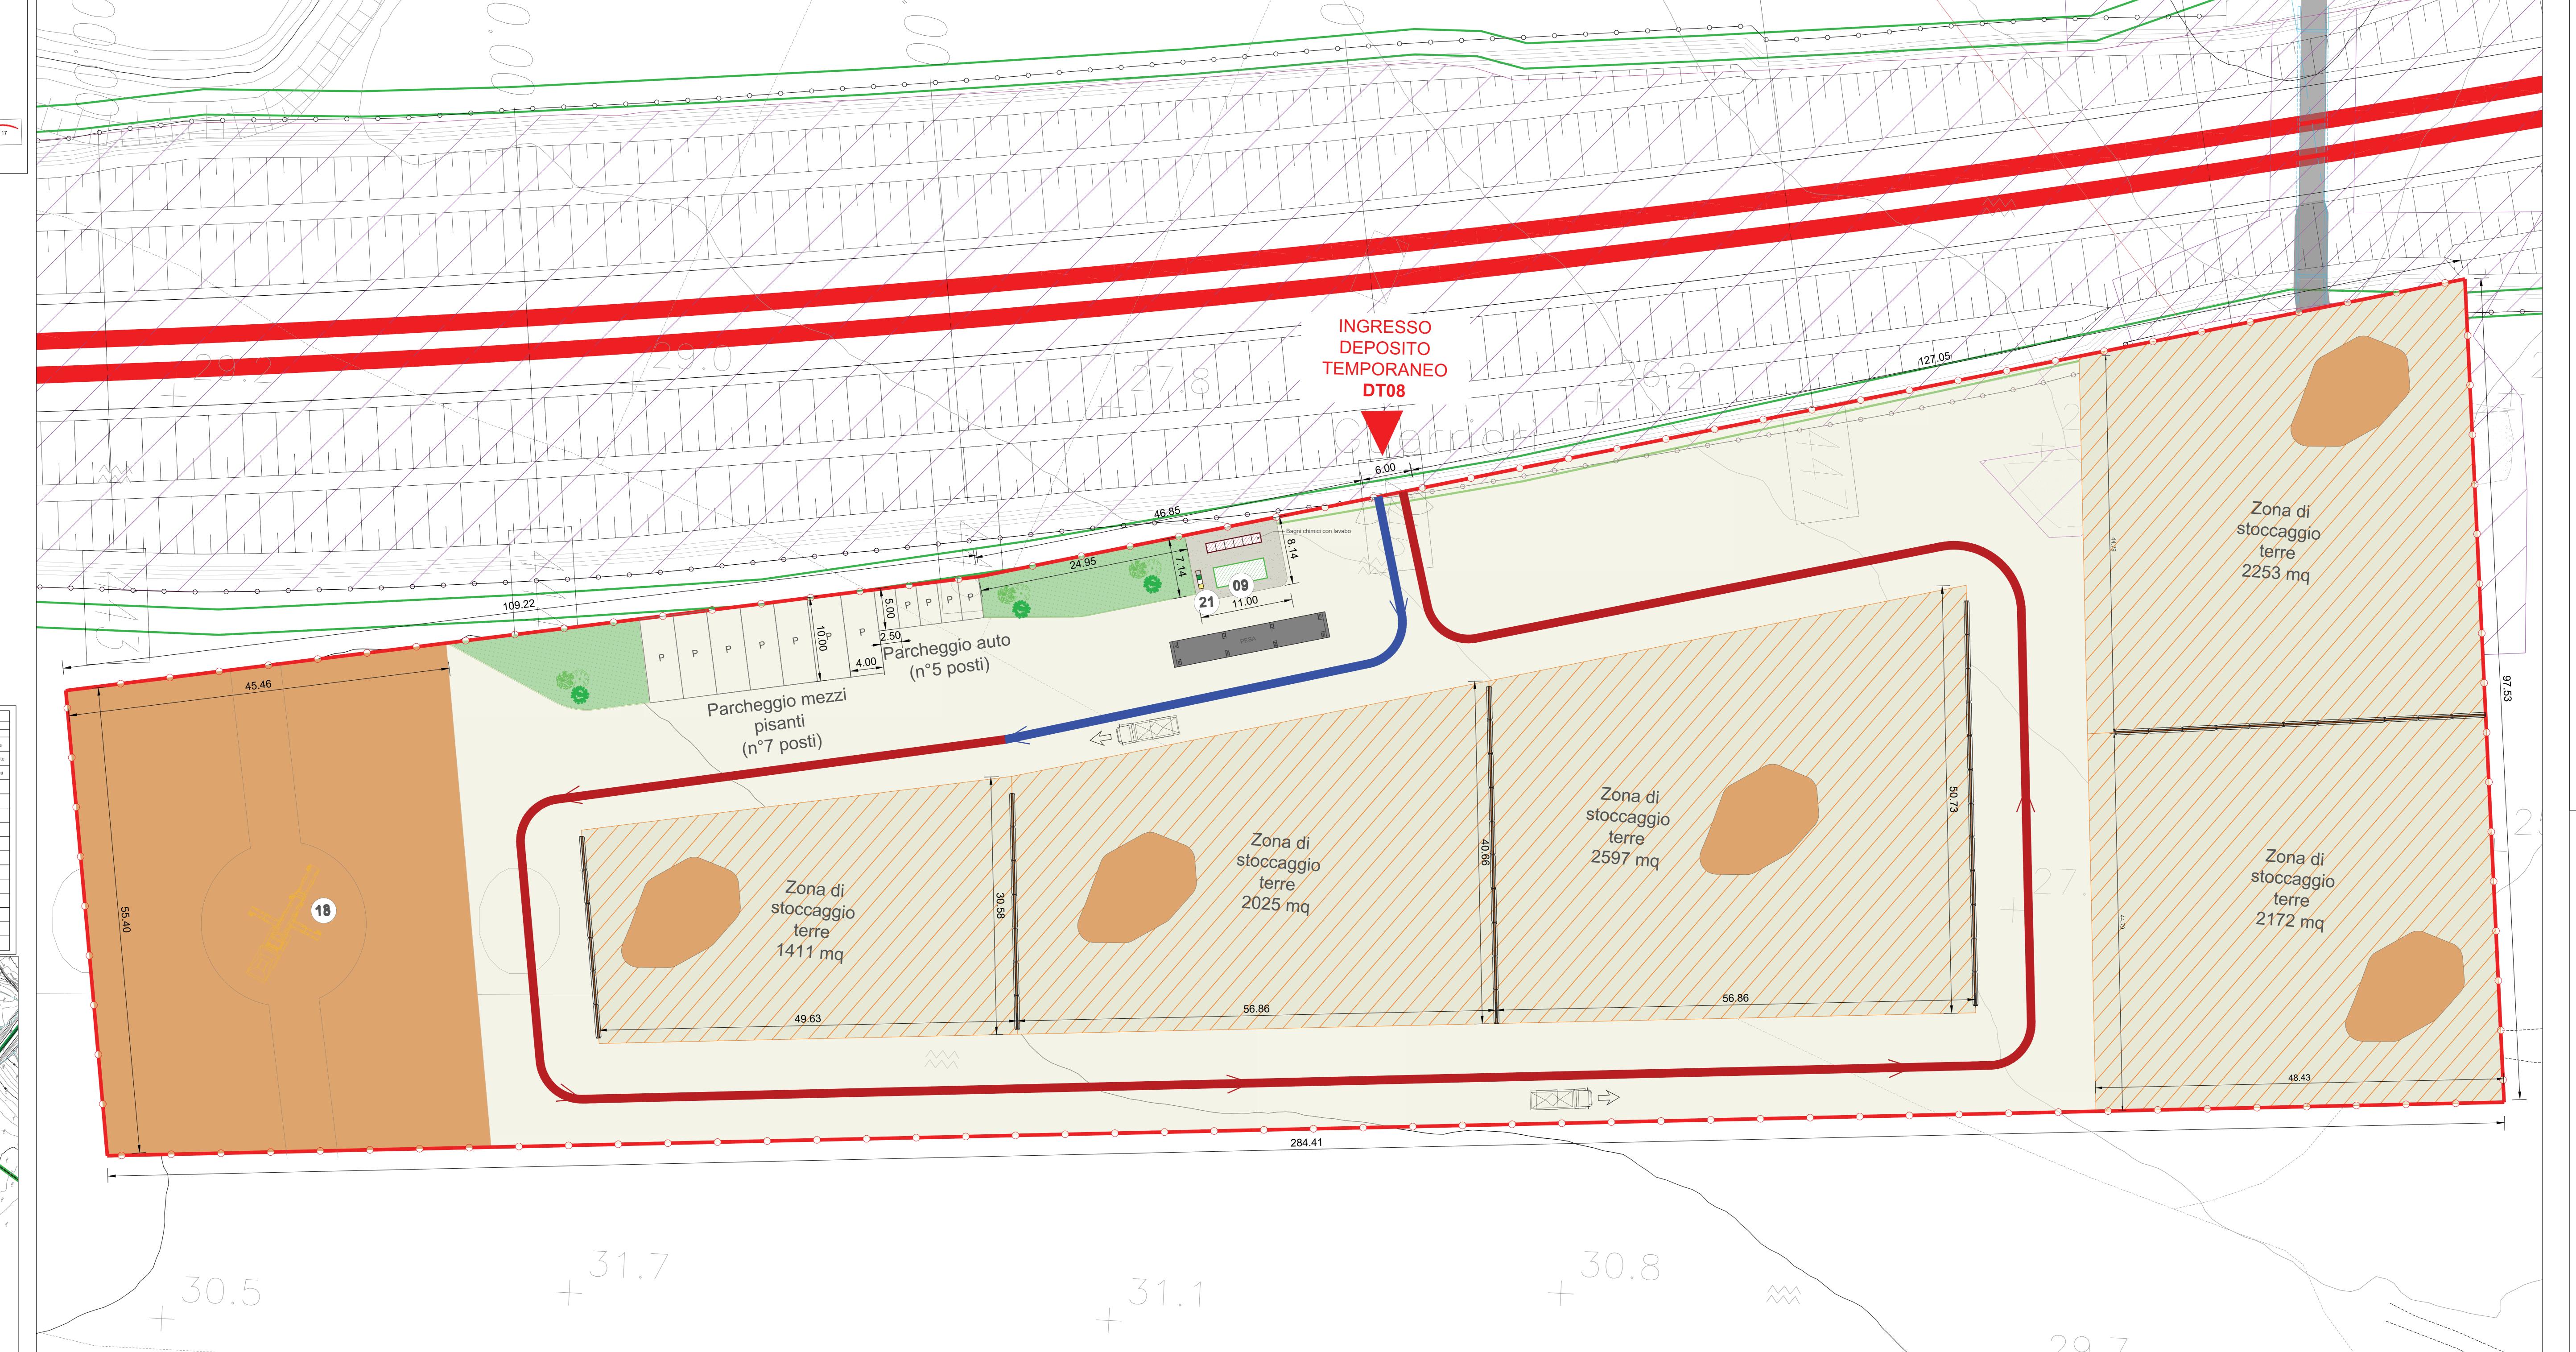

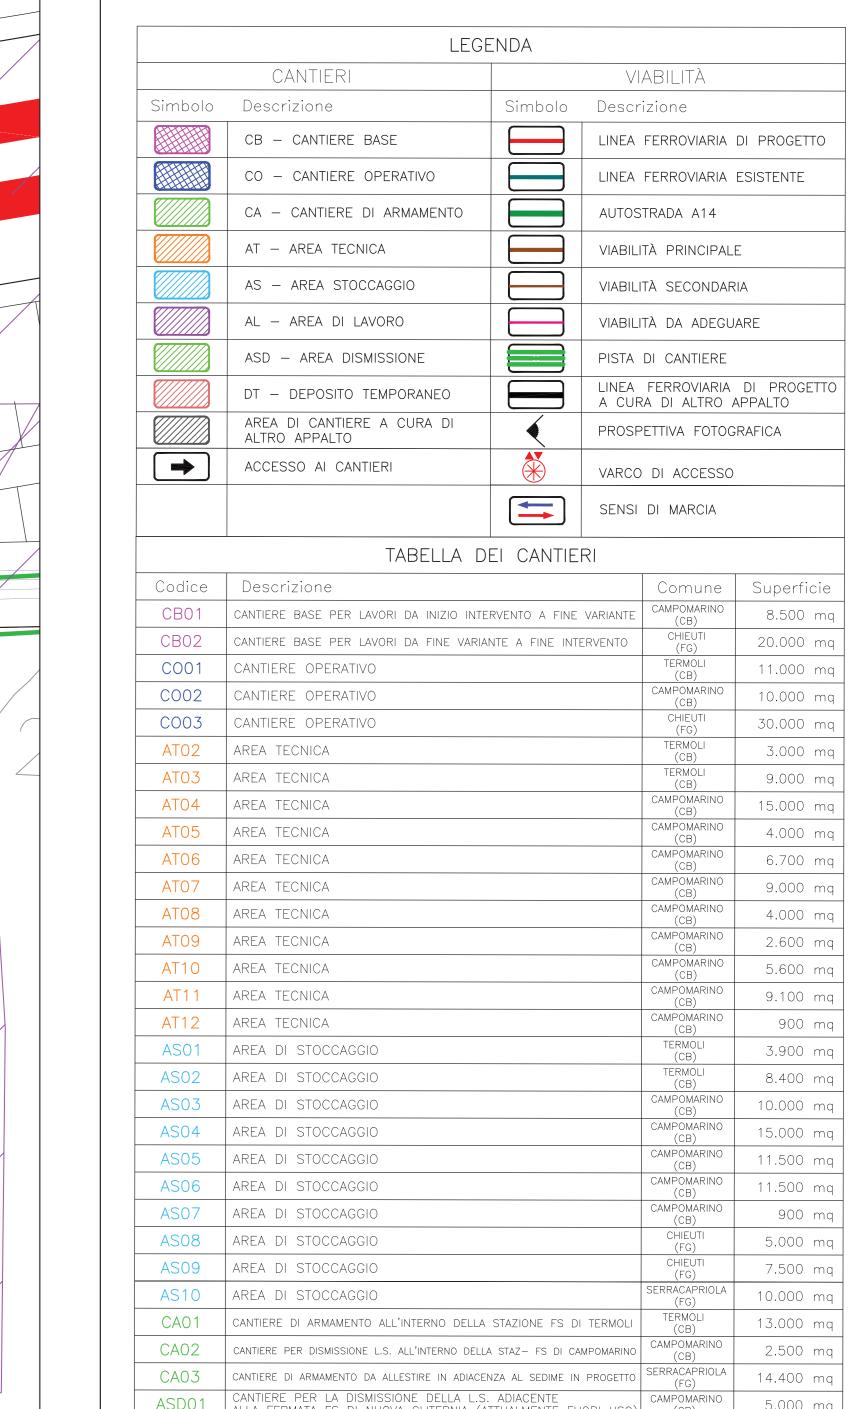

002 | cantiere per dismissione l.s. all'interno della staz- fs di chieuti | ca

DEPOSITO TEMPORANEO

2 DEPOSITO TEMPORANEO

02bis | DEPOSITO TEPORANEO

3bis | DEPOSITO TEMPORANEO

DEPOSITO TEMPORANEO

4 DEPOSITO TEMPORANEO

06 DEPOSITO TEMPORANEO

DT08 DEPOSITO TEMPORANEO

DEPOSITO TEMPORANEO

DEPOSITO TEMPORANEO



File: LI0B02E00P9CA0000041A.DWG
