

## **Attuazione prescrizione Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia prot. n. 0011300 del 24.7.2015**

La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia con la nota prot. n. 0011300 del 24.7.2015 ha prescritto di procedere all'asportazione conservativa (smontaggio), trasporto, restauro e rimontaggio degli elementi decorativi su un portale in calcestruzzo avente funzione di struttura di supporto realizzata in adiacenza al prospetto sud del nuovo sottopasso di via Corsica. Il progetto in attuazione a detta prescrizione prevedeva:

### a) Asportazione conservativa (smontaggio) e trasporto

- taglio longitudinale con macchina dotata di disco diamantato, per una profondità di circa un metro dalla fine del ponte ad arco,
- fornitura e montaggio di un'apposita centina al di sotto dell'arco da tagliare,
- incastellatura metallica provvisoria delle balaustre per smontaggio, trasporto e rimontaggio del parapetto in cls presente al di sopra dell'arco,
- taglio alla base e rimozione del parapetto in c.a.,
- carico e trasporto in apposita officina / laboratorio / deposito del parapetto stabilizzato a mezzo incastellatura metallica,
- rimozione di tutti i carichi permanenti portati posti al di sopra del ponte,
- operazioni di taglio secondo una sagoma prestabilita,
- smontaggio e trasporto a magazzino della centina installata al di sotto dell'arco da tagliare,
- tagli orizzontali e verticali per asportare i due piedritti,
- carico e trasporto in apposita officina/laboratorio/deposito di tutti gli elementi decorativi del sottopasso di via Corsica, compreso piedritti e parapetto,

### b) restauro e rimontaggio:

- ulteriore partizione degli elementi, inghisaggio dei ferri per consentire l'aggancio alla struttura in c.a. da gettare in opera e restaurati in conformità alla normativa vigente,
- rimontaggio degli elementi decorativi restaurati dei due piedritti,
- messa in opera della centina, per posizionare gli elementi estetici sovrastanti i piedritti, messa in opera di tutti gli elementi decorativi del sottopasso di via Corsica, sovrastanti i piedritti e posizionamento dell'armatura ordinaria, cassetatura e successivo getto del cls a sostegno dell'intero prospetto sud,
- smontaggio della centina.

Le successive interlocuzioni con il Comune di Brescia hanno evidenziato l'impossibilità di mantenere la chiusura di Via Corsica anche per le tempistiche necessarie alla realizzazione del nuovo portale di sostegno degli elementi architettonici componenti il prospetto sud del sottopasso di via Corsica e al rimontaggio di questi ultimi, si è pertanto dato corso alla sottoscrizione di un accordo tra lo stesso Comune, RFI e la Soprintendenza con il quale si è convenuto di dare attuazione alle attività di smontaggio e trasporto (presso un area di deposito messa a disposizione dalla stessa RFI a Milano), rimandando invece le successive attività di restauro e rimontaggio. In conseguenza dell'Accordo tra il Comune, RFI e la Soprintendenza che ha visto la traslazione delle attività di restauro e rimontaggio ad una data successiva alla data di completamento prevista dei lavori oggetto dell'Appalto con Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A., RFI ha ordinato all'Appaltatore di procedere con i lavori di solo smontaggio e trasporto (presso il deposito di RFI) in cui gli stessi sono mantenuti in custodia in attesa del successivo rimontaggio, procedendo inoltre all'esecuzione delle sole fondazioni su micropali del nuovo futuro portale di sostegno degli elementi architettonici

componenti il prospetto sud del sottopasso di via Corsica. Le attività di smontaggio, trasporto e ricollocazione del portale asportato presso il deposito RFI hanno avuto corso - si allega la relazione fotografica delle attività. In data 12.5.2021 RFI ha provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto per le attività di rimontaggio del Fregio alla società PROG.RES s.r.l. Per le attività di Direzione Lavori e Sicurezza Cantieri è stata incaricata Italferr S.p.A. L'esecuzione dei Lavori sarà avviata, previo benestare della Soprintendenza e del Comune di Brescia, nel periodo di Giugno-Agosto 2022 in occasione della sospensione delle attività scolastiche, per recare il minor pregiudizio possibile al traffico sulla viabilità di Via Corsica.



**Brescia**  
**Via Corsica**

aprile 2016

**Linea AV/AC MI-VR**  
**Tratta Treviglio Brescia**  
**Ingresso urbano in Brescia**



**Subappaltatore**  
**Impresa esecutrice:**  
DIEGO MALVESTIO & C. s.n.c.  
Scavi e restauri archeologici  
Restauri architettonici  
Via C. Borsoi n. 17  
30023 CONCORDIA S.  
(Venezia)

**Taglio e smontaggio degli elementi  
decorativi del prospetto sud in fregio  
al sottopasso di via Corsica (WBS  
VI16)**  
**Documentazione fotografica dello  
stoccaggio degli elementi e dei conci  
dopo lo smontaggio**


**Committente:**

**RFI**


**Appaltatore:**

**Società Italiana delle Condotte  
d'Acqua S.P.A.**

**SCHEMA DEL TAGLIO E SMONTAGGIO DEI CONCI**

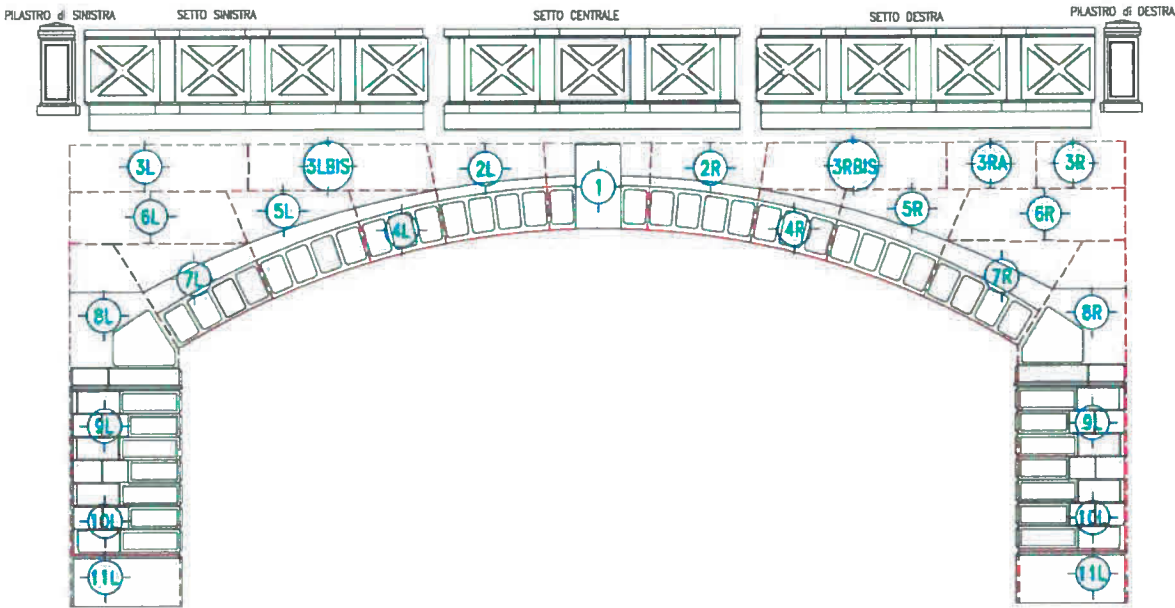

**Elementi della balaustra: 5 pallet**

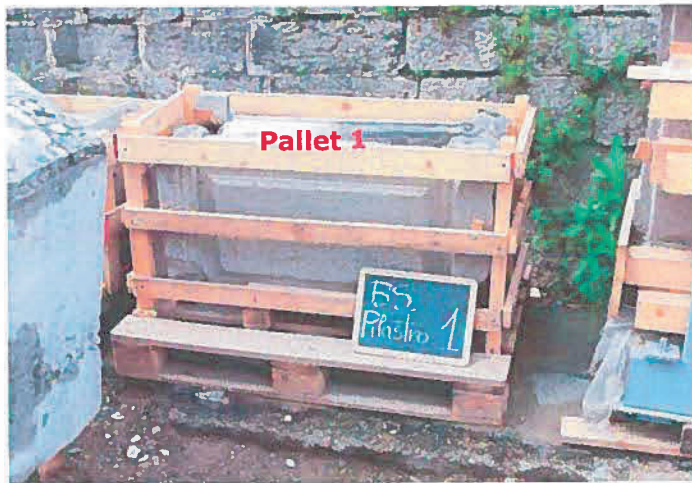

Pallet 1: pilastro sinistro



Pallet 2: pilastro destro



Pallet 3: elemento con croce di S. Andrea





Pallet 4: blocco di toro



Pallet 5: blocco di toro

**Balaustra: 3 setti**



Setto sinistro



Setto centrale



Setto destro



24 conci numerati



1



2L



3L



3LBIS







4L



5L



6L





7L



8L





9L



10L



11L





2R



3RBIS



3R



3RA





4R



5R



6R





7R



8R





9R



10R





11R





MILANO - via Breda n. 28 - CAPANNONE RFI  
Posizionamento degli elementi architettonici lapideo/cementizi del prospetto decorativo sud del sottopasso di via Corsica (BS)

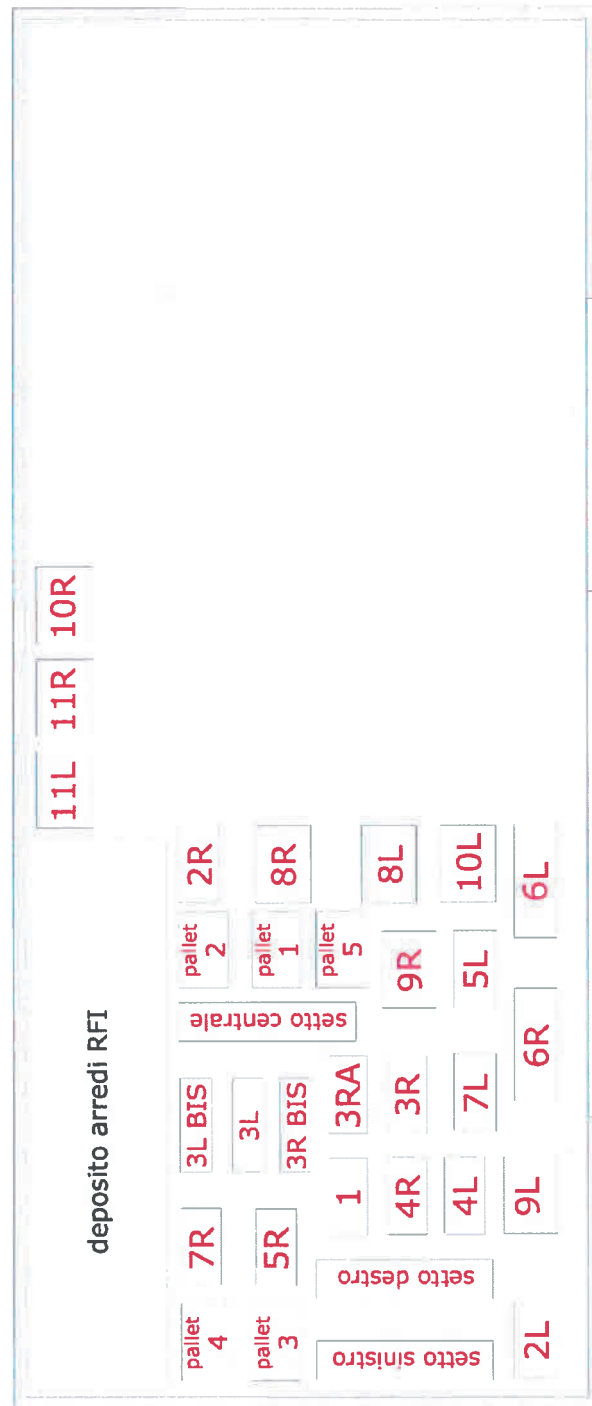



---

**Collocazione degli elementi nel capannone RFI, via Breda 28 Milano**



