


Totale		B2	Macrolotto 2
SCAVI (mc)	Palme tralce di scavo		1,372,091
POTENZIALITÀ DI RECUPERO DALLI SCAVI (mc)	(1) Inerti per rilevati e riempimenti (A2-B/A2-7) e (A1/A2/A2-4/A2-5)		407,115
	(2) Terreni di pregio per produzione scavi		114,721
	(3) Vegetale		190,065
	(4) Scavo di pali e diaframmi		46,027
	(5) Materiale rifiuto		0
Inerti da riutilizzo e/o riempimento	(6) Terreni (A4-A5-A6-A7)		199,031
	(7) Rifiuti eterogenei		375,134
	(8) Rifiuti omogenei		0
FABBISOGNI (mc)	Vegetale		76,294
	Completamento bituminoso		55,819
	Misto granulare stabilizzato		31,911
	Misto cemento		39,294
Completamento cementizio			121,248
BLANCO (mc)	Inerti da riutilizzo e/o riempimento (A1-D)	Riutilizzo interno	453,140
		Riutilizzo (+/-)	-302,296
		ad altro macerato	0
		da altro macerato	302,296
		esterno cartaceo	0
	Materiale non riutilizzabile (E-F-G)	Esterno cartaceo non a rifiuto	574,165
		Esterno cartaceo a rifiuto	0
		Riutilizzo interno	114,721
		Riutilizzo (+/-)	-133,751
		ad altro macerato	0
	Inerti pregiati (I)	ad altro macerato	0
		da altro macerato	0
		Fornitura da Impianti Esterni	133,751
		Riutilizzo interno	76,294
		Riutilizzo (+/-)	113,771
Vegetale (C)	ad altro macerato	0	
	da altro macerato	0	
	esterno cartaceo	113,771	
	Deposito intermedio	DT_B2_03	
	DT_B2_04		
Scavi depositi intermedii (mc)	Vegetale		19,610
	Volume di scavo		19,610
	Riutilizzo interno		19,610

Si tratta di forniture di calcestruzzo, conglomerati bituminosi, misto cementato a misto stabilizzato (qui indicate come somma di inerti pregiati) che provengono direttamente da impianti esteri che forniscono materiale già lavorato e quindi non costituiscono ingresso in cantiere di inerti.


Nota: (1) Si evidenzia che in funzione dell'avanzamento dei lavori, i dati riportati in tabella potrebbero aggiornarsi durante l'esecuzione del P.U.T., pertanto la distribuzione dei riutilzi interni nello stesso Macrolotto di produzione o in diverso Macrolotto è da rivedersi salato sull'attuale fase progettuale. La tracciabilità delle TFS verrà garantita mediante la documentazione prevista dal Sistema di Gestione Integrato come previsto da normativa vigente. (2) Le quantità inerti allo scavo dei Depositi intermedii non sono presenti in computo metrico trattandosi di terre non soggette di lavori inerti e Opere.

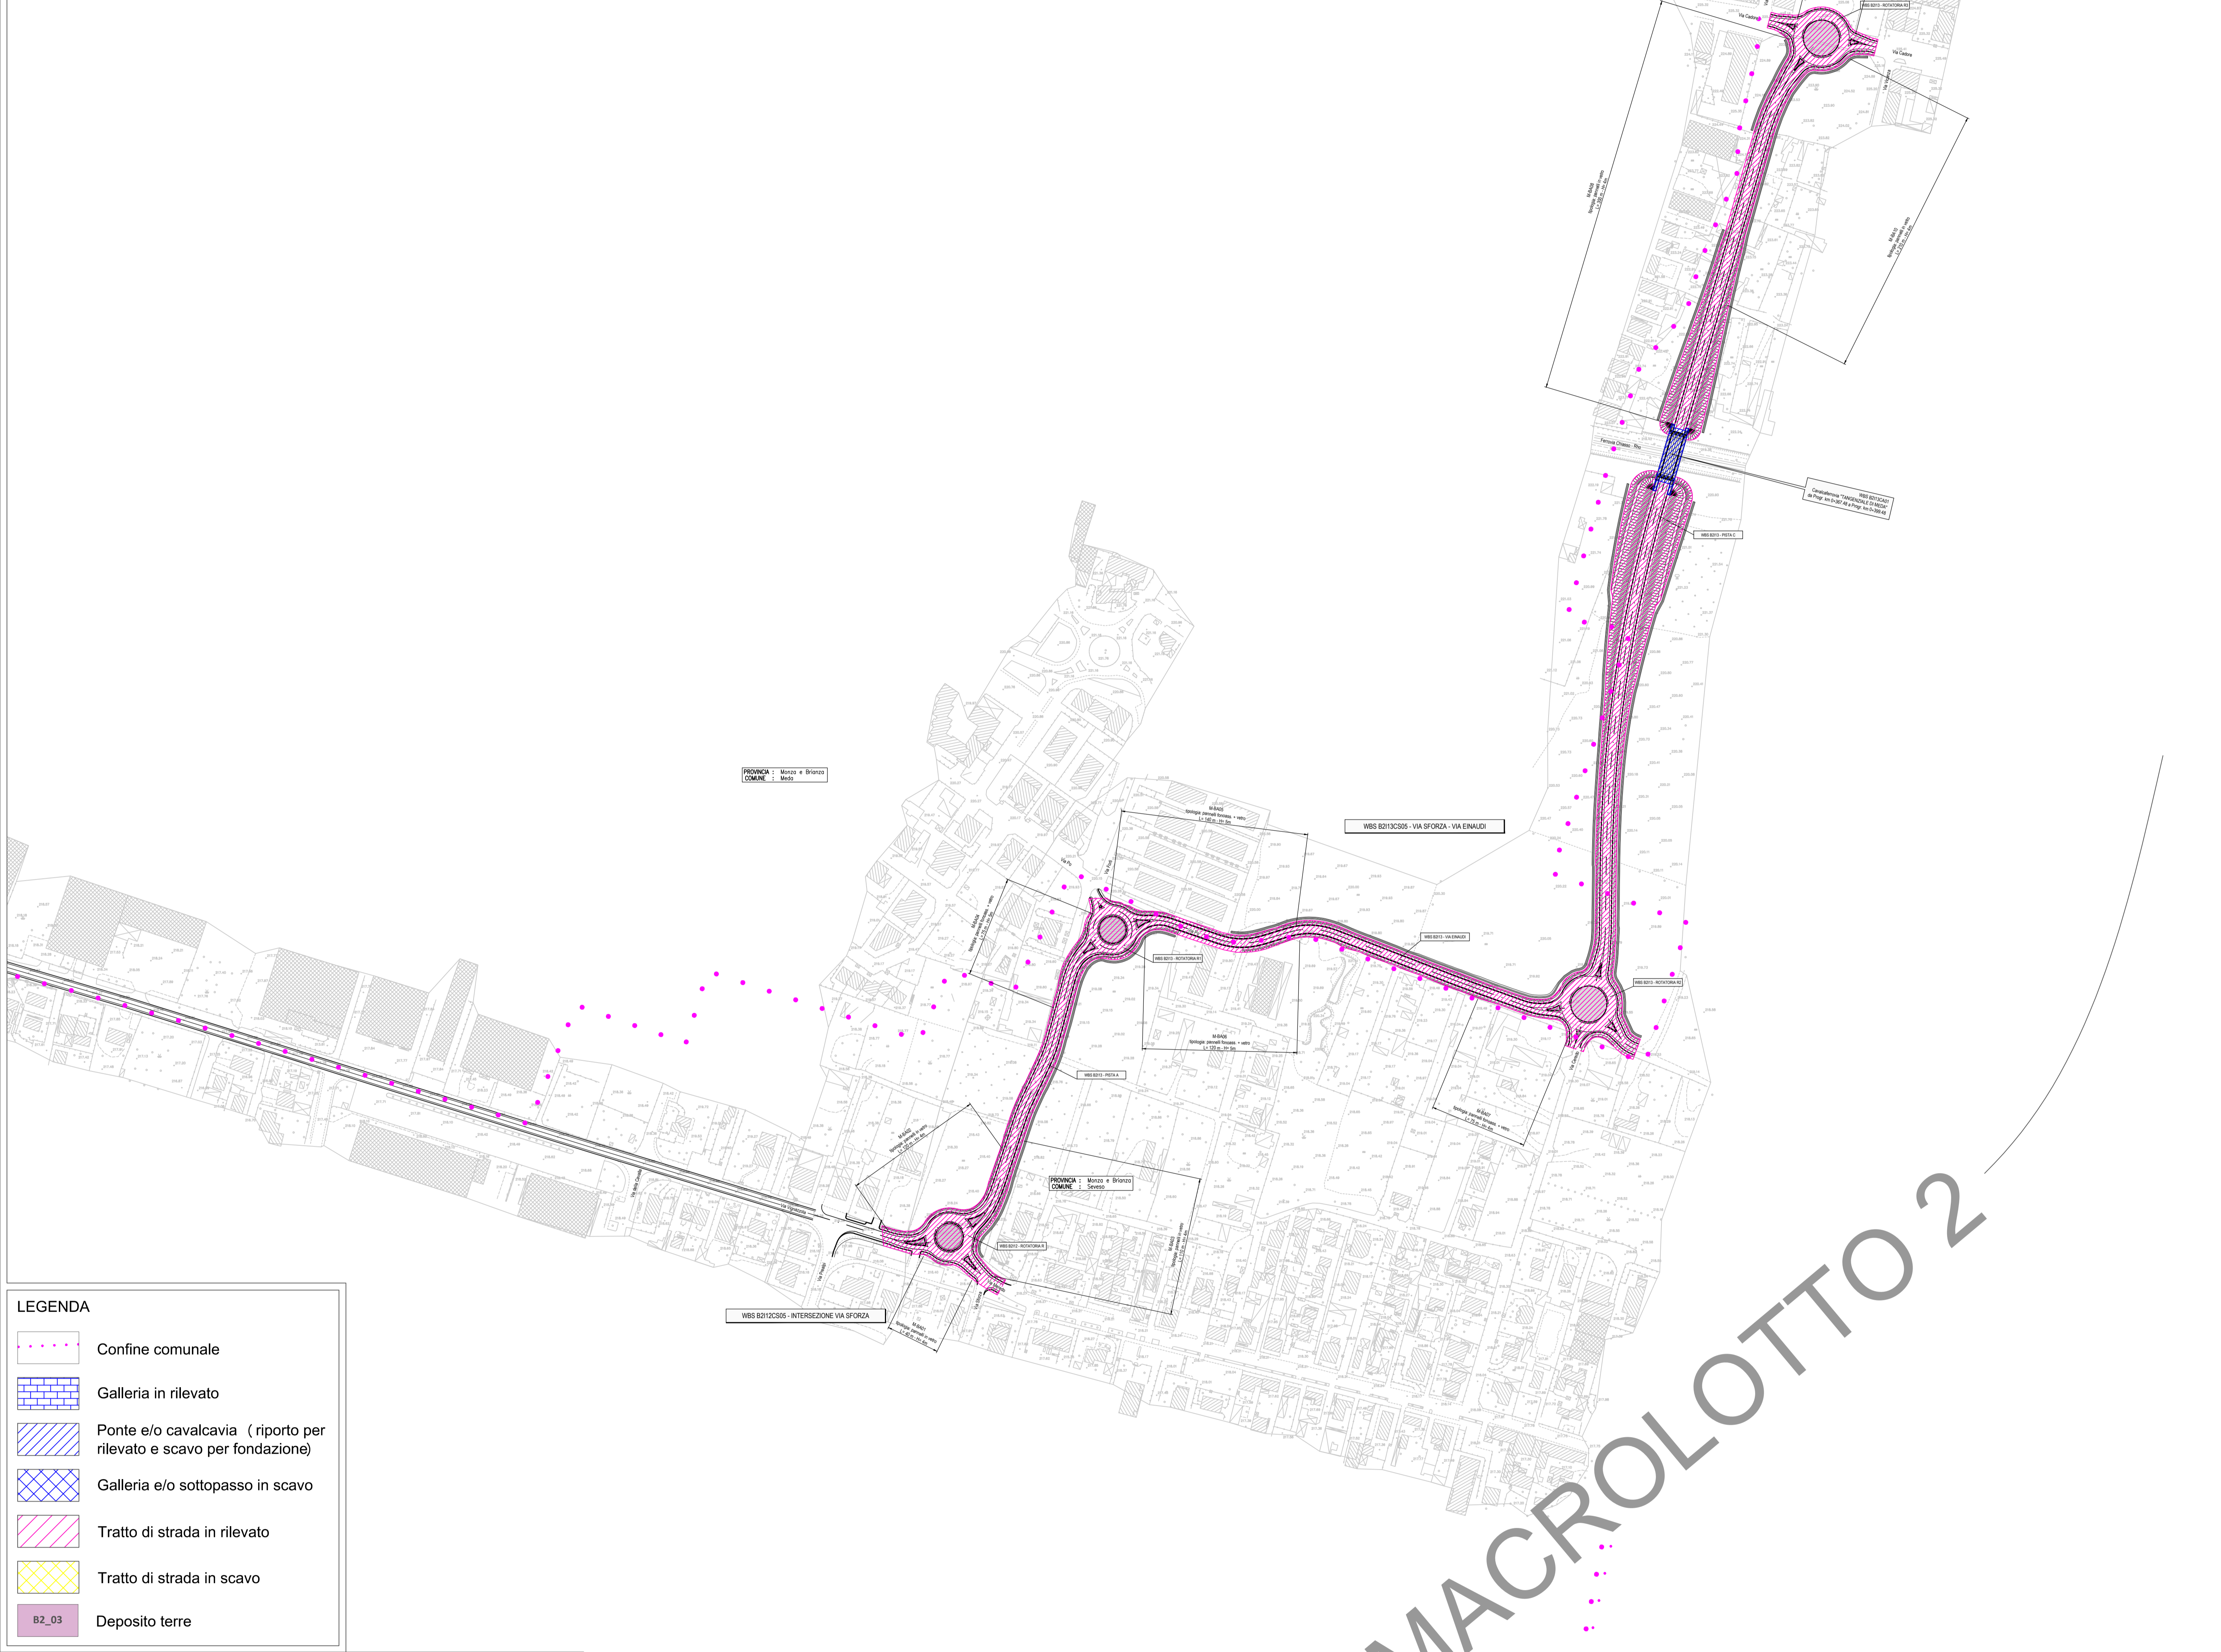

MACROLOTTO 2

LEGENDA

- Confine comunale
- Galleria in rilevato
- Ponte e/o cavalcavia (riporto per rilevato e scavo per fondazione)
- Galleria e/o sottopasso in scavo
- Tratto di strada in rilevato
- Tratto di strada in scavo
- Deposito terre

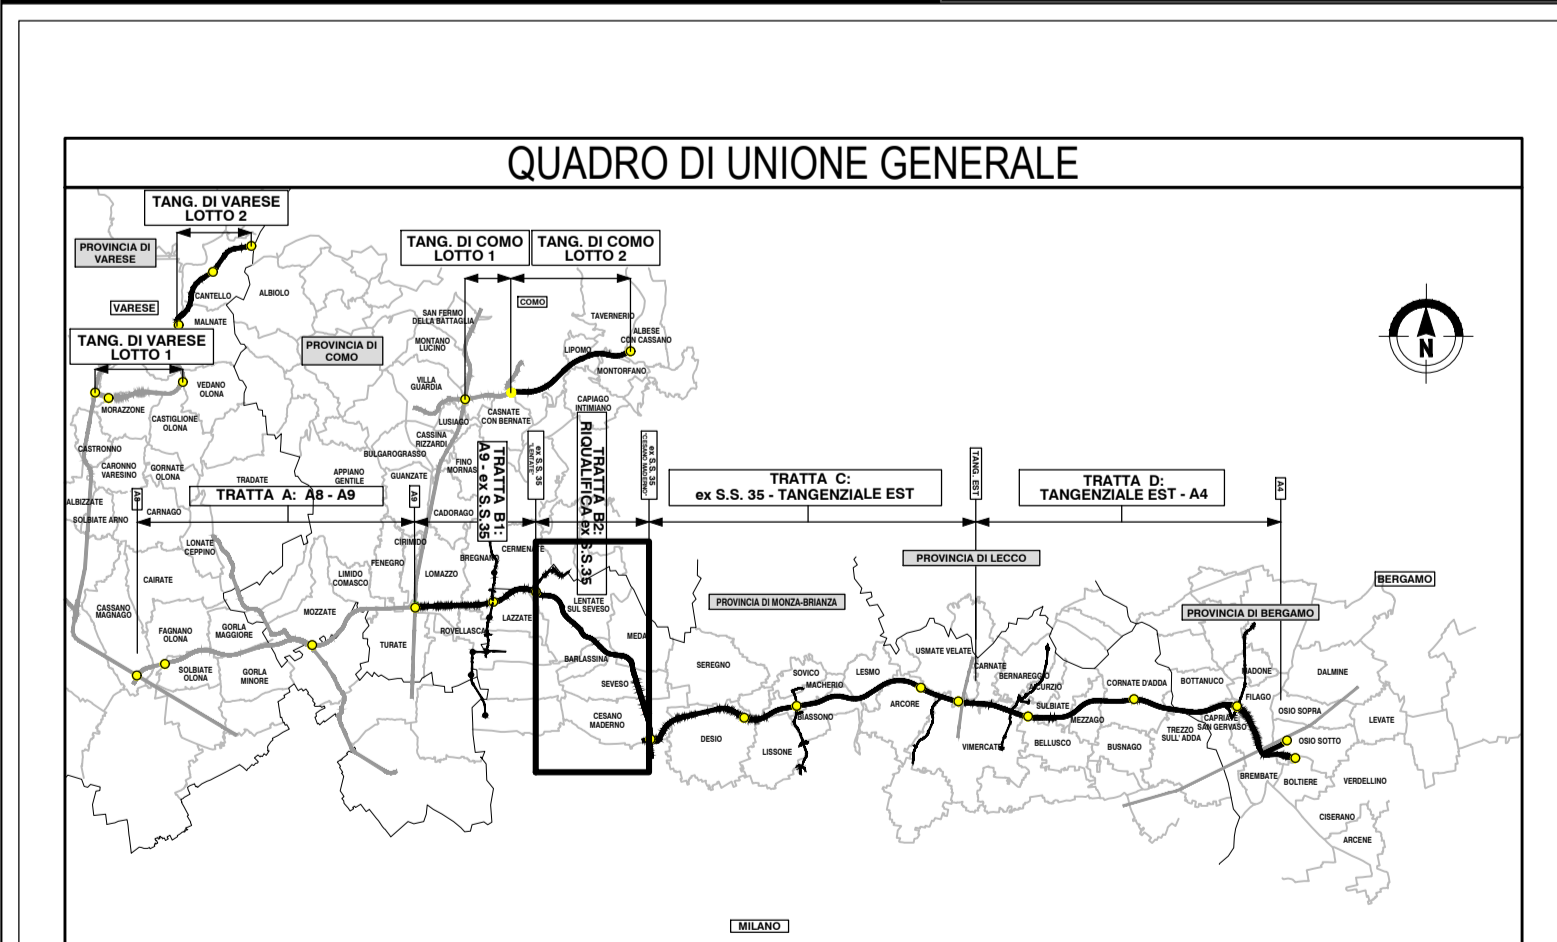

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE-COMO-VARESE-VALICCO DEL GAGGIOLIO E OPERE AD ESSO CONNESSE

PROGETTO ESECUTIVO TRATTA B2

TERRE E ROCCE DI SCAVO, CAVE E DISCARICHE
PIANO DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO
PLANIMETRIE DELLE AREE DI PRODUZIONE - STATO DI PROGETTO - TAV. 8

IDENTIFICAZIONE ELABORATO		CONTRAENTE GENERALE	
PROGETTO	TRATTA B2	PEDELOBARBADA NUOVA S.p.A.	
DATA	20 Agosto 2024	REVISIONE	ELABORAZIONE PROGETTUALE
PROGETTISTA	PROGETTO	RESPONSABILE INTERAZIONE PROIEZIONE SPECIALISTICA	PROGETTO
CONCORSIONARIO	CONCORSIONARIO	PROGETTISTA	PROGETTO

