

AREA DI CANTIERE 2B

FUNZIONE: AREA LOGISTICA E OPERATIVA
N° STIMATO DI ADDETTI: 30

LEGENDA



- Tubazione in polietilene da inteso a doppio parete per collegamento quadri (Quota di interramento almeno 0,5m)
- Cavo di terra solo di 20mm² (Quota di interramento almeno 0,5m)
- Tubazioni in polietilene da inteso a doppia parete Ø200mm (Quota di interramento almeno 1m)
- Tubazioni in polietilene da inteso a doppia parete diametro e numero indicati in planimetria (Quota di interramento almeno 0,5m)
- Tubazione in polietilene da inteso a doppio parete 112mm per impianti speciali (Quota di interramento almeno 0,5m)
- Pozzetto in CLS c/coperchio coromile 400x400mm
- Pozzetto in CLS c/coperchio coromile 600x600mm
- Pozzetto in CLS c/coperchio coromile 800x800mm
- Pozzetto in CLS c/coperchio coromile 1200x1200mm
- Torri Faro altezza 20m, 11 con n°4 proiettori da 2000W a led di metallo di finitura del committente recuperato da altro cantiere
- Torri Faro altezza 20m, 11 con n°3 proiettori da 2000W a led di metallo di finitura del committente recuperato da altro cantiere
- Torri Faro altezza 20m, 11 con n°2 proiettori da 2000W a led di metallo di finitura del committente recuperato da altro cantiere
- Pozzetto in cemento c/coperchio 400x400 mm con spondone in acciaio nudo n°18mm h= 3m
- Quadro di alimentazione macchine (Solo alimentazione)
- Quadro elettrico

NOTA
NOTA: GLI INGRESSI AGLI EDIFICI E AI QUADRI DI BORDO MACCHINA SONO SOLO INDICATIVI E DOVRANNO ESSERE REALIZZATI TENENDO CONTO DEGLI EFFETTIVI LAYOUT INTERNI DEGLI EDIFICI E DELLE MACCHINE ALIMENTATE.

NOTA 2
L'IMPIANTO DI DISPERSIONE DEL CANTIERE 2B NON VERRA' REALIZZATO IN QUANTO NON NECESSARIO ESSENDO CONFIGURATO COME SISTEMA ELETTRICO TN-S ALIMENTATO DA CABINA DI TRASFORMAZIONE DEL CANTIERE ADIACENTE PV.

NOTA

REVISIONE GENERALE:
Aggiornato base planimetrica e inserito nota.

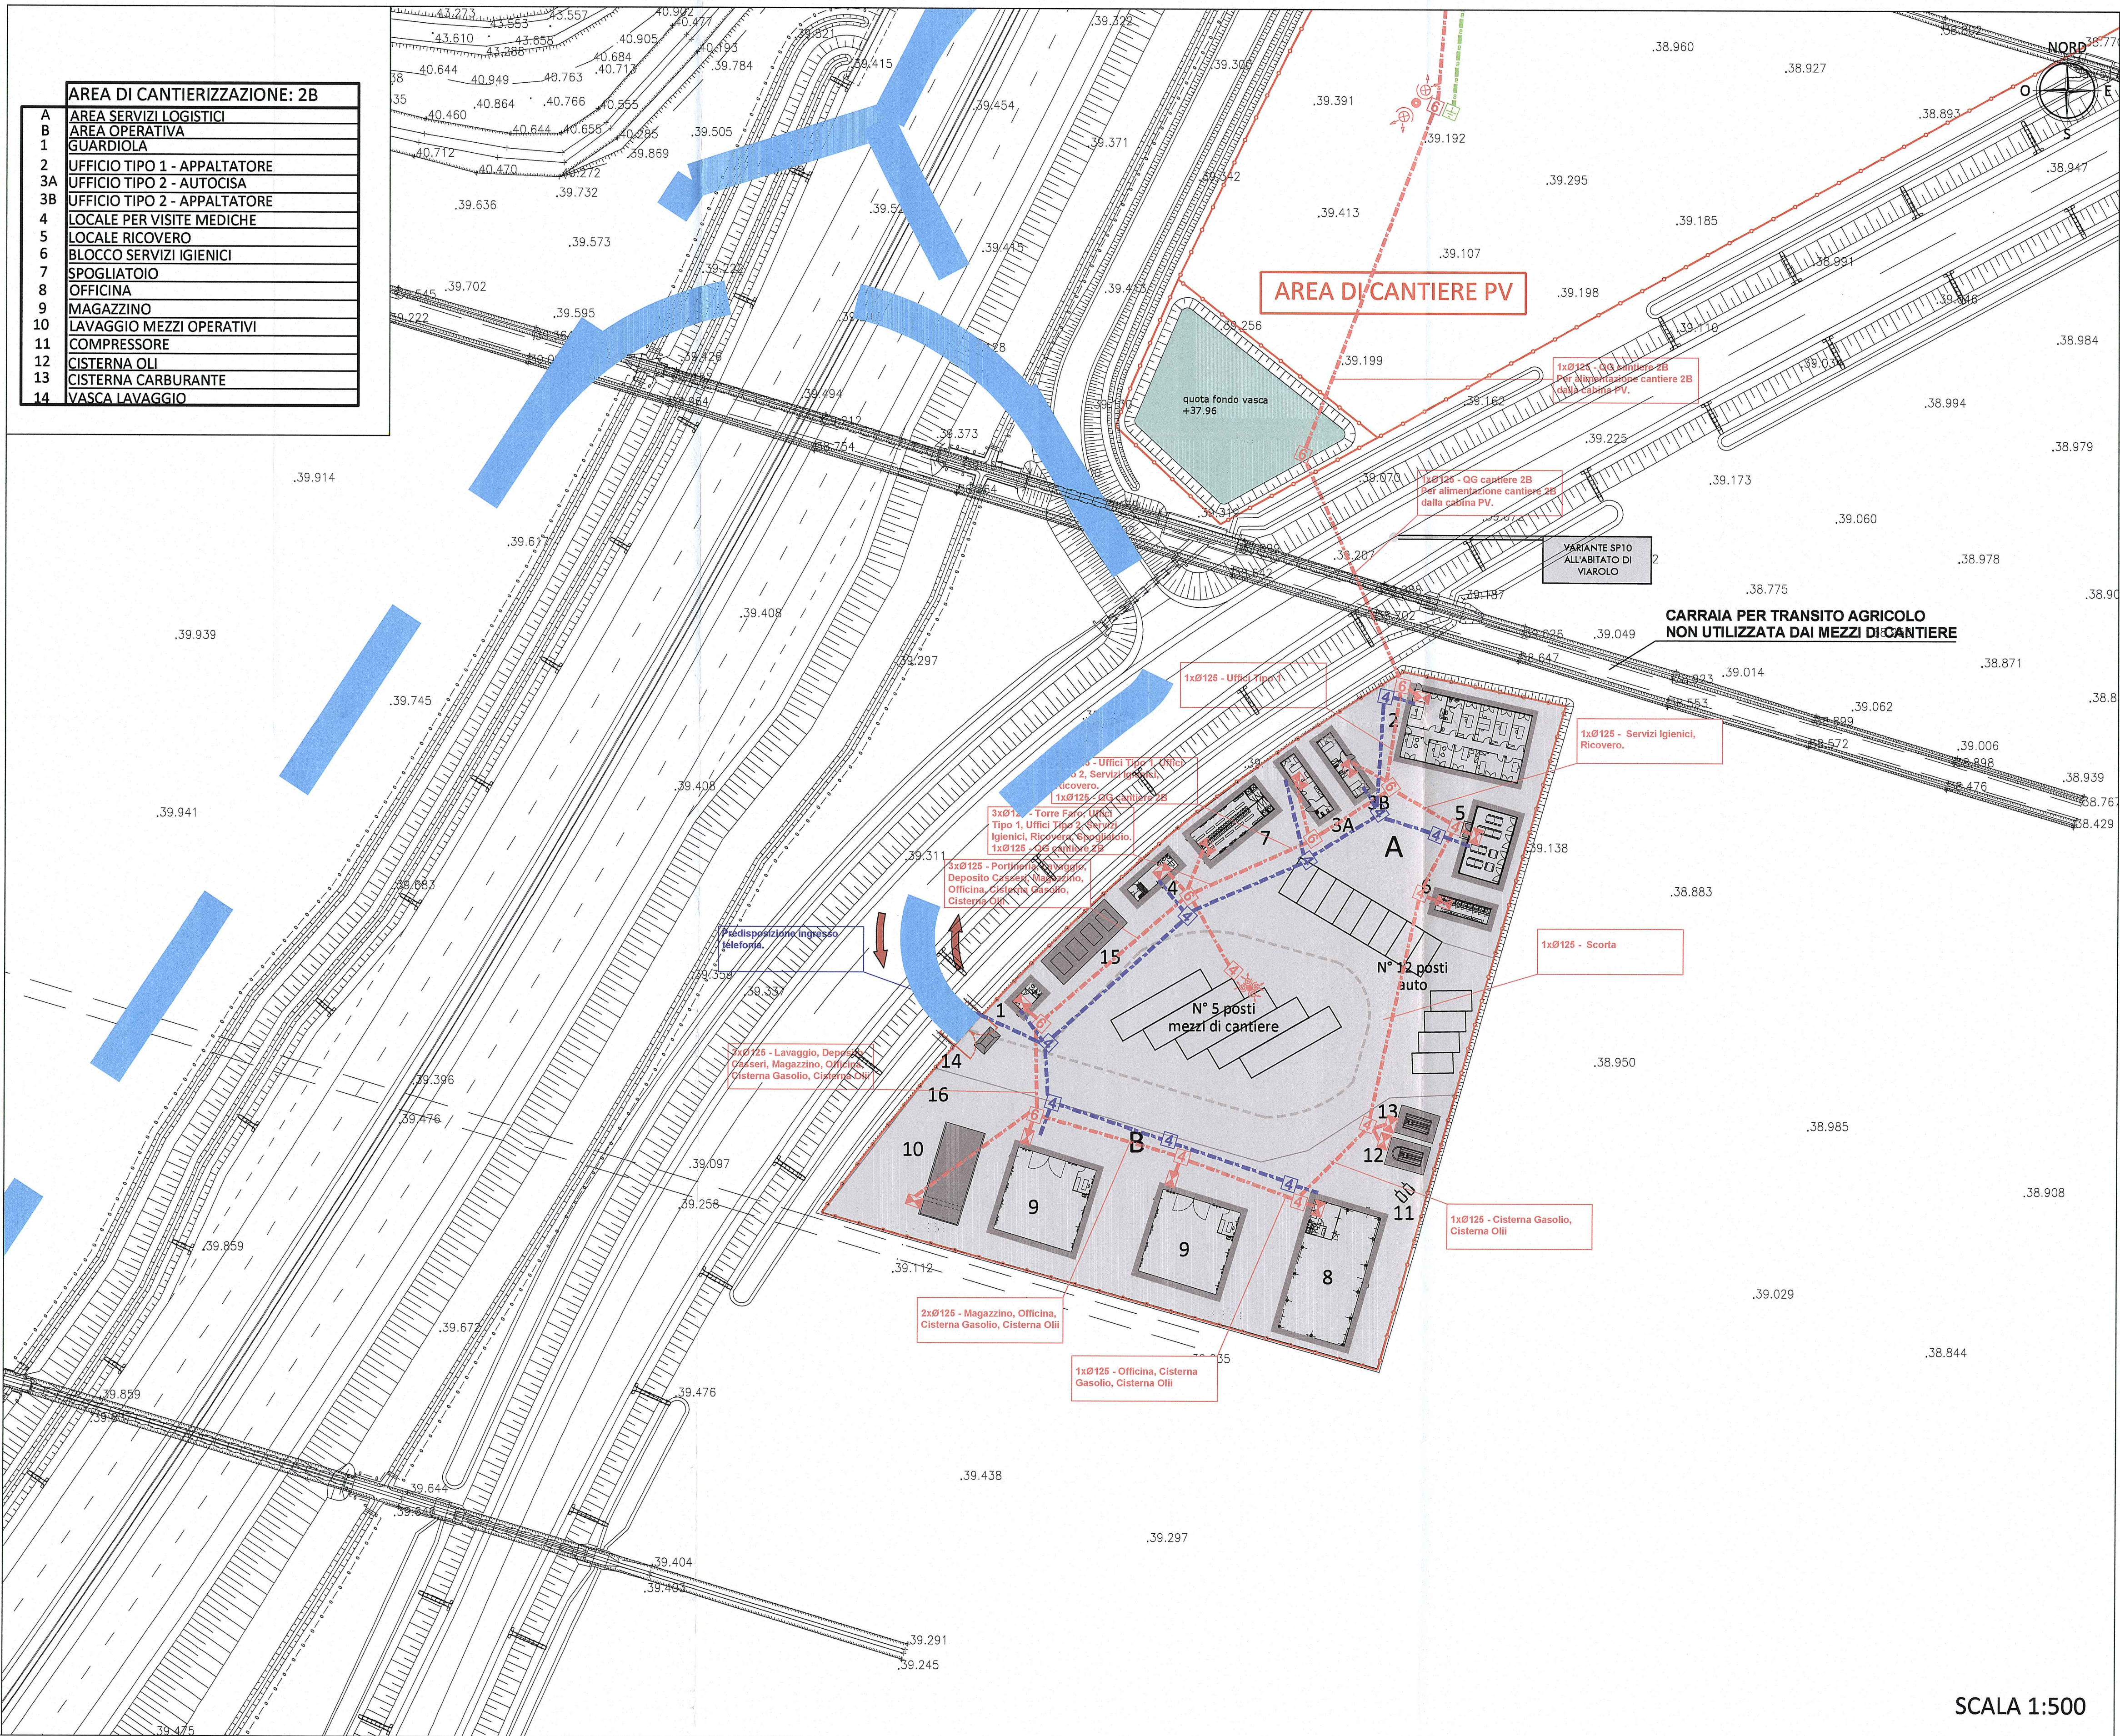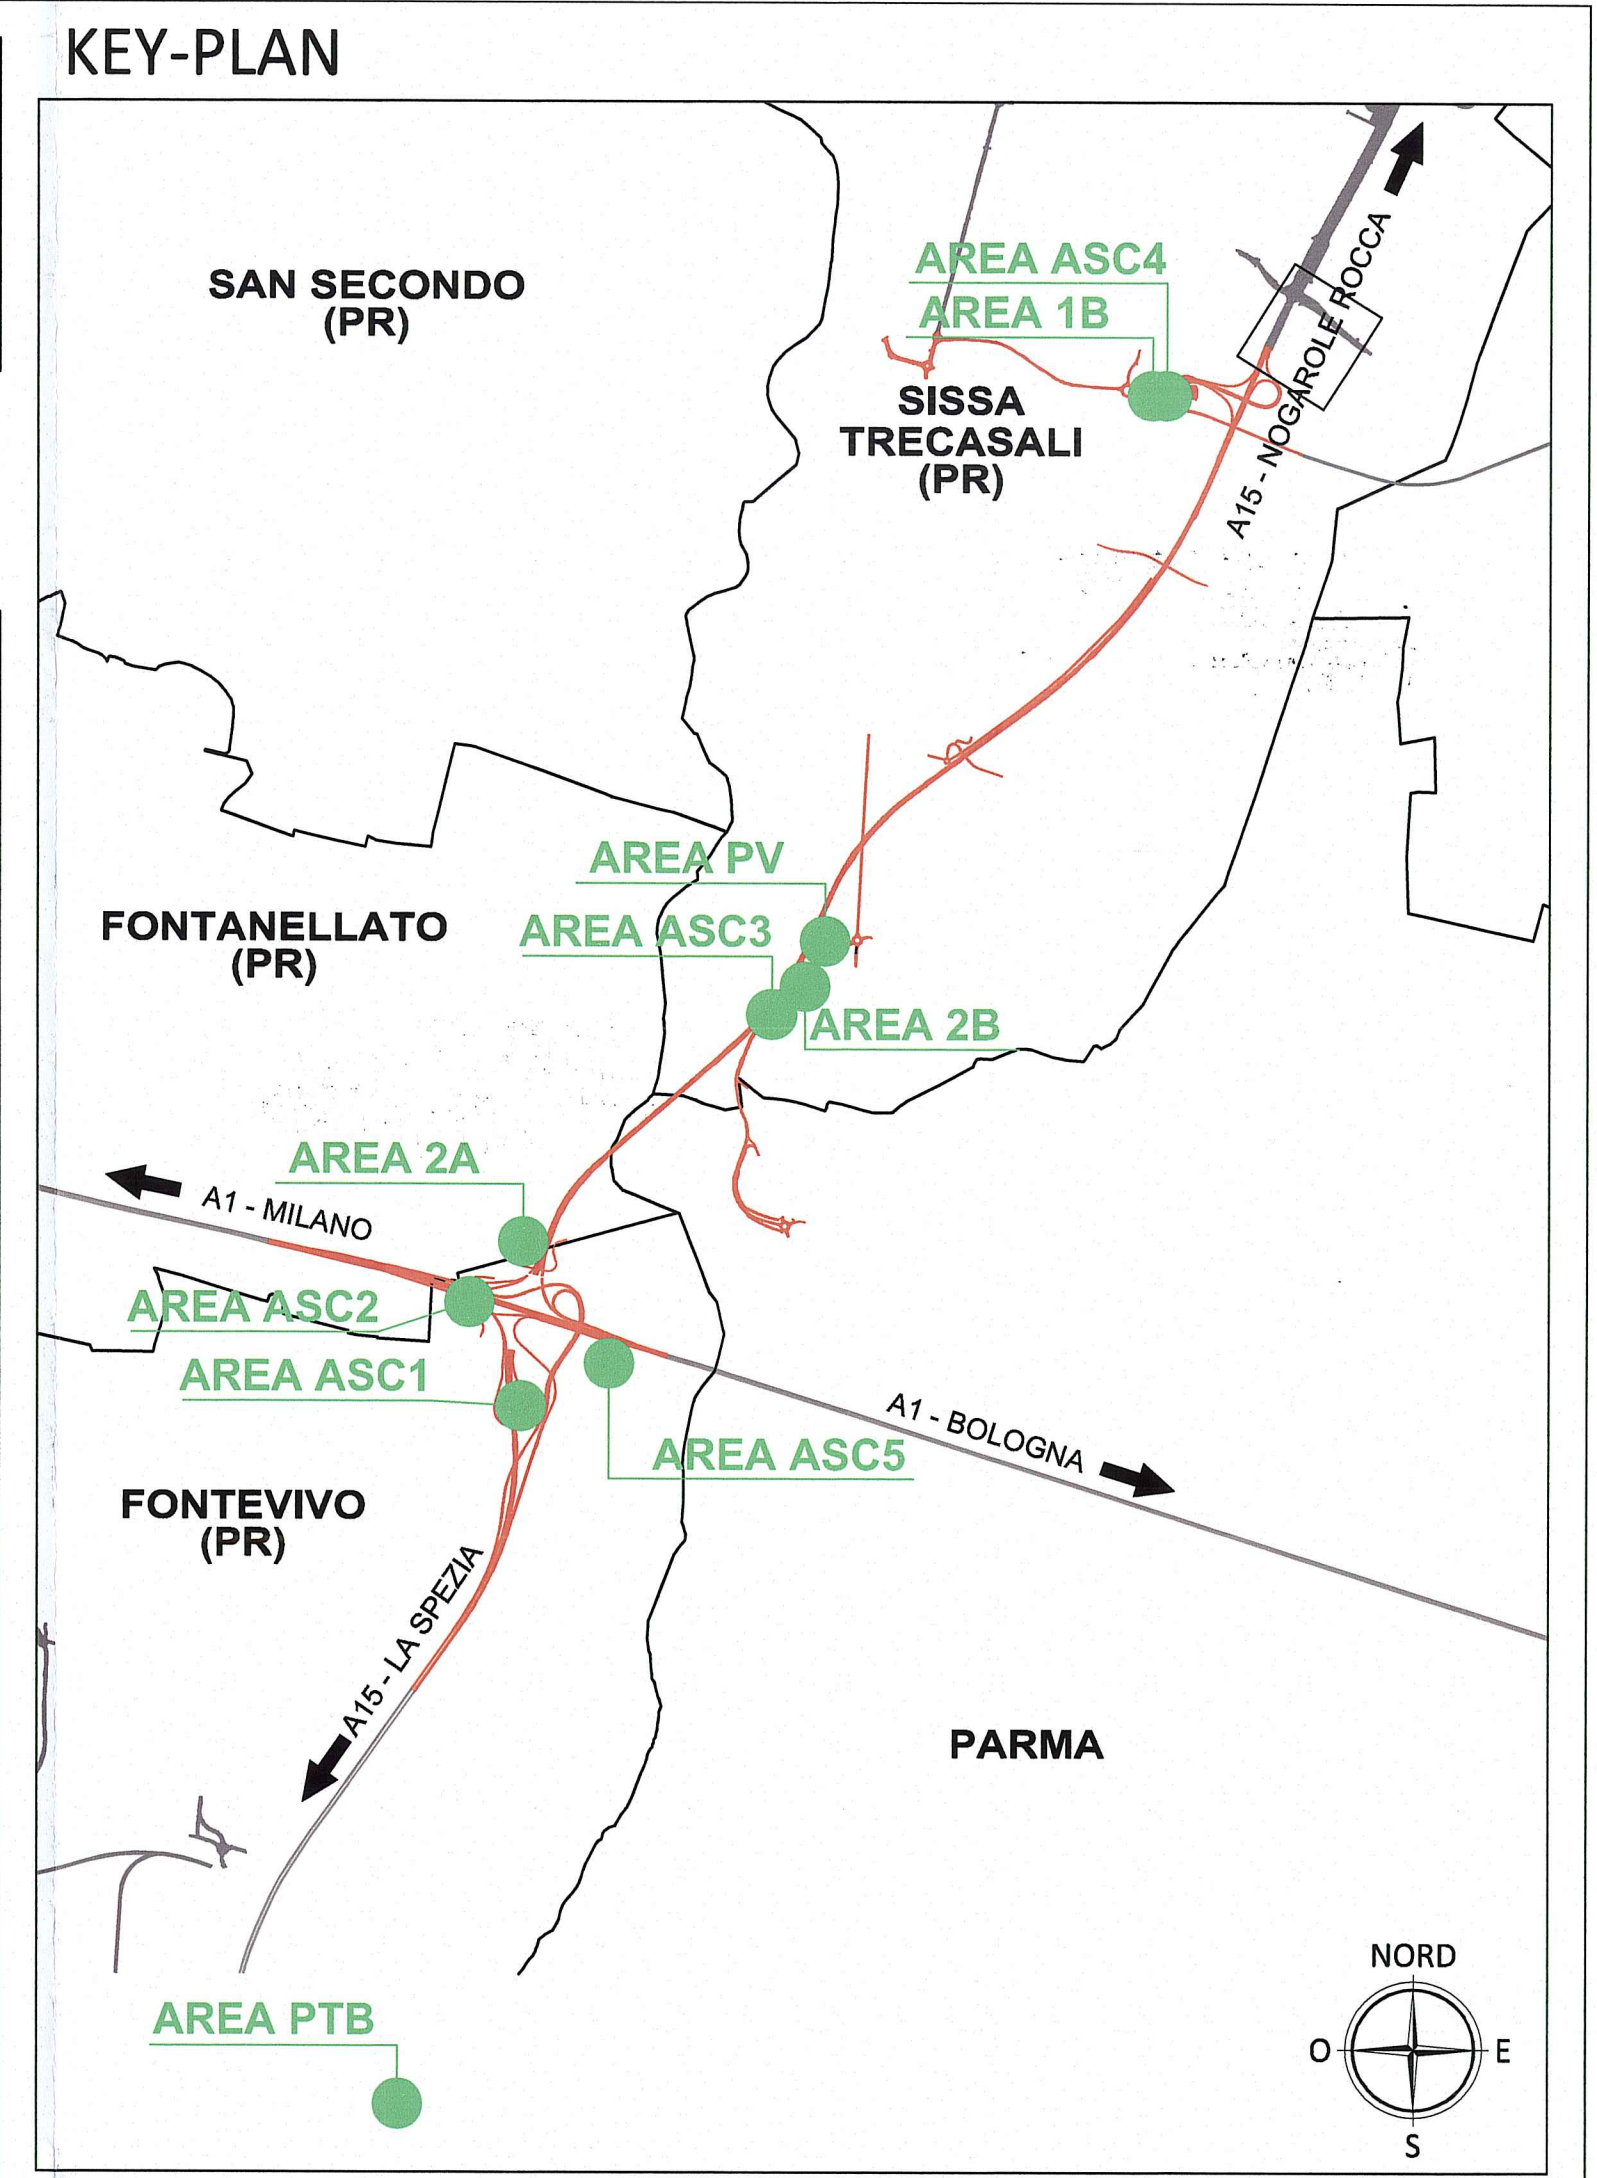

AREA DI CANTIERIZZAZIONE: 2B

A	AREA SERVIZI LOGISTICI
B	AREA OPERATIVA
1	GUARDIOLA
2	UFFICIO TIPO 1 - APPALTATORE
3A	UFFICIO TIPO 2 - AUTOCISA
3B	UFFICIO TIPO 2 - APPALTATORE
4	LOCALE PER VISITE MEDICHE
5	LOCALE RICOVERO
6	BLOCCO SERVIZI IGIENICI
7	SPOGLIATOIO
8	OFFICINA
9	MAGAZZINO
10	LAVAGGIO MEZZI OPERATIVI
11	COMPRESSORE
12	CISTERNA OLI
13	CISTERNA CARBURANTE
14	VASCA LAVAGGIO

SCALA 1:500

Committente: **AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.**
Via Camboara 26/A - Frazione Ponte Taro - 43015 NOCETO (PR)

Impresa Esecutrice: **PIZZAROTTI**
FONDATA NEL 1910

**AUTOSTRADA DELLA CISA A15
RACCORDO AUTOSTRADALE A15/A22
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO
RACCORDO AUTOSTRADALE FRA L' AUTOSTRADA DELLA CISA-FONTEVIVO (PR)
E L' AUTOSTRADA DEL BRENNERO-NOGAROLE ROCCA (VR). I LOTTO.**
C.U.P. G61B0400060008 C.I.G. 307068161E

PROGETTO ESECUTIVO

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.
Il Direttore FIBRE: Il Responsabile del Procedimento: Il Presidente:

IMPRESA PIZZAROTTI & C. s.p.a.
Il Direttore Tecnico: **Il Responsabile di Progetto
Dott. Ing. Luca Bondanelli**

PROGETTAZIONE DI: **PIZZAROTTI**
FONDATA NEL 1910

A.T.I.: **idrosse engineering** **ROCKSOIL S.p.A.** **VIA**

Consulenza specialistica a cura di: **PIZZAROTTI**

Titolo Elaborato: **Cantierizzazione
Cantierizzazione
Ambito operativo 2 - Area di cantierizzazione 2B
Planimetria distribuzione MT, BT, messa a terra e impianti speciali**

Data Emissione Progetto: 18/03/2014
Scala: 1:500

NUM. IDENTIFICATIVO	COSE COMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	AMBITO	CAT. OPERA	NUM. OPERA	PARTE OPERA	TPO DOC.	NUM. PROG. DOC.	REVISIONE
	RAAA	1	E	I	CN	CN	02	C	PL	028	C

Rev.	Data	DESCRIZIONE REVISIONE	Redatto	Controlato	Approvato
C	21/11/2014	Revisione generale base planimetrica	GARILESI	NIGRELLI	MAZZOLI
B	10/10/2014	Ispezione A15 prot. n. 751 del 08/08/2014	MORACCI	F.NIGRELLI	MAZZOLI
A	16/08/2014	REMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	Y.ZORZI	F.NIGRELLI	MAZZOLI
