


**PLANIMETRIA AREE DI CANTIERI
E VIABILITA' DI SERVIZIO**
Scala 1:5000

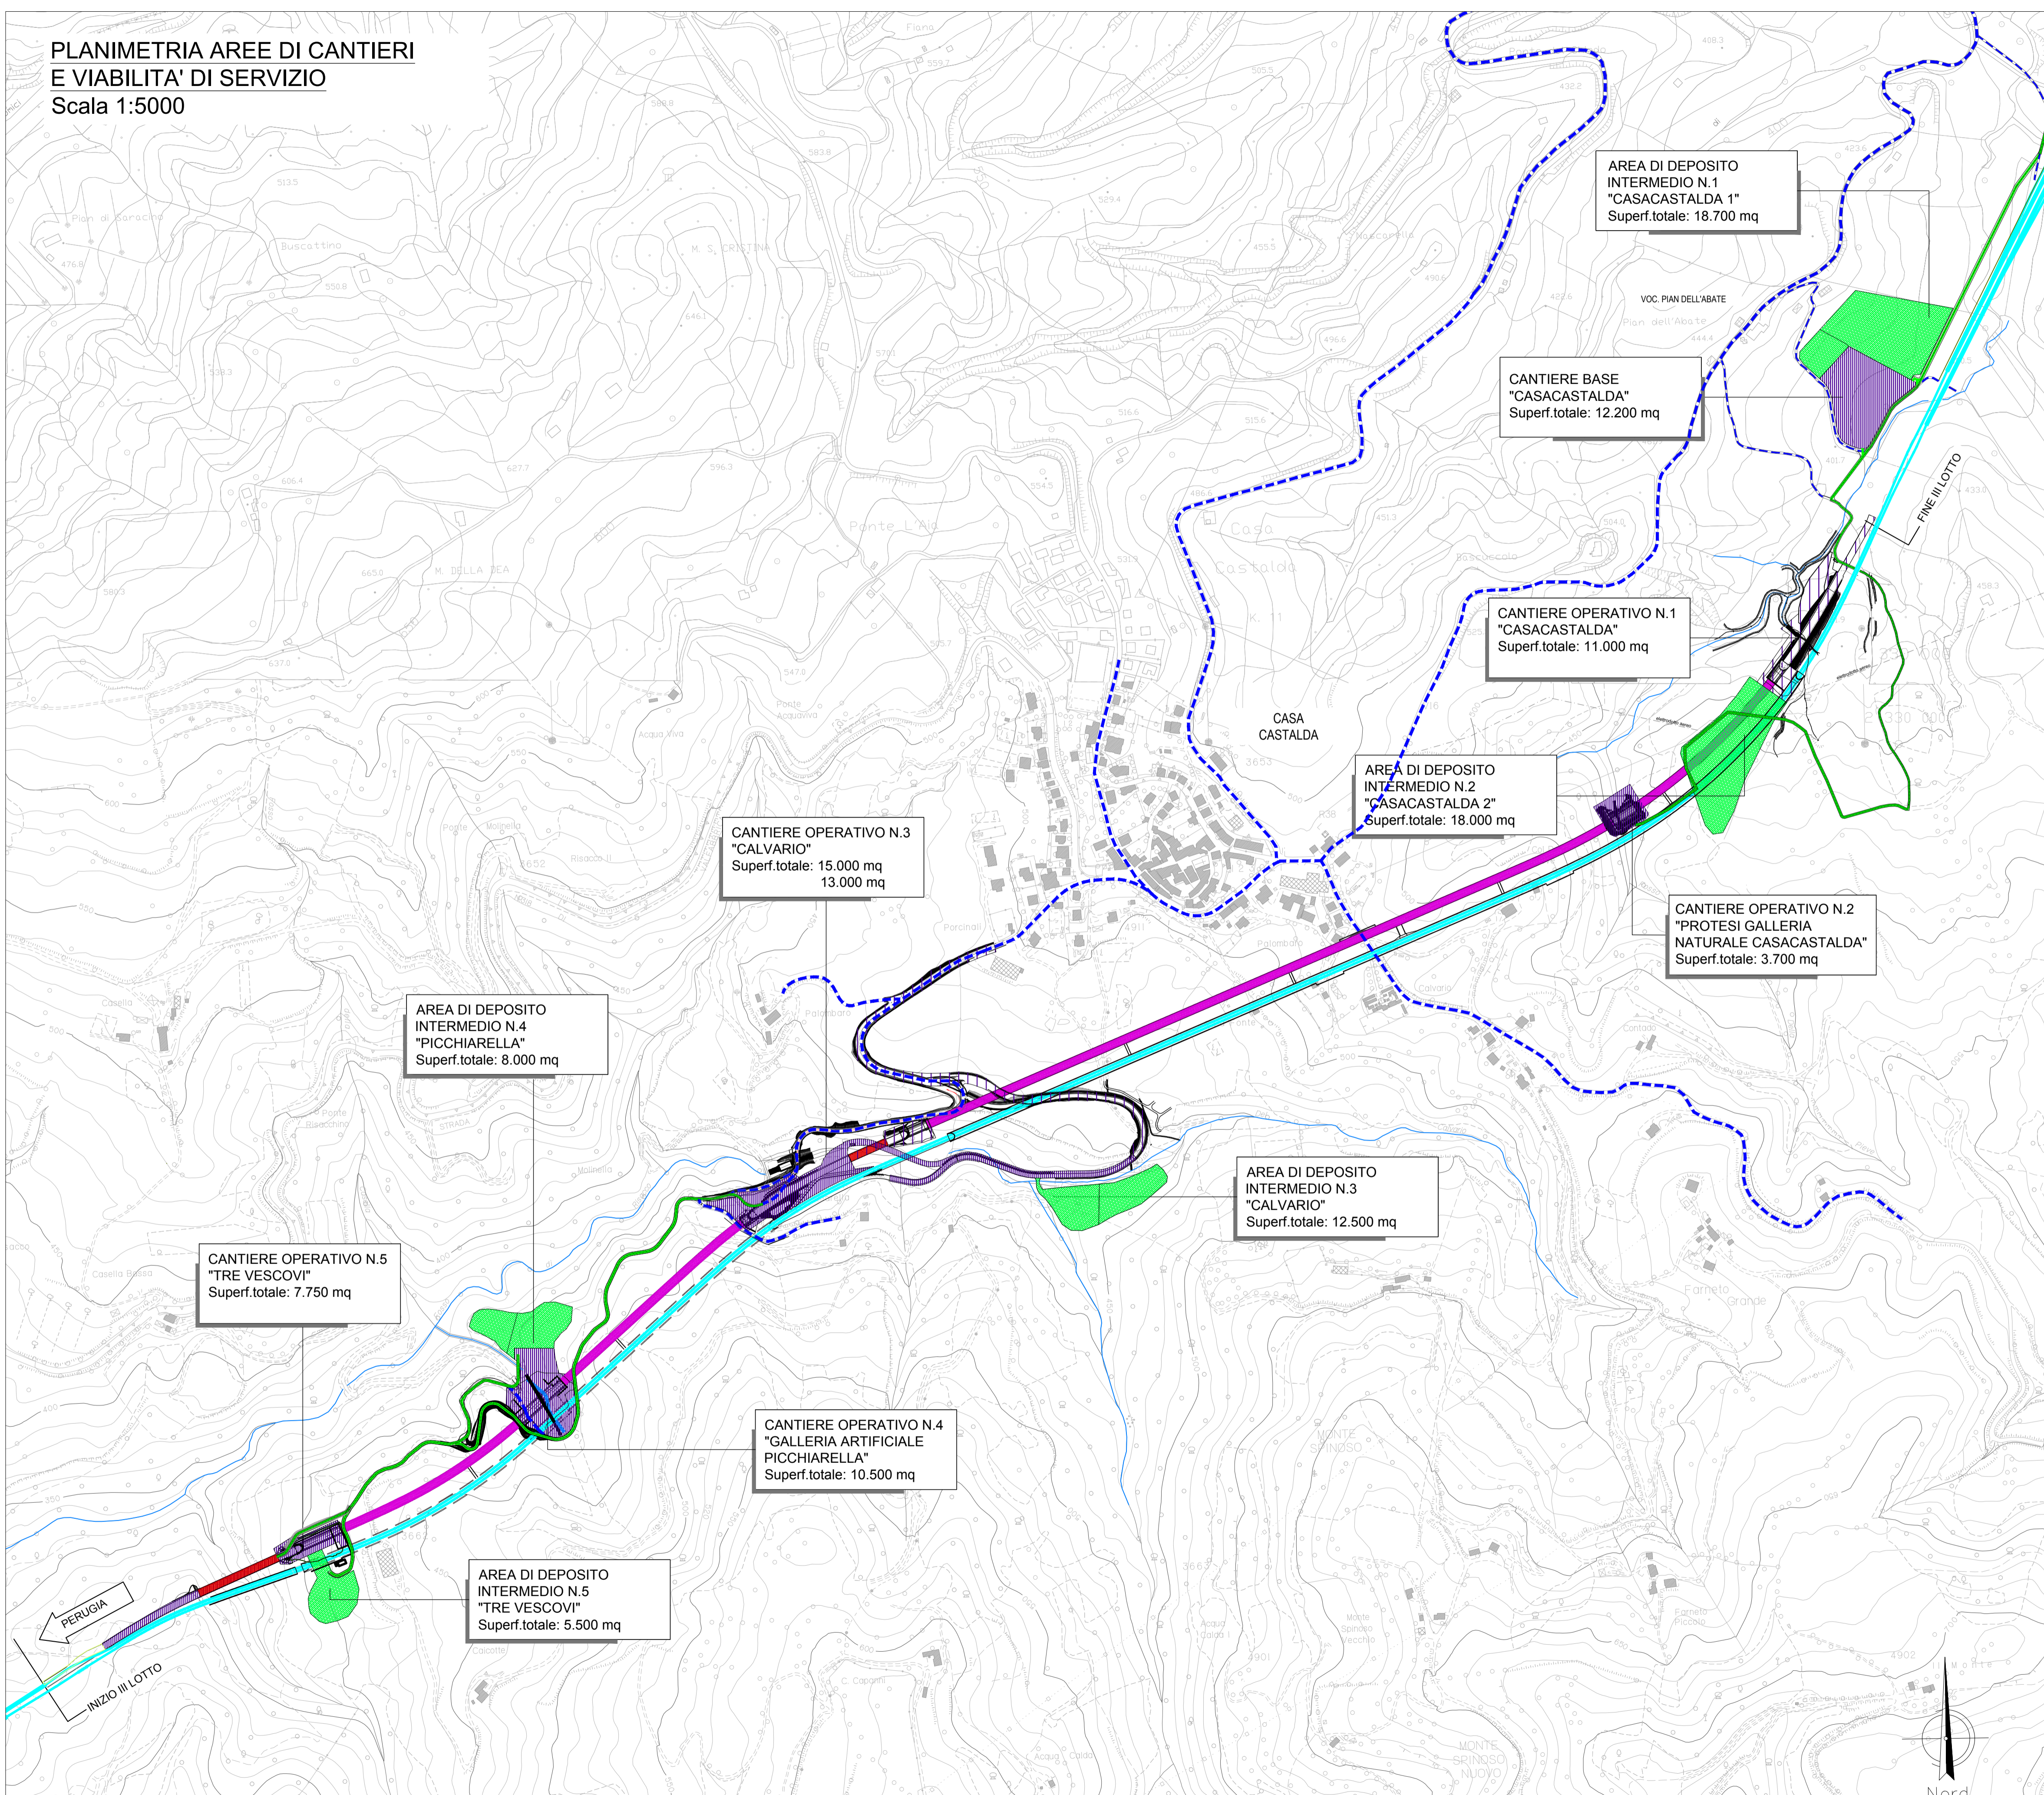

WBS	Opere in progetto	Pr in	Pr fin	L(m)	V scavo (mc)	V rilevato-rinerto (mc)	Esubero (mc)
1	Corpo stradale dal km 16+150.00 al km 16+275.58	16000.00	16275.58	275.58	99.57	672.34	-572.77
2	Viadotto "Tre Vescovi"	16275.58	16405.09	129.51	0.00	0.00	0.00
3	Corpo stradale dal km 16+405.09 al km 16+433.62	16405.09	16433.62	28.53		150.00	-150.00
4	Imbocco ovest Piccharella	16433.62	16508.62	75.00	31699.74	21061.50	10638.24
5	Piccharella dal km 16508.62 al km 16+829.70	16508.62	16829.70	321.08	44968.00		44968.00
6	Finestra intermedia Piccharella	16829.70	16917.05	87.35	47475.01	35085.00	12900.01
7	Piccharella dal km 16917.05 al km 17+283.35	16917.05	17283.35	366.30	50259.00		50259.00
8	Imbocco est Piccharella	17283.35	17307.35	24.00	6299.24	2895.00	3404.24
9	Corpo stradale dal km 17+307.35 al km 17+475.22	17307.35	17475.22	167.87	3087.08	2945.14	141.94
10	Ponte Calvario	17475.22	17535.14	59.92	0.00	0.00	0.00
12	Corpo stradale dal km 17+535.14 al km 17+560.00	17535.14	17560.00	24.86	2083.00	154.14	1928.86
13	Imbocco ovest Casacastalda	17560.00	17602.40	42.40	18572.15	12558.00	6014.15
14	Casacastalda dal km 17+620.40 al km 18+745.00	17602.40	18100.00	497.60	69531.43		69531.43
15	Finestra intermedia Casacastalda	18745.00	18785.00	40.00	9340.00	9140.00	0.00
16	Casacastalda dal km 18+785.00 al km 19+070.00	18100.00	19070.00	970.00	135541.57		135541.57
17	Imbocco est Casacastalda	19070.00	19104.94	34.94	15041.00	10785.00	4256.00
18	Corpo stradale dal km 19+104.94 al km 19+353.56	19104.94	19353.56	248.62	13783.38	142.74	13740.64
Totale					447.280.07	94888.86	352.991.21

LEGENDA

- AREE DI CANTIERE
- AREE DI DEPOSITO INTERMEDIO
- AREE TECNICHE LAVORAZIONI GALLERIA
- AREE TECNICHE LAVORAZIONI VIADOTTI
- VIABILITA' PRINCIPALE ESISTENTE
- NUOVA VIABILITA' DI CANTIERE
- VIABILITA' LOCALE ESISTENTE
- TRACCIATO STRADALE DI PROGETTO

anas Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S.N.318 DI VALFABBRICA
Tratto Valfabbrica-Schifanoia - Interventi di completamento dal Km 16+224 al Km 19+354
Lotto 5 : 1 stralcio parte B: raddoppio galleria Piccharella e viadotto Tre Vescovi
2 stralcio: raddoppio galleria Casacastalda e viadotto Calvario

PROGETTO ESECUTIVO COD. PG131 - PG6

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GDG - ICARIA

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Dott. Ing. Nando Granieri
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
MANDATARIA:
Sintagma **ICARIA**

IL PROGETTISTA:
Dott. Ing. Vladimiro Rotisciani
Dott. Arch. Vladimiro Rotisciani
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Terni n° A376

IL GEOLOGO:
Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini
Ordine dei Geologi della Regione Umbria n°108

IL R.U.P.
Dott. Ing. Antonio Scalamandrè

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Filippo Pambianco
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A1373

PROTOCOLLO DATA

PIANO DI UTILIZZO TERRE E ROCCE
Planimetria aree di cantiere e viabilità di servizio

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO DPPG08 E 1701	100-GE01-CAN-PL01-B CODICE ELAB. T00GEO1CANPL01	B	1:5000

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
B	Aggiornamento a seguito parere 2682 MATTM	29/05/2018	V.Rotisciani	V.Rotisciani	N.Granieri
A	Emissione	13/04/2018	F.Mocchioni	V.Rotisciani	N.Granieri
