


FASE 2:

- Lavorazioni:
- Realizzazione nuova recinzione ampliamento piazzale;
  - Realizzazione rete di terra e canalizzazioni;
  - Realizzazione cordoli;
  - Realizzazione fondazioni e posa nuovi sezionatori di I e II fila;
  - Realizzazione fondazioni e posa paline illuminazione;
  - Rimozione Tr-Ris esistente e posa nuovo TR-Ris;
  - Rimozione carro alimentatori e canalizzazioni provvisorie;
  - Realizzazione pavimentazione di piazzale;
  - Messa in servizio cabina TE.

LEGENDA	
PS1	Palo sezionatore 3KVcc di I fila
PS2	Palo sezionatore 3KVcc di II fila
PILL	Palina VTR h=5.0m f.t. - apparecchio illuminante LED IP66 53W - 6000lm
TR-RIS	Armadio trasformatore di isolamento
▤▤▤▤▤▤	Recinzione in CA a spadoni su cordolo in CA

- Demolizioni
- Costruzioni di fase
- Costruzioni fase precedente
- Costruzioni provvisorie

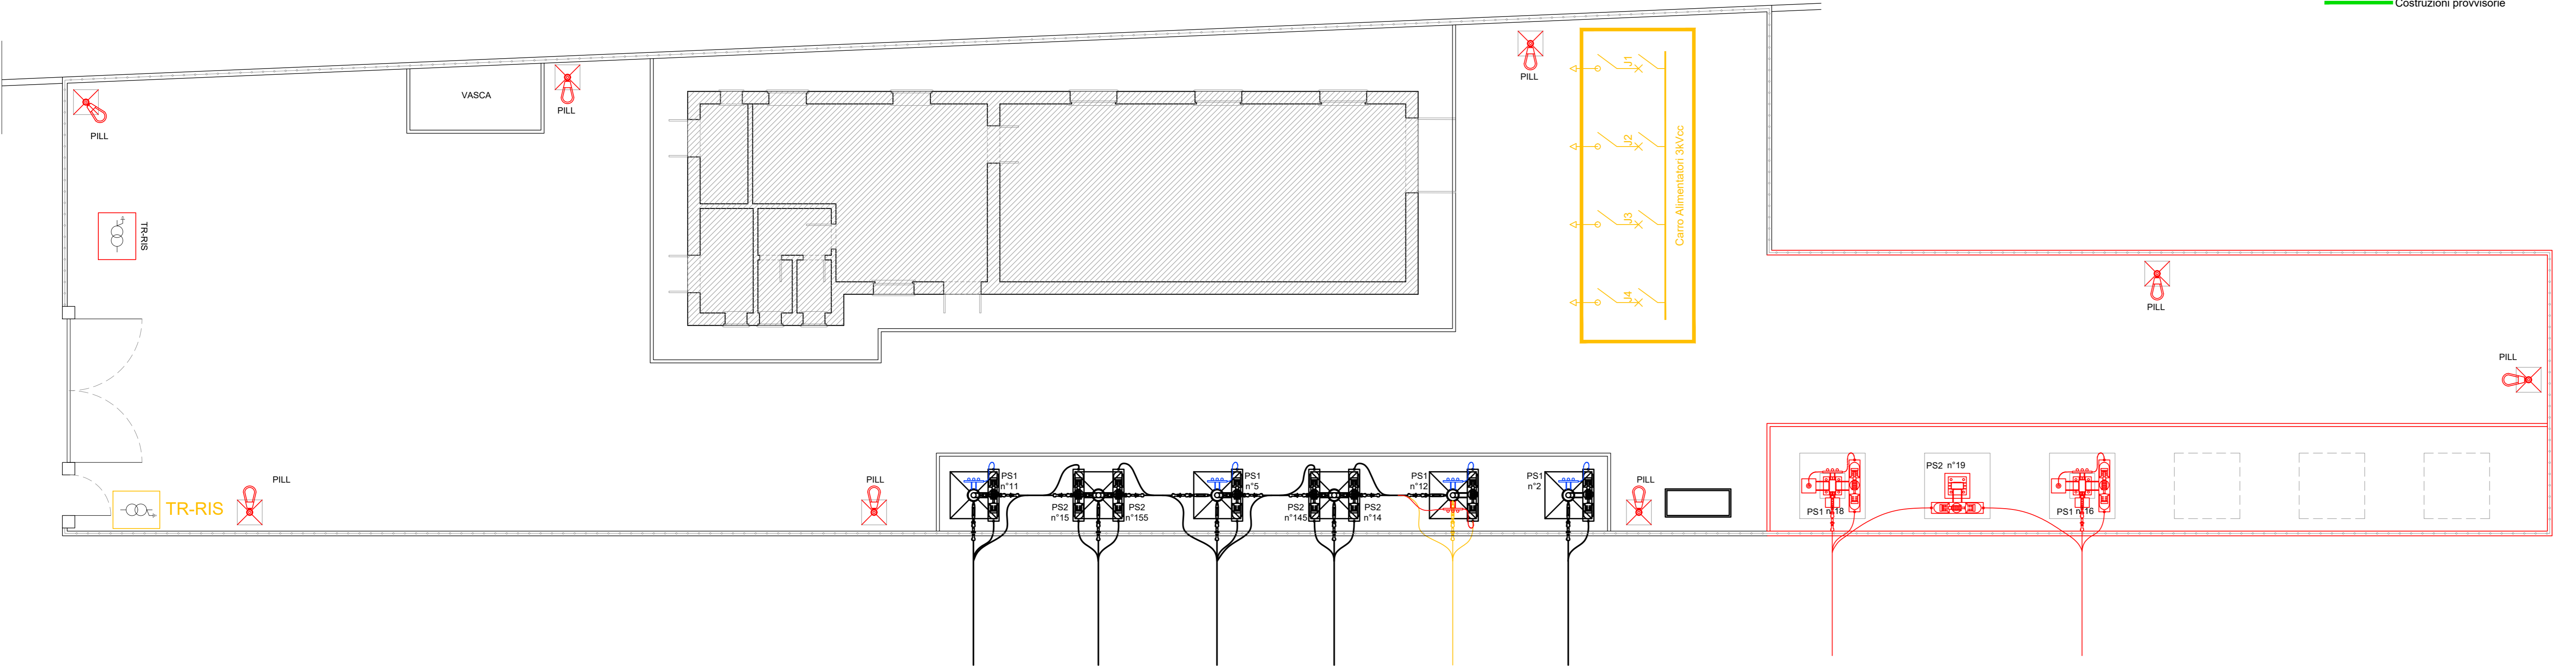

CUP: J84H17000930009

U.O. TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO LINEA CODOGNO - CREMONA - MANTOVA  
TRATTA PIADENA - MANTOVA

CTE MANTOVA  
Disposizione apparecchiature di piazzale (Layout) FASE 2

SCALA:  
1:100

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NM25	03	D	58	PA	SE1420	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	F. Massari	Apr 2020	M. Reggiani	Apr 2020	M. Berlingieri	Apr 2020	M. Gambero Apr 2020

