
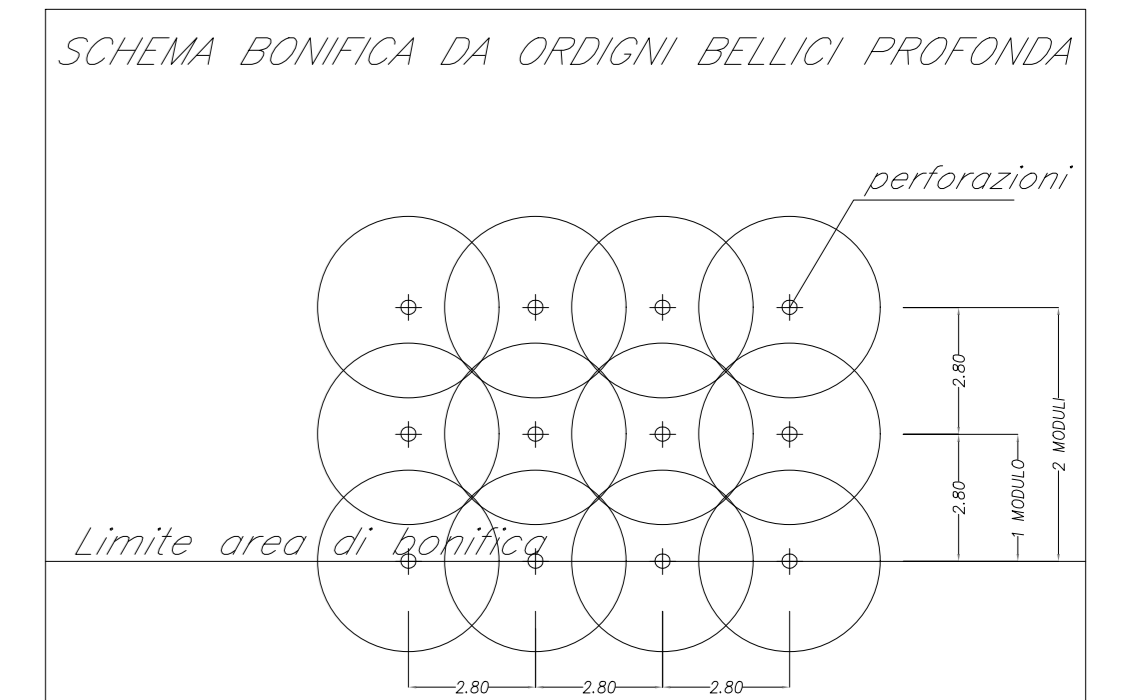




BONIFICA BELLICA IN PROGETTO						
SUB LOTTO 1						
BOE PROGETTO	BB01A	BB01B	BB01C	BB01D	BB01E	
PROFONDITA' 3m GARANZIA 4m	159031 mq	154843 mq	157535 mq	125913 mq	75476 mq	
PROFONDITA' 7m GARANZIA 8m	45069 mq	46601 mq	106706 mq	80081 mq	0 mq	
BOE LINEA STORICA						
	BB01F		BB01G			
da km 140+155 a km 137+623	da km 137+623 a km 135+584	da km 135+584 a km 134+215	da km 134+215 a km 133+900	da km 133+900 a km 133+510		
PROFONDITA' 3m GARANZIA 4m	40224 mq	18404 mq	5603 mq	8991 mq	2517 mq	
PROFONDITA' 7m GARANZIA 8m	0 mq	0 mq	0 mq	0 mq	0 mq	
BONIFICA BELLICA A CARICO DELL'APPALTATORE						
SUB LOTTO 1						
BOE PROGETTO	BB01A	BB01B	BB01C	BB01D		
PROFONDITA' 3m GARANZIA 4m	9050 mq	30700 mq	100731 mq	12997 mq		
PROFONDITA' 7m GARANZIA 8m	0 mq	0 mq	2365 mq	2488 mq		

BONIFICA BELLICA ESEGUITA DALLA STAZIONE APPALTANTE						
SUPERFICI TRATTATE						
COLLAUDO	Profondità	TAVOLA				
		1	2	3	4	
1	m2	6130	6130	13064	3688	3916
2	m2	4610	4411	208	6165	280
3	m2					17872
4	m2					14479
5	m2					5346
						583
						4763
						4689
						310
						4379
						12177
						7670
						4507
FORI ESEGUITI						
COLLAUDO	Profondità	TAVOLA				
		1	2	3	4	
1	ml di fori	2349		10596	3500	
2	ml di fori	1689	189	108	7042	5544
3	ml di fori					1383
4	ml di fori					229
5	ml di fori					123
						3920
						2934
						4025

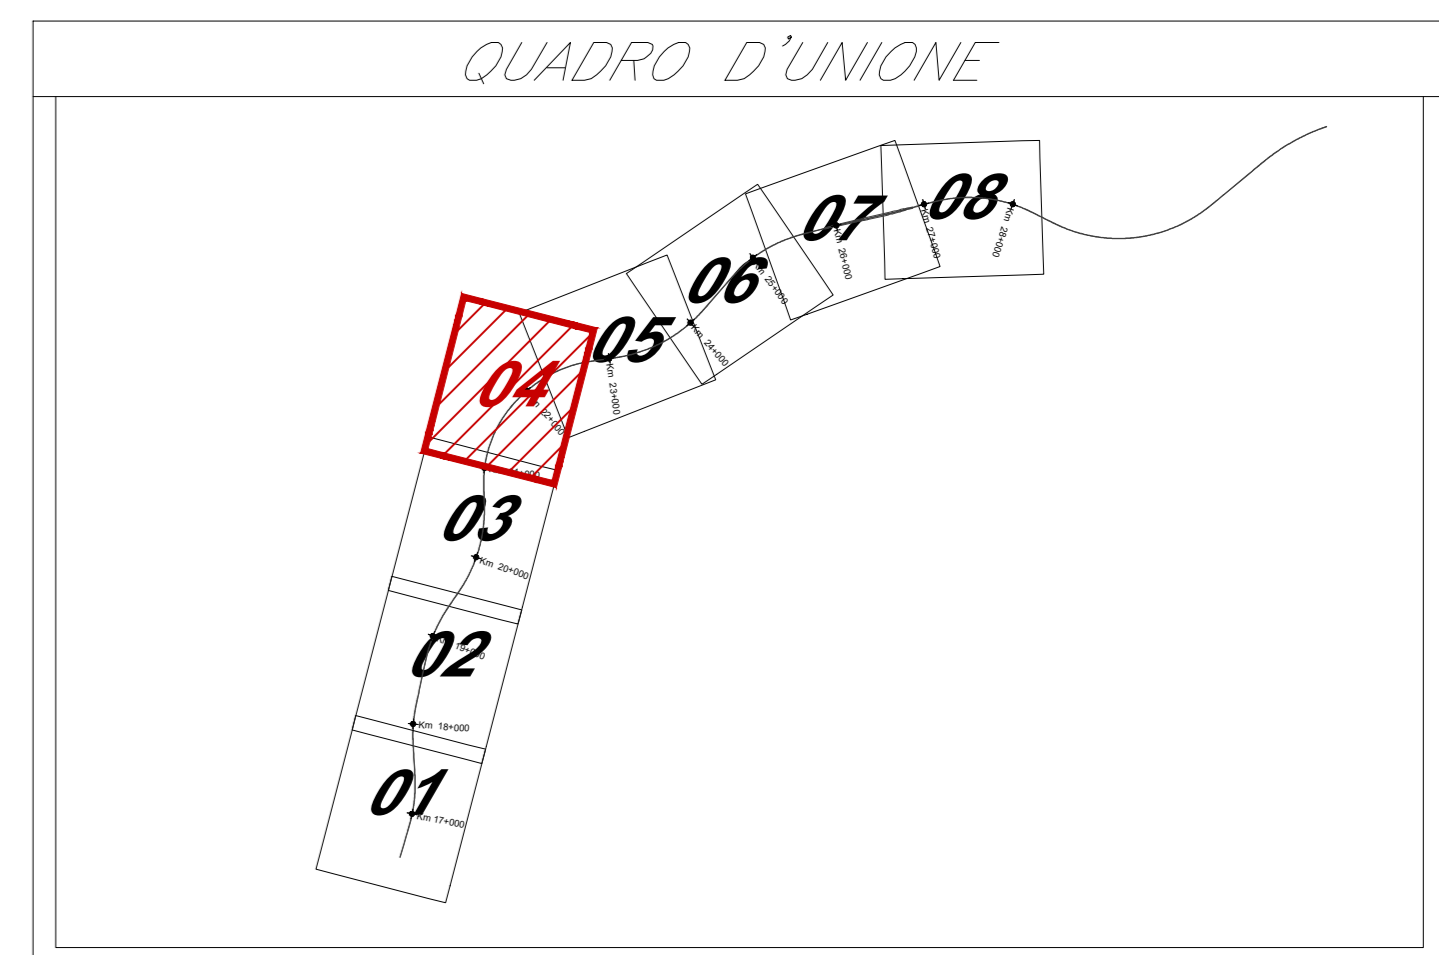

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI BOB
In ragione delle opere in progetto si distinguono tre diverse tipologie d'interventi di bonifica:
N.B.: PER LE ZONE CON INDIVIDUAZIONE DI ORDIGNI OLTRE LA PROFONDITA' DI 1m, SI PROCEDERA' PRIMA CON UNA RICERCA SUPERFICIALE

- AREA BONIFICA ORDIGNI BELLICI PROFONDA SOTTO LA PROFONDITA' DI 1m (PROFONDITA' 3,00m - GARANZIA 4,00m) GIÀ ESEGUITA
 - AREA BONIFICA ORDIGNI BELLICI PROFONDA SOTTO LA PROFONDITA' DI 1m (PROFONDITA' 7,00m - GARANZIA 8,00m) GIÀ ESEGUITA
 - LINEA STORICA - AREA BONIFICA ORDIGNI BELLICI PROFONDA SOTTO LA PROFONDITA' DI 1m (PROFONDITA' 3,00m - GARANZIA 4,00m) DA ESEGUIRE
 - AREA BONIFICA ORDIGNI BELLICI PROFONDA SOTTO LA PROFONDITA' DI 1m (PROFONDITA' 3,00m - GARANZIA 4,00m) DA ESEGUIRE
 - AREA BONIFICA ORDIGNI BELLICI PROFONDA SOTTO LA PROFONDITA' DI 1m (PROFONDITA' 7,00m - GARANZIA 8,00m) DA ESEGUIRE
 - AREA BONIFICA ORDIGNI BELLICI A CARICO DELL'APPALTATORE PROFONDA SOTTO LA PROFONDITA' DI 1m (PROFONDITA' 3,00m - GARANZIA 4,00m) DA ESEGUIRE
 - AREA BONIFICA ORDIGNI BELLICI A CARICO DELL'APPALTATORE PROFONDA SOTTO LA PROFONDITA' DI 1m (PROFONDITA' 7,00m - GARANZIA 8,00m) DA ESEGUIRE
- CAMPO N° CAMPI CONVENZIONALI DALLE DIMENSIONI DI m50x50

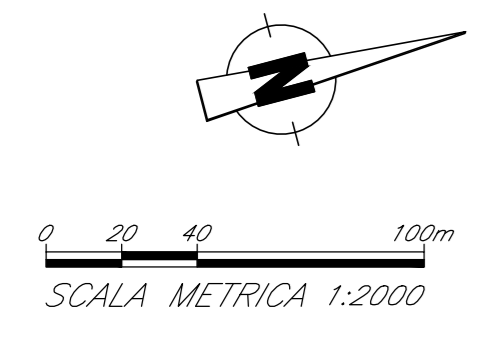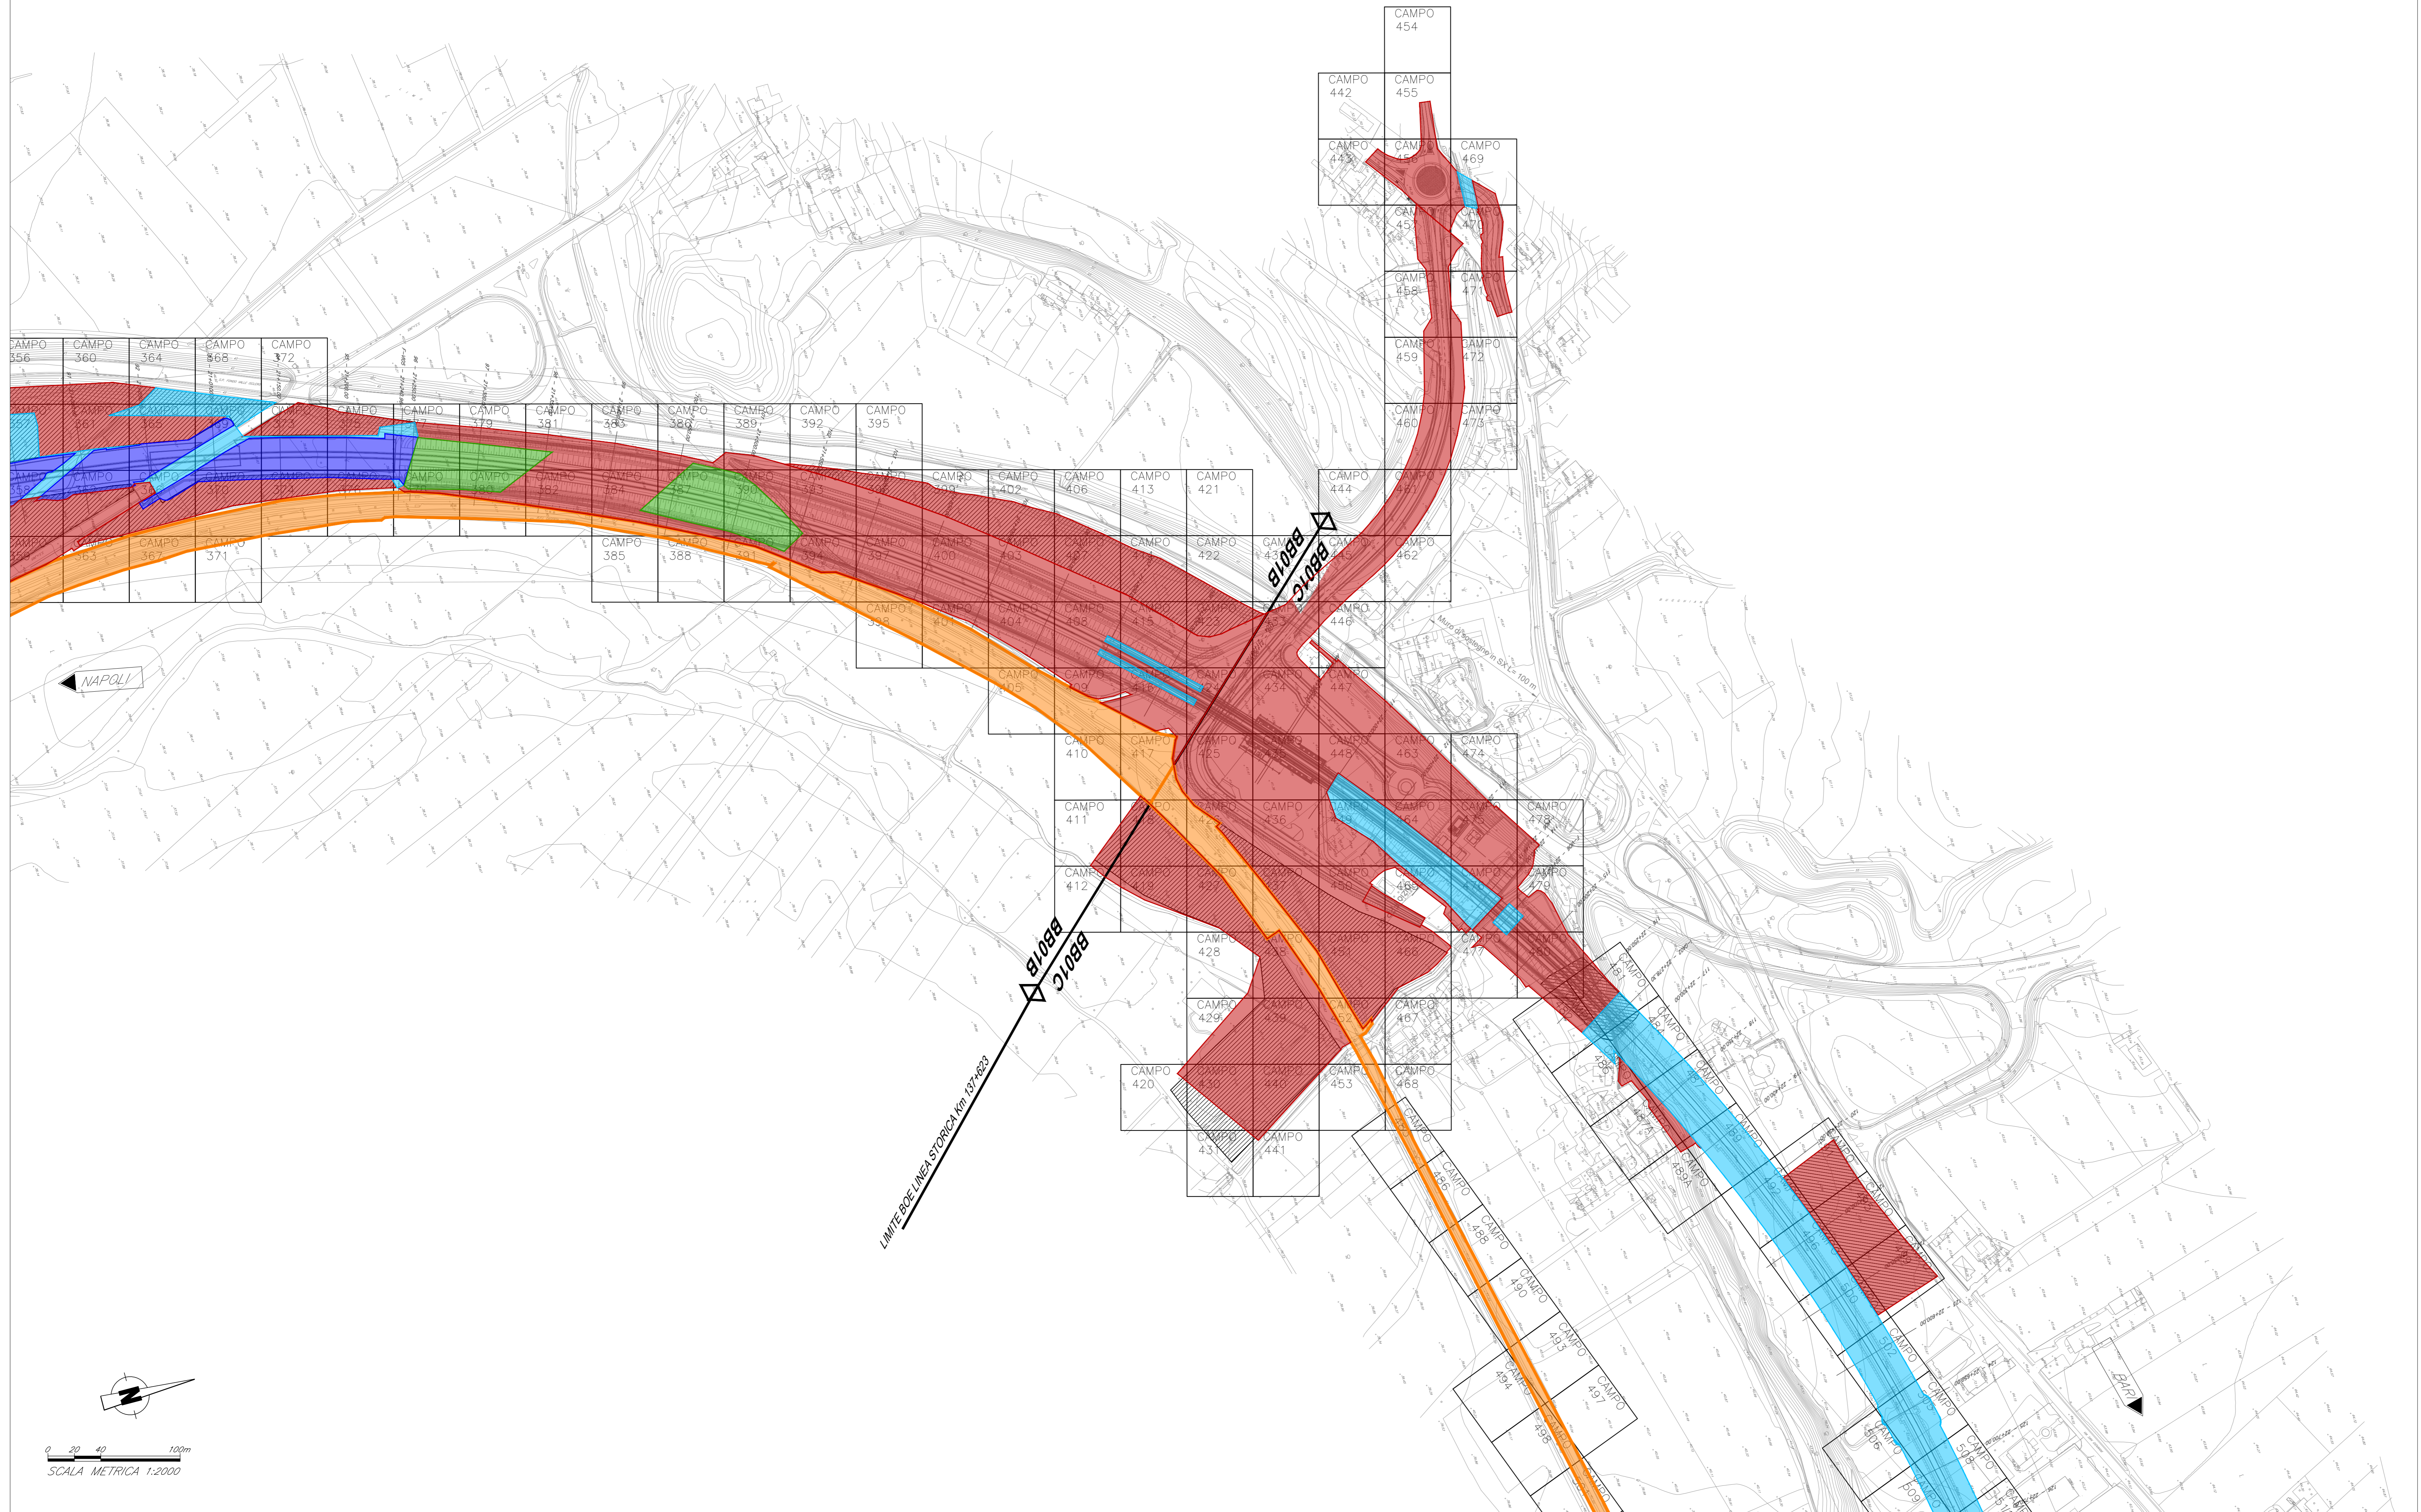

COMMITTENTE: **RFI** RETTI FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

APPALTATORE: **PIZZAROTTI**, **TECNICA**, **ITINERA**, **SALCEP**, **JEDS INFRASTRUTTURE**

PROGETTAZIONE: **GODATA ENGINEERING**, **INTEGRA**, **RINA**

PROGETTISTA: F. Rizzo

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. P. Rizzo

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO I° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - TELESE

BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI
Planimetria dal km 21+000 al km 22+700 - Tav. 4

APPALTATORE: **IMPRESA PROSPERITÀ & C. S.p.A.** (Impresa di diritto italiano) - Ing. S. Del Balso - 08/06/2020

SCALA: 1:2000

COMMESSA: I F 26 | LOTTO: 12 | FASE: E | ZP: P6 | OPERA/DISCIPLINA: BB0101 | PROG.: 004 | REV.: A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	D. Rizzo	14/03/2020	F. Rizzo	14/03/2020	P. Grassi	14/03/2020	F. Rizzo
B	Revisione e aggiustamenti TR	D. Rizzo	23/09/2020	F. Rizzo	23/09/2020	P. Grassi	23/09/2020	

File: IF26.1.2.E.ZZ.P6.BB.00.0.1.004.B n. Elab.: 23/06/2020
