




Tipo di area: Area di cantiere 1
 Localizzazione: Area di Svincolo Serradifalco
 Area: 11000mq
 INTERVENTO:
 Scotico: 3300 mc
 Rinterro con terre di coltura: 3300 mc

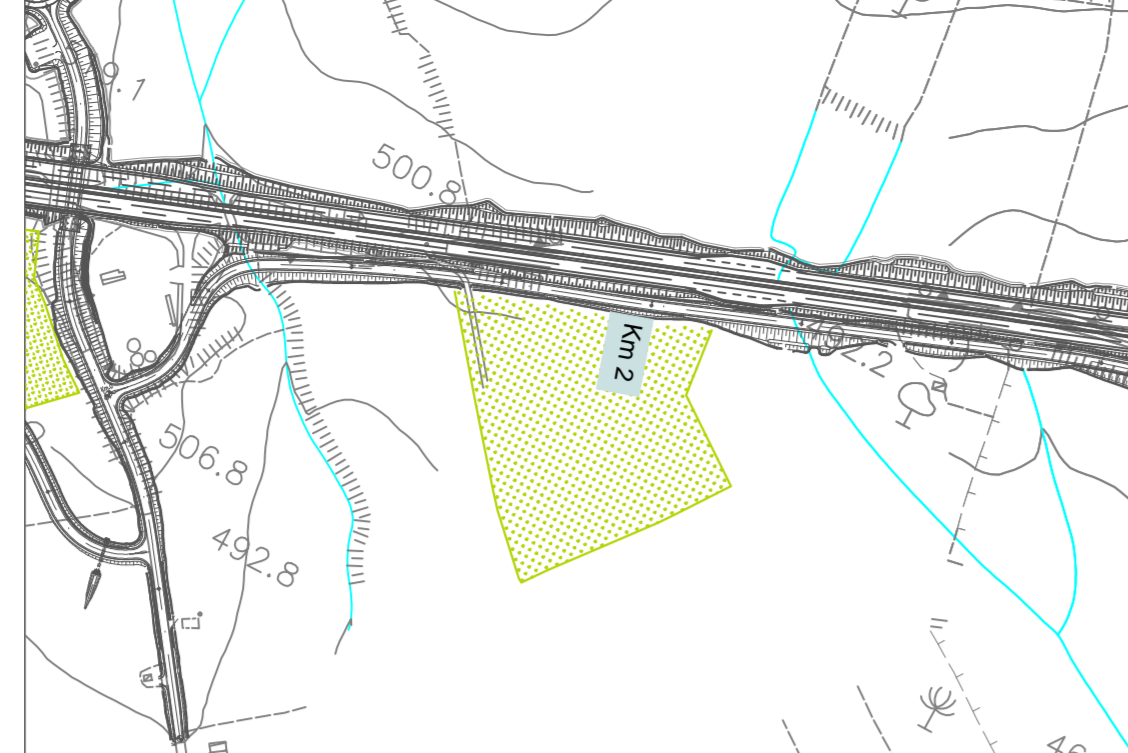

Tipo di area: Area di deposito temporaneo
 Localizzazione: Comune di Caltanissetta - Km 2+000
 Area: 23000 mq
 INTERVENTO:
 Scotico: 6900 mc
 Rinterro con terre di coltura: 6900 mc

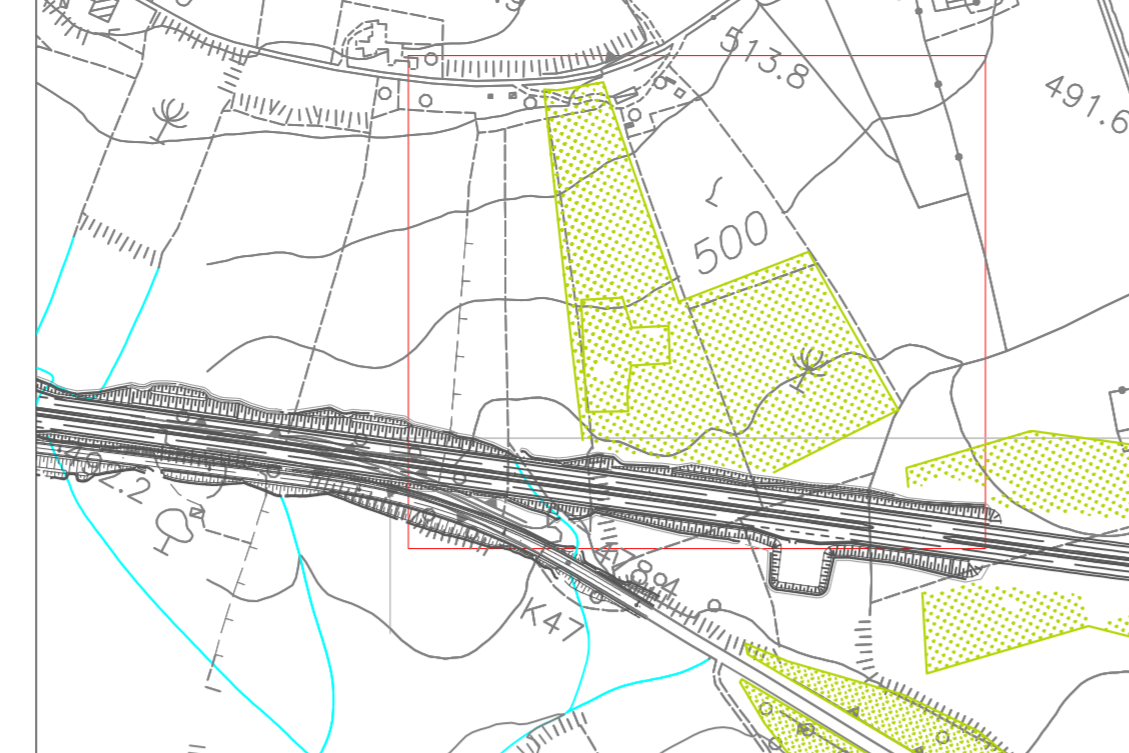


Tipo di area: Area di cantiere operativo e area di deposito temporanea
 Localizzazione: Comune di Caltanissetta Km 2+500
 Area: 25000 mq
 Ubicazione: esproprio temporaneo
 INTERVENTO:
 Scotico: 7500 mc
 Rinterro con terre di coltura: 7500 mc

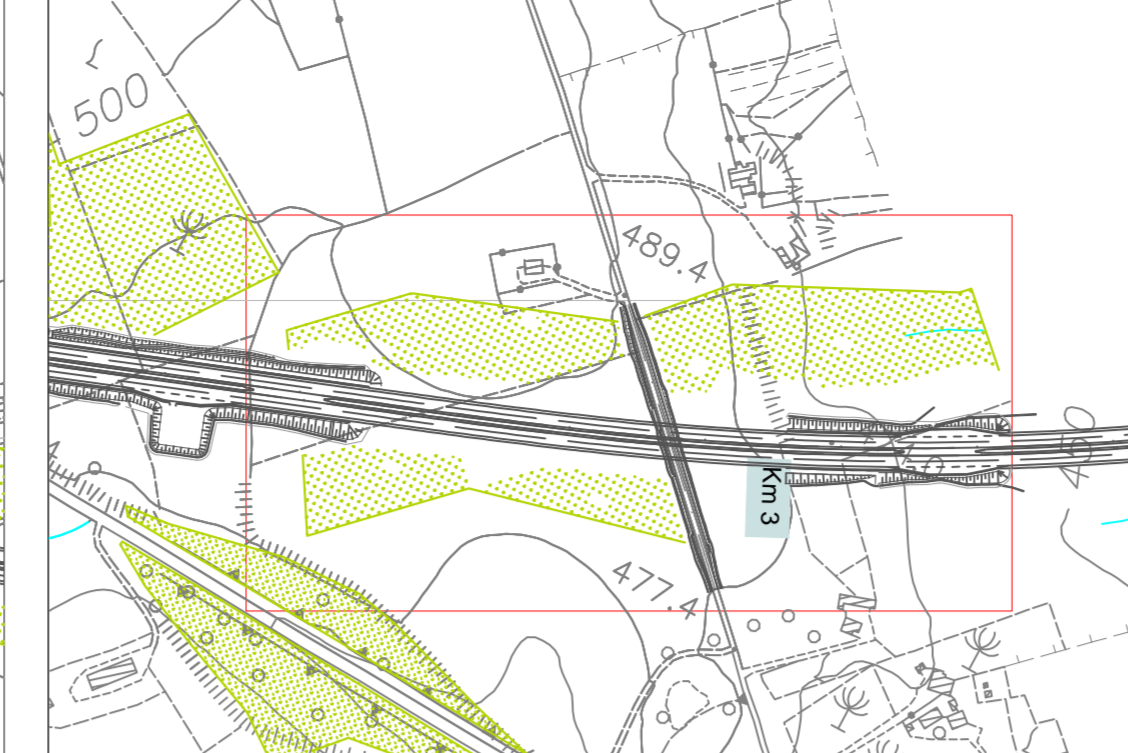


Tipo di area: Area di deposito temporaneo
 Localizzazione: Comune di Caltanissetta - km 3+000
 Area: 31000 mq
 INTERVENTO:
 Scotico: 9300 mc
 Rinterro con terre di coltura: 9300 mc




Tipo di area: Area di deposito temporaneo
 Localizzazione: Comune di Caltanissetta
 Area complessiva: 7250 mq
 INTERVENTO:
 Scotico: 2175 mc
 Rinterro con terre di coltura: 2175 mc

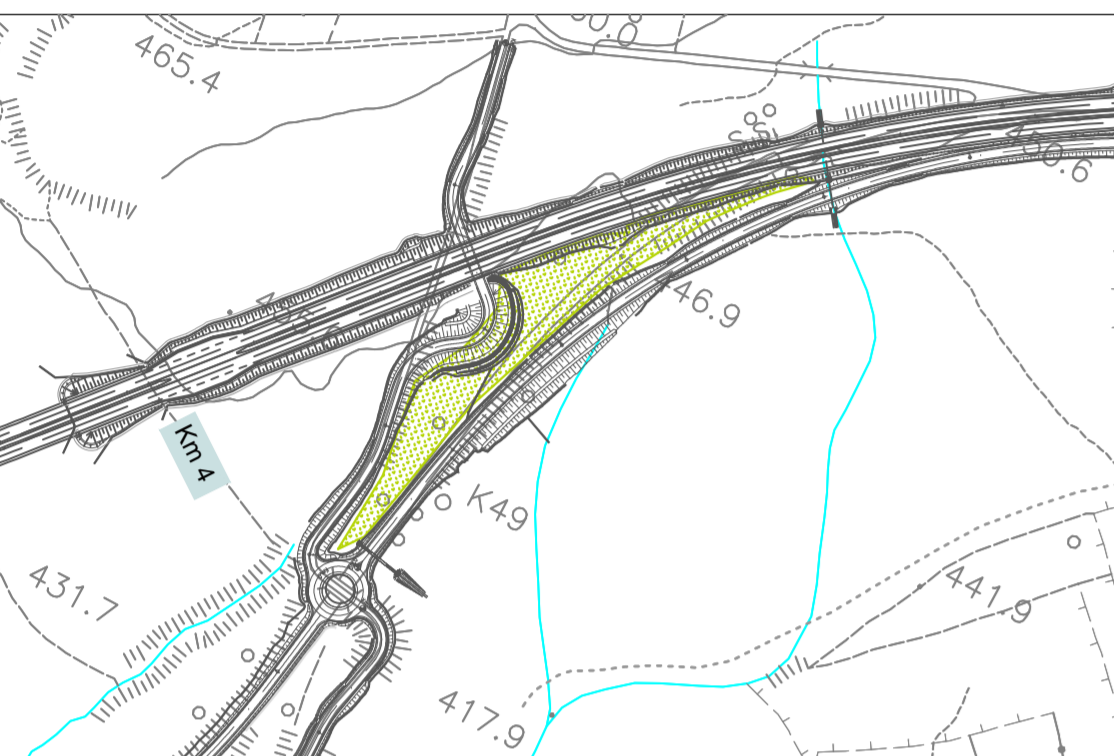


Tipo di area: Area di deposito temporaneo
 Localizzazione: Comune di Caltanissetta
 Area: 10120 mq
 INTERVENTO:
 Scotico: 3036 mc
 Rinterro con terre di coltura: 3036 mc

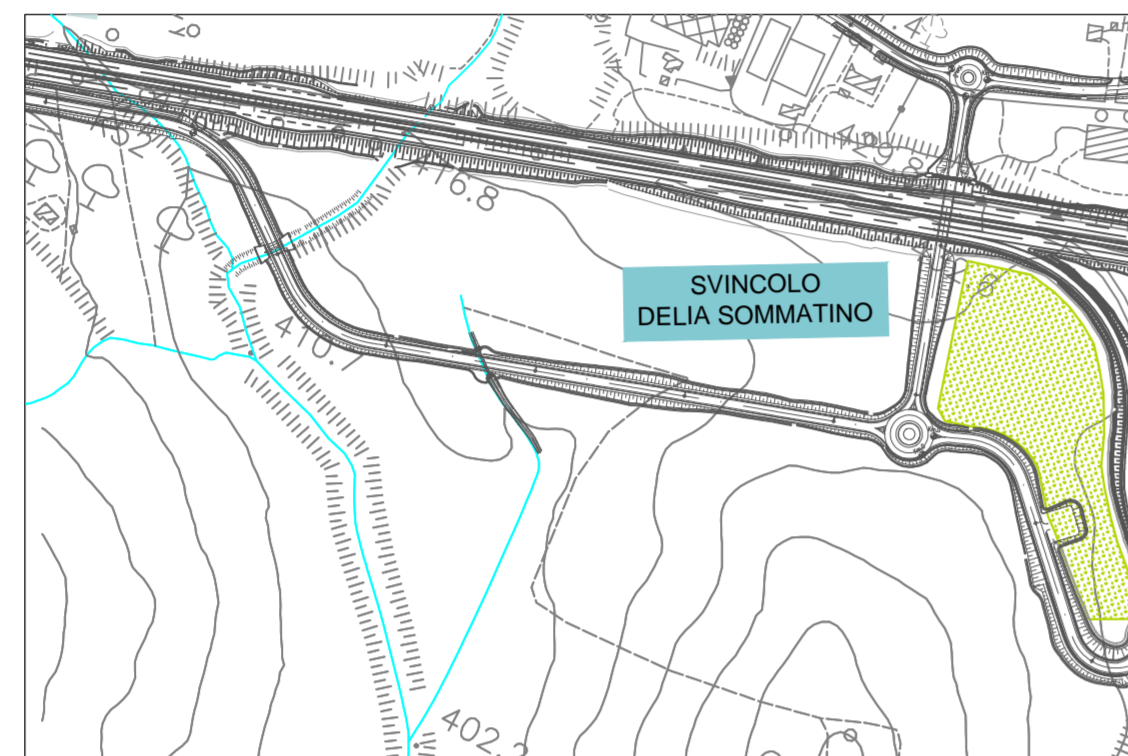


Tipo di area: Area di cantiere 2
 Localizzazione: Svincolo Delia-Sommatino
 Area: 14600 mq
 INTERVENTO:
 Scotico: 4380 mc

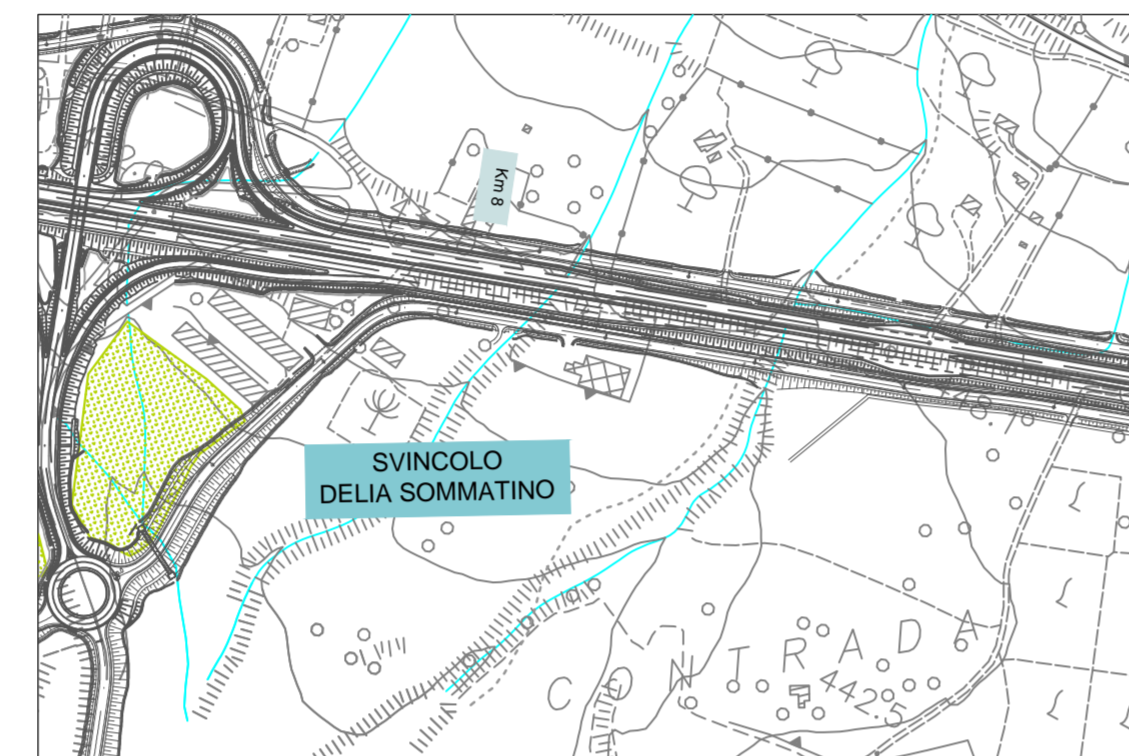


Tipo di area: Area di deposito
 Localizzazione: Area di Svincolo Delia-Sommatino
 Area: 10050 mq
 INTERVENTO:
 Scotico area esclusa dagli altri interventi a verde: 2187 mc
 Rinterro con terre di coltura: 2187 mc

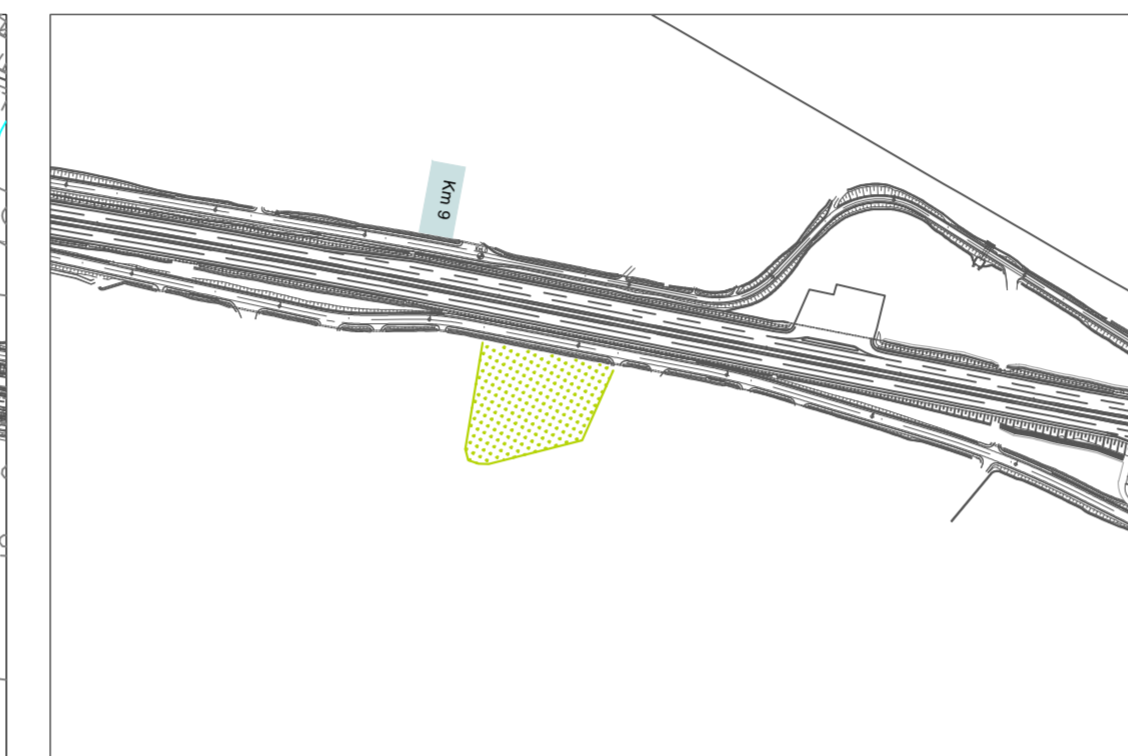


Tipo di area: Area di deposito temporaneo
 Localizzazione: Caltanissetta - km 9+100
 Area: 5400 mq
 INTERVENTO:
 Scotico area esclusa dagli altri interventi a verde: 1400 mc
 Rinterro con terre di coltura: 1400 mc

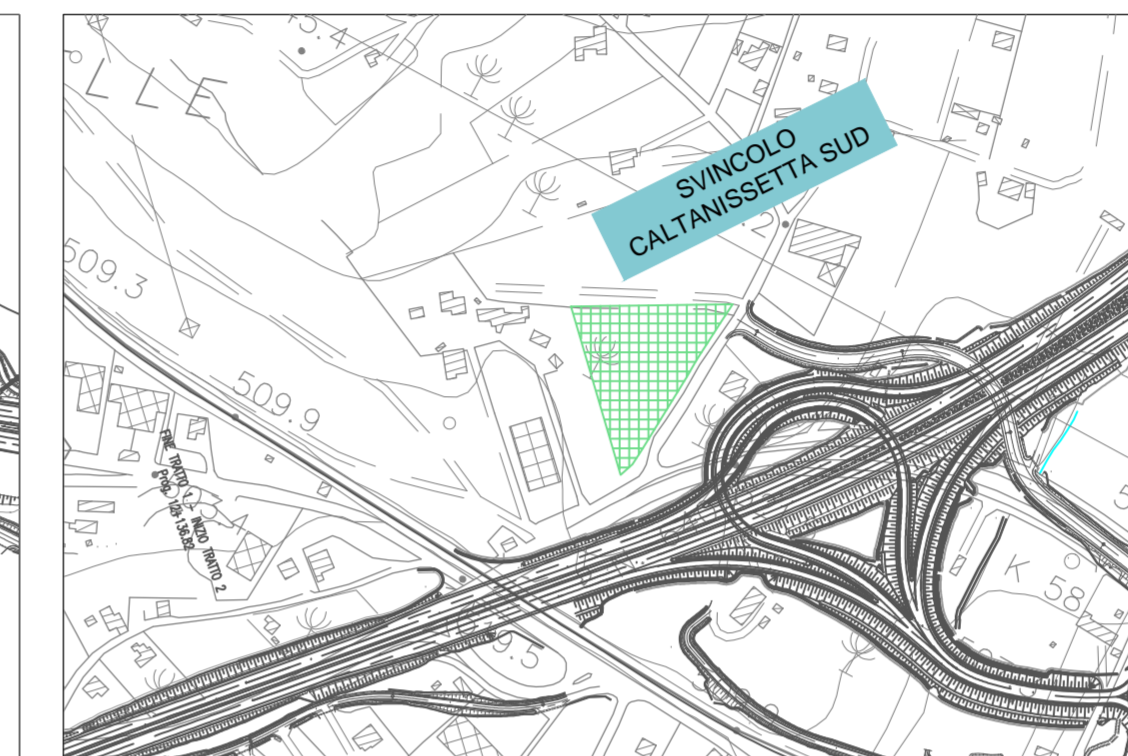


Tipo di area: Area di cantiere 3 Operativa/logistica
 Localizzazione: Area di Svincolo Caltanissetta Sud
 Area: 6100 mq
 INTERVENTO:
 Espianto alberelli esistenti con zolla di terra
 Scotico (fine lavori): 1830 mc
 Rinterro con terre di coltura: 1830 mc
 Reimpianto ulivi precedentemente espianati

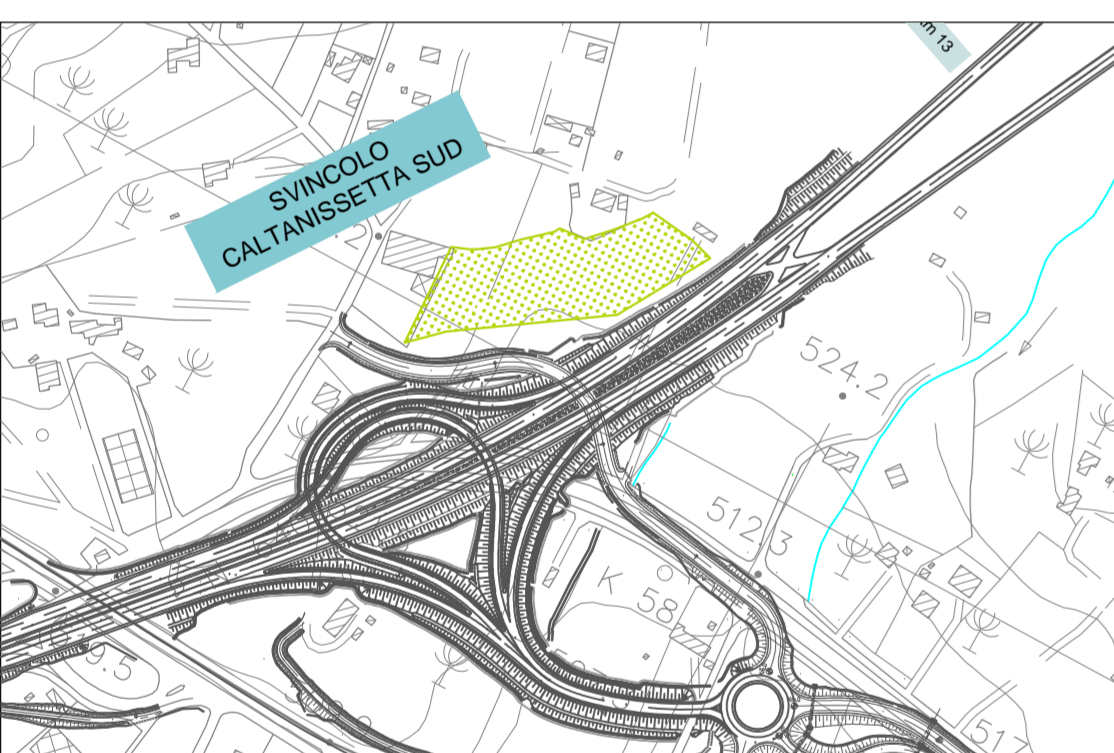


Tipo di area: Area di deposito temporaneo
 Localizzazione: Area di Svincolo Caltanissetta Sud
 Ubicazione: Km 12+700
 Area: 10000 mq
 INTERVENTO:
 Scotico: 3570 mc
 Rinterro con terre di coltura: 3570 mc

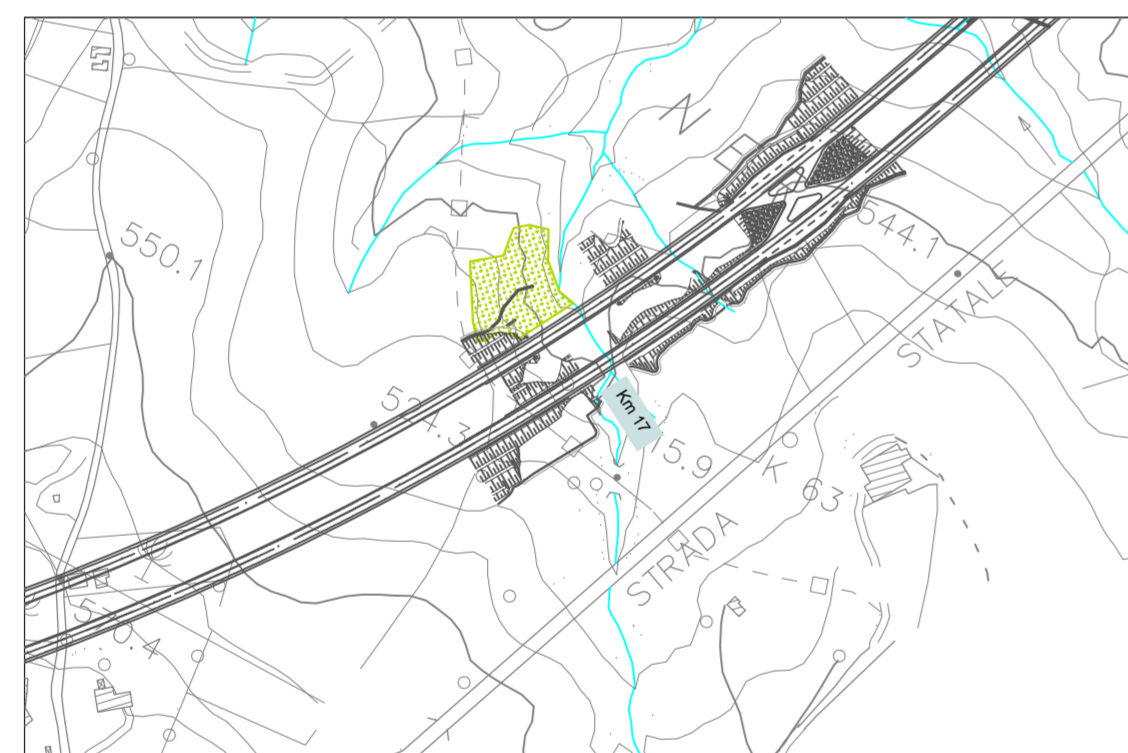


Tipo di area: Area di deposito temporaneo
 Localizzazione: Comune di Caltanissetta
 Area: 3300 mq
 INTERVENTO:
 Scotico: 990 mc
 Rinterro con terre di coltura: 990 mc

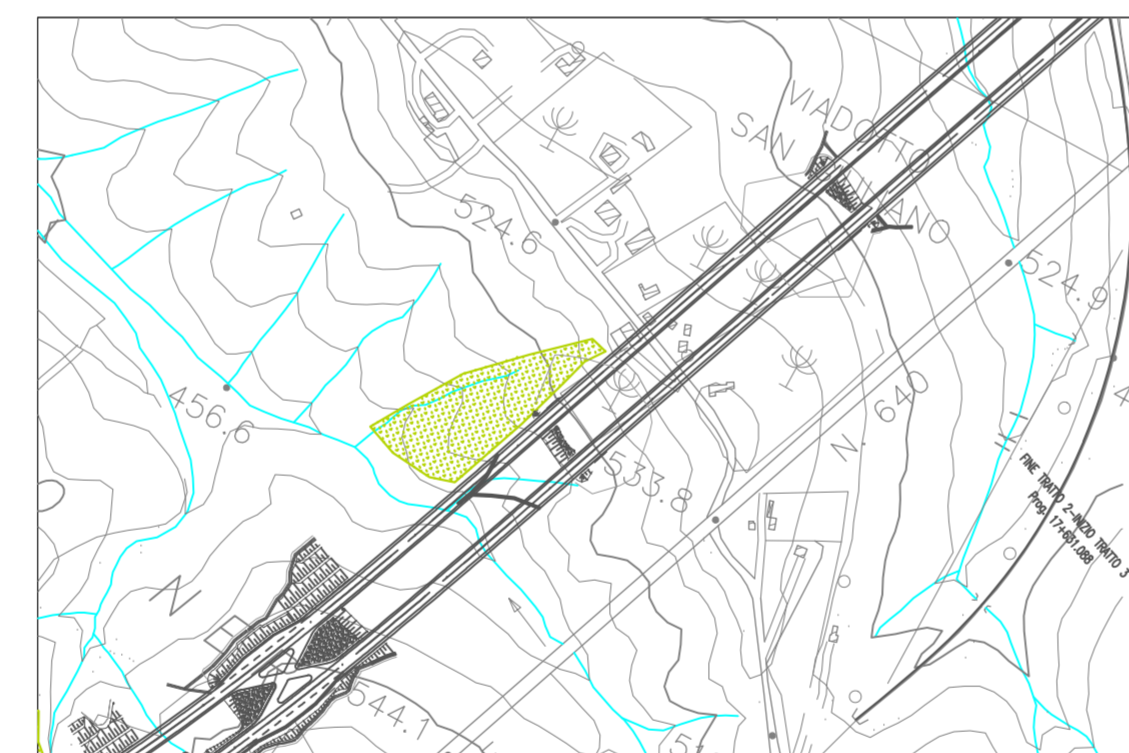


Tipo di area: Area di deposito temporaneo
 Localizzazione: Comune di Caltanissetta
 Area: 6100 mq
 INTERVENTO:
 Scotico: 1830 mc
 Rinterro con terre di coltura: 1830 mc

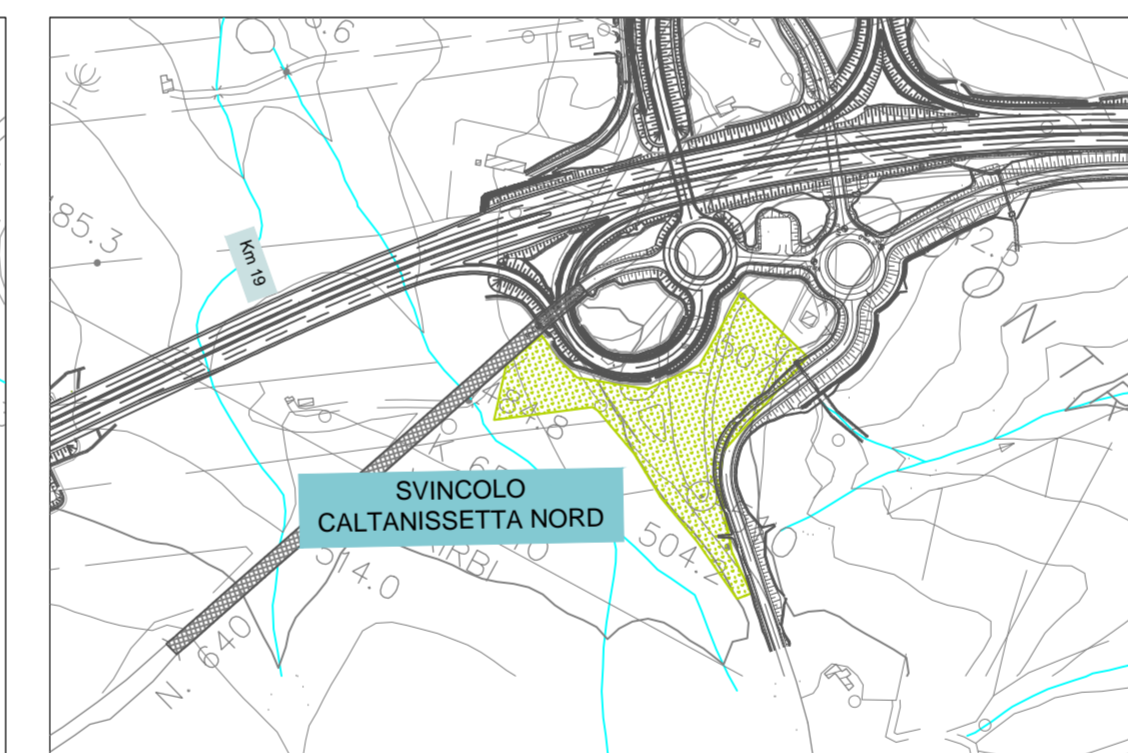


Tipo di area: Area di deposito temporaneo
 Localizzazione: Comune di Caltanissetta
 Area: 12198 mq
 INTERVENTO:
 Scotico area esclusa dagli altri interventi a verde: 2708 mc
 Rinterro con terre di coltura: 2708 mc

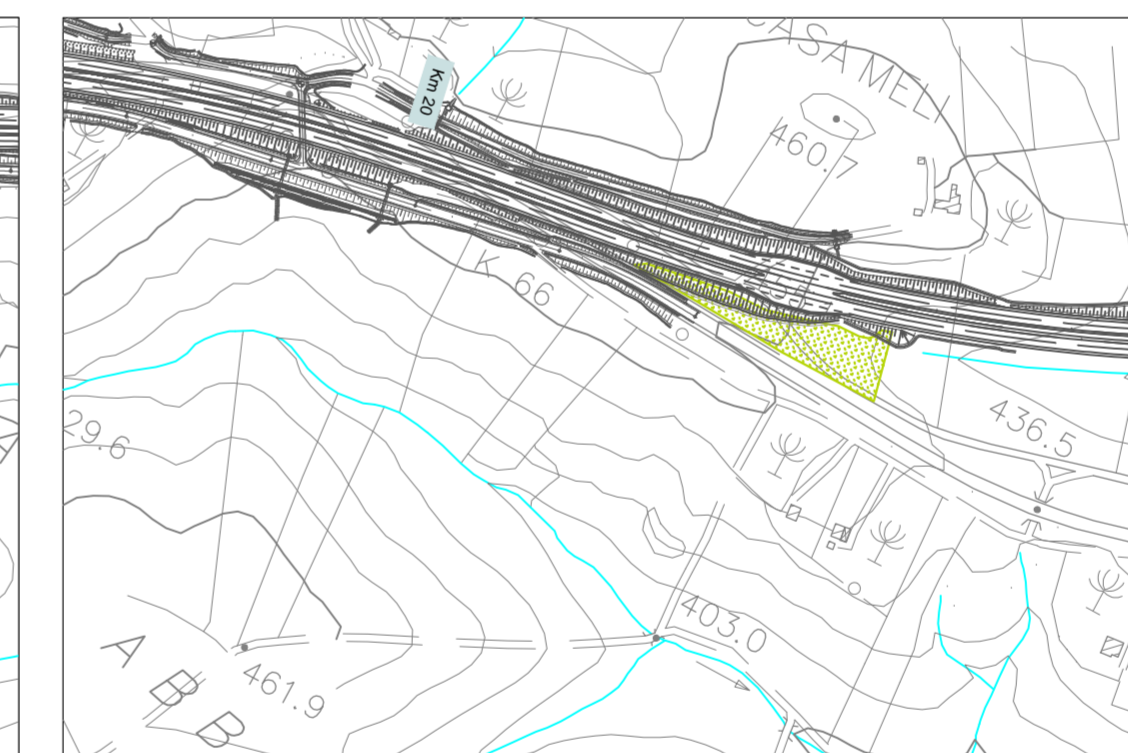


Tipo di area: Area di deposito temporaneo
 Localizzazione: Comune di Caltanissetta
 Area: 3770 mq
 INTERVENTO:
 Scotico area esclusa dagli altri interventi a verde: 905 mc
 Rinterro con terre di coltura: 905 mc

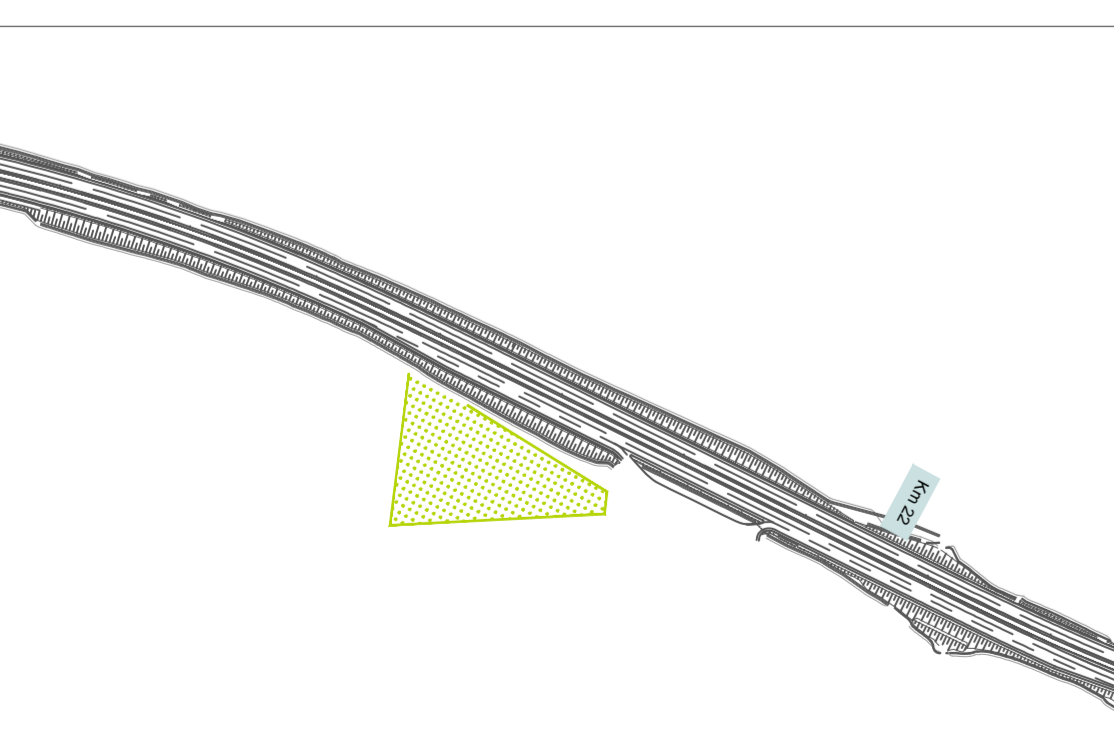


Tipo di area: Area di deposito temporaneo
 Localizzazione: Comune di Caltanissetta - Km 21+750
 Area: 8500 mq
 INTERVENTO:
 Scotico area esclusa dagli altri interventi a verde: 2708 mc
 Rinterro con terre di coltura: 2708 mc

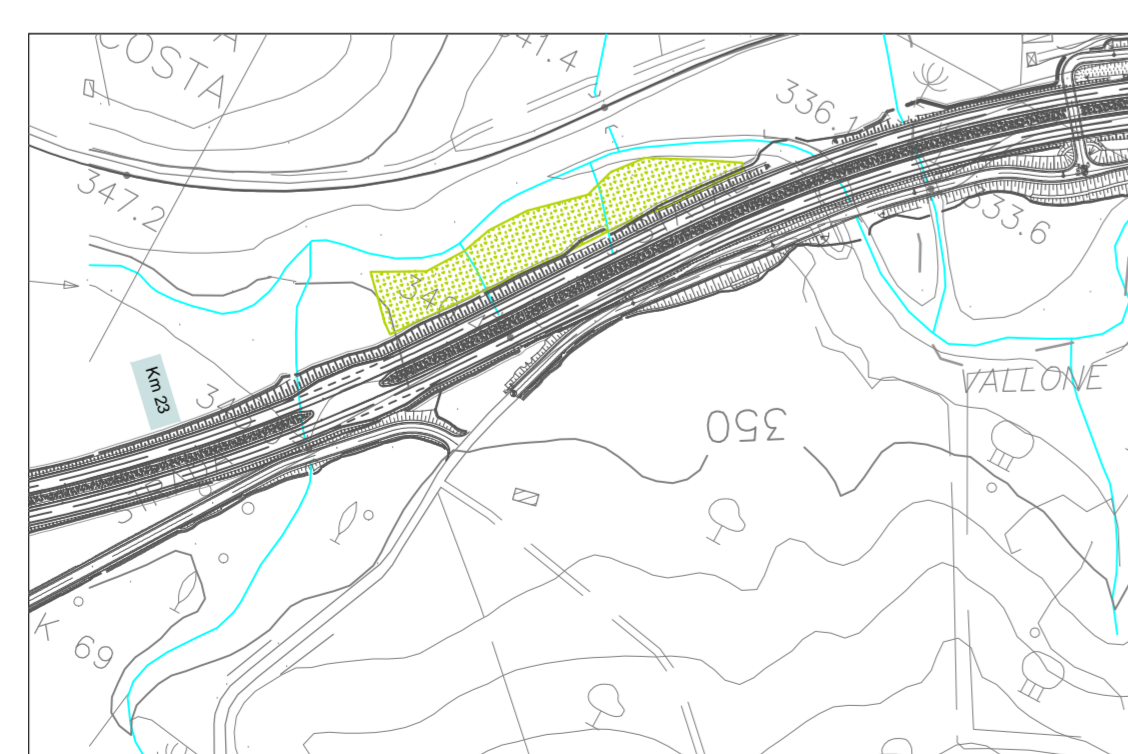


Tipo di area: Area di deposito temporaneo
 Localizzazione: Comune di Caltanissetta
 Area: 7717 mq
 INTERVENTO:
 Scotico area esclusa dagli altri interventi a verde: 1929 mc
 Rinterro con terre di coltura: 1929 mc

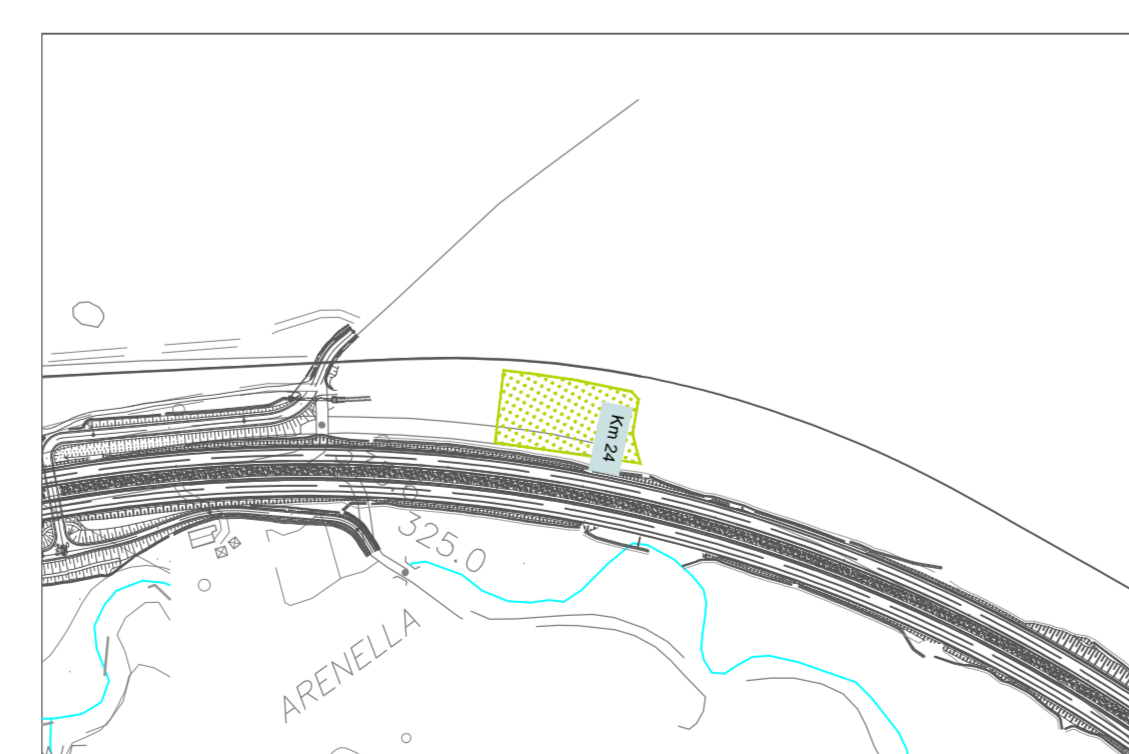

Tipo di area: Area di deposito temporaneo
 Localizzazione: Comune di Caltanissetta - Km 23+980
 Area: 4500 mq
 INTERVENTO:
 Scotico: 2000 mc
 Rinterro con terre di coltura: 2000 mc

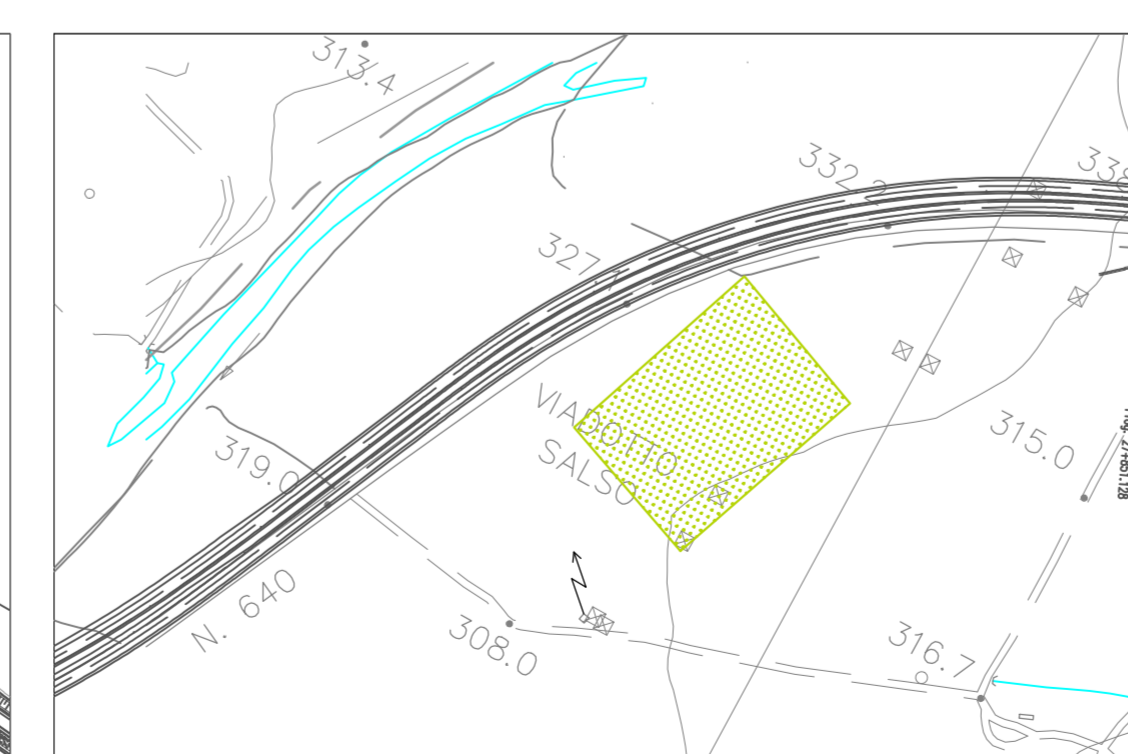

Tipo di area: Area di cantiere Raccomandazione T
 Localizzazione: Comune di Villaroza
 Area: 16220 mq
 INTERVENTO:
 Scotico: 4860 mc
 Rinterro con terre di coltura: 4860 mc

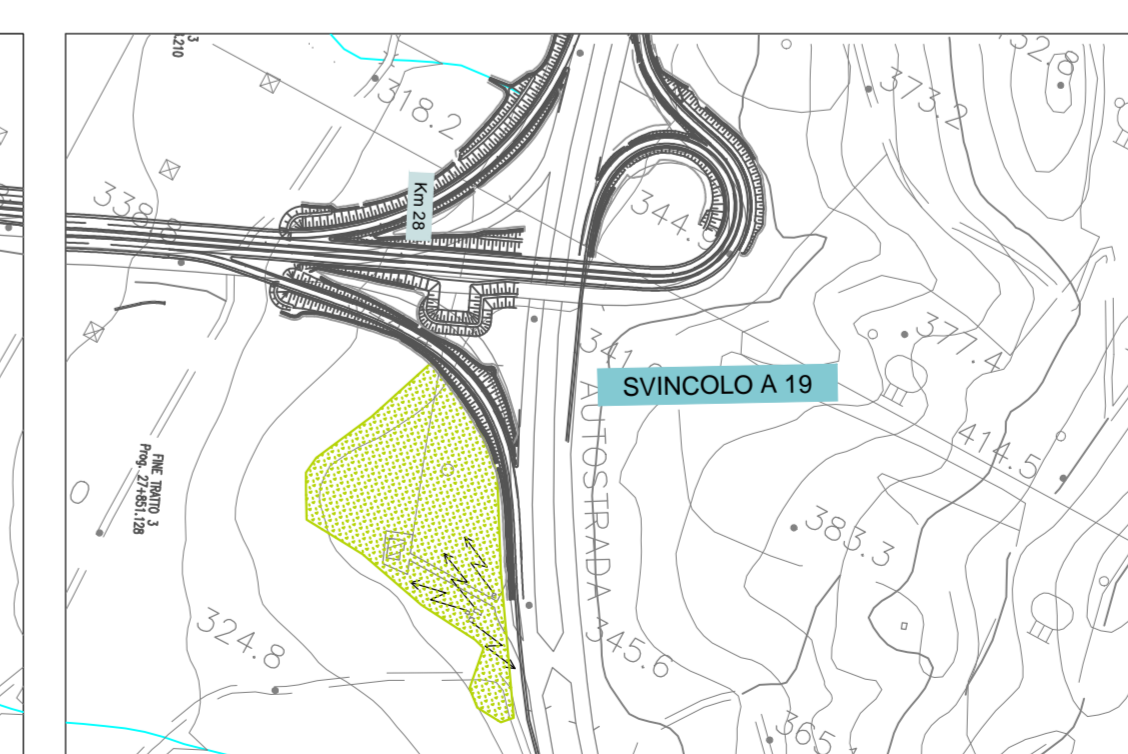

Tipo di area: Area di deposito temporaneo
 Localizzazione: Comune di Villaroza
 Area: 15800mq
 INTERVENTO:
 Scotico: 4740 mc
 Rinterro con terre di coltura: 4740 mc

INERBIMENTO CON IDROSEMINA/SEMINA A SPAGLIO

L'intervento è previsto su tutte le superfici utilizzate per aree di cantiere e di deposito (idrosemina per pendenze superiori al 66%)

Composizione miscuglio per inerbimento:

Graminacee	%	Leguminose	%
<i>Dactylis glomerata</i>	15	<i>Onobrychis vicifolia</i>	15
<i>Festuca arundinacea</i>	15	<i>Trifolium pratense</i>	15
<i>Bromus erectus</i>	10	<i>Lotus corniculatus</i>	10
<i>Poa trivialis</i>	10		
<i>Cynodon dactylon</i>	5		
<i>Agropyron repens</i>	5		

LEGENDA

- Infrastruttura in progetto
- Interventi di ripristino previsti per le aree di cantiere di deposito temporaneo escluse dagli altri interventi a verde definiti negli elaborati 000GE2016OV01VP6011-023)
- Area in cui è previsto l'espianto degli alberelli con zolla di terreno esistenti ed il reimpianto alla fine dei lavori

ANAS S.p.A.
 DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE

PA 12/09
 CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA
 ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19
 S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"
 AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001
 Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

PROGETTO ESECUTIVO

Contraente Generale: **Empedocle 2** s.p.a.

INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO AMBIENTALE

OPERE A VERDE

Planimetria ripristino aree di cantiere e di deposito

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001

Codice Elaborato: PA12_09 - E 000GE216OV01VP8036A Scale: 1:5000

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO
B	Novembre 2011	Rif. Istruttoria prot. CDG-0141142-P del 19/10/11			M. LITI	P. PAGLINI
A	Aprile 2011	Emissione			M. LITI	P. PAGLINI

Responsabile del procedimento: Ing. MAURIZIO ARAMINI

Il Progettista: **DR. ING. GIAN LUCA MENTENI**
 Ordine degli Ingegneri di Firenze N° 4533

Il Consulente Specialista: **DR. ING. ALESSANDRO SAITTO**
 Ordine degli Ingegneri di Agrigento N° 14853

Il Geologo: **DR. GEOL. D'ANGELO MAURIZIO**
 Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia N° 1807

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto: **DR. ING. ALESSANDRO SAITTO**
 Ordine degli Ingegneri di Agrigento N° 14853

Il Direttore dei lavori: **DR. ING. REPPINO MARASIO**
 Ordine degli Ingegneri di Agrigento N° 14447
