

***Collegamento autostradale
Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo
ed opere ad esso connesse***

OA 21 giugno 2018

Lotto 1

Paesaggio - PO (2017)

Lotto 2

Amosfera - CO26

Varie: PMA

Valutazione dei risultati del monitoraggio PO

Non si ritiene sussistano osservazioni specifiche sui risultati ottenuti.

Il confronto fra le riprese fotografiche realizzate nella fase Ante Operam (2010), con foto-inserimento del tracciato, e il Post Operam (2017) evidenzia la giovane età delle mitigazioni (alberi ed arbusti).

Si rimanda alla successiva fase di monitoraggio della componente paesaggio nella fase Post Operam una valutazione della effettiva efficacia di tali opere di mitigazione a verde. Il PMA infatti prevede che per la componente Paesaggio – Indagine A, i medesimi rilievi effettuati per la fase PO1 siano ripetuti dal quarto al quinto anno dopo la conclusione dei lavori e l'entrata in esercizio della tratta e dunque entro la fine dell'anno 2019.


Ante Operam 2010 con foto-inserimento



Post Operam 2017



Valutazione dei risultati del monitoraggio CO26 (Luglio – Settembre 2017)

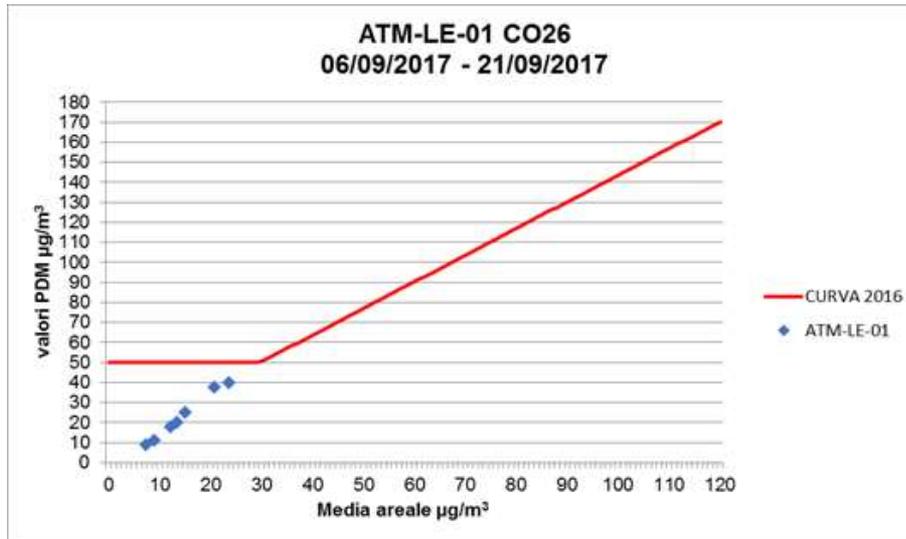

PUNTO	DATA	PM 10 PDM	PM 10 RRQA
ATM-LE-01	06/09/2017	40	25
	07/09/2017	38	22
	12/09/2017	20	14
	13/09/2017	25	16
	19/09/2017	11	10
	20/09/2017	9	8
	21/09/2017	18	13
media		23	16

Attività di cantiere: Movimentazione materiale aree di stoccaggio nel cantiere base

Nella campagna **CO26** non è stato riscontrato alcun superamento della curva.

Varie: PMA Tratte B2, C e D

Tavolo Tecnico 05-04-2018, 07-05-2018

- *Adeguamento normativo*
- *Frequenze e parametri di monitoraggio*
- *Idoneità dei punti*

Atmosfera: CO – parametri LG

Vibrazioni: da valutare a quale norma fare riferimento (UNI9614:1990 o :2017)

Rumore: AO - LG

Vegetazione: AO – parametri e frequenze

Suolo: AO – parametri e punti

Acque sotterranee: AO - parametri

Acque superficiali: AO - parametri

Sopralluogo congiunto prima dell'avvio dell'Ante Operam
