




Consorzio di Bonifica Montana del Gargano  
Viale Cristoforo Colombo n. 243  
71121 Foggia (FG)  
www.bonificadelgargano.it  
info@bonificadelgargano.it



REALIZZAZIONE DI UN ACQUEDOTTO RURALE A SERVIZIO DELLE COMUNITA' AGRICOLE PRESENTI SUL TERRITORIO MONTANO DI MONTE SANT'ANGELO (FG)

### PROGETTO DEFINITIVO


DATA: Gennaio 2021  
REV. 00  
LAYOUT CANTIERE BASE  
Tavola ES 15  
Scala: 100

REDATTO DA : Settore Tecnico - Agrario  
Consorzio di Bonifica Montana del Gargano

Il Progettista  
Geom. Claudio DESTINO

Il Responsabile del Procedimento  
(Dott. Agr. Luciano Cicirelli)

## SISTEMAZIONE AREA CANTIERE BASE NELL'AMBITO DELL'AREA DI PERTINENZA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SCALA 1:100

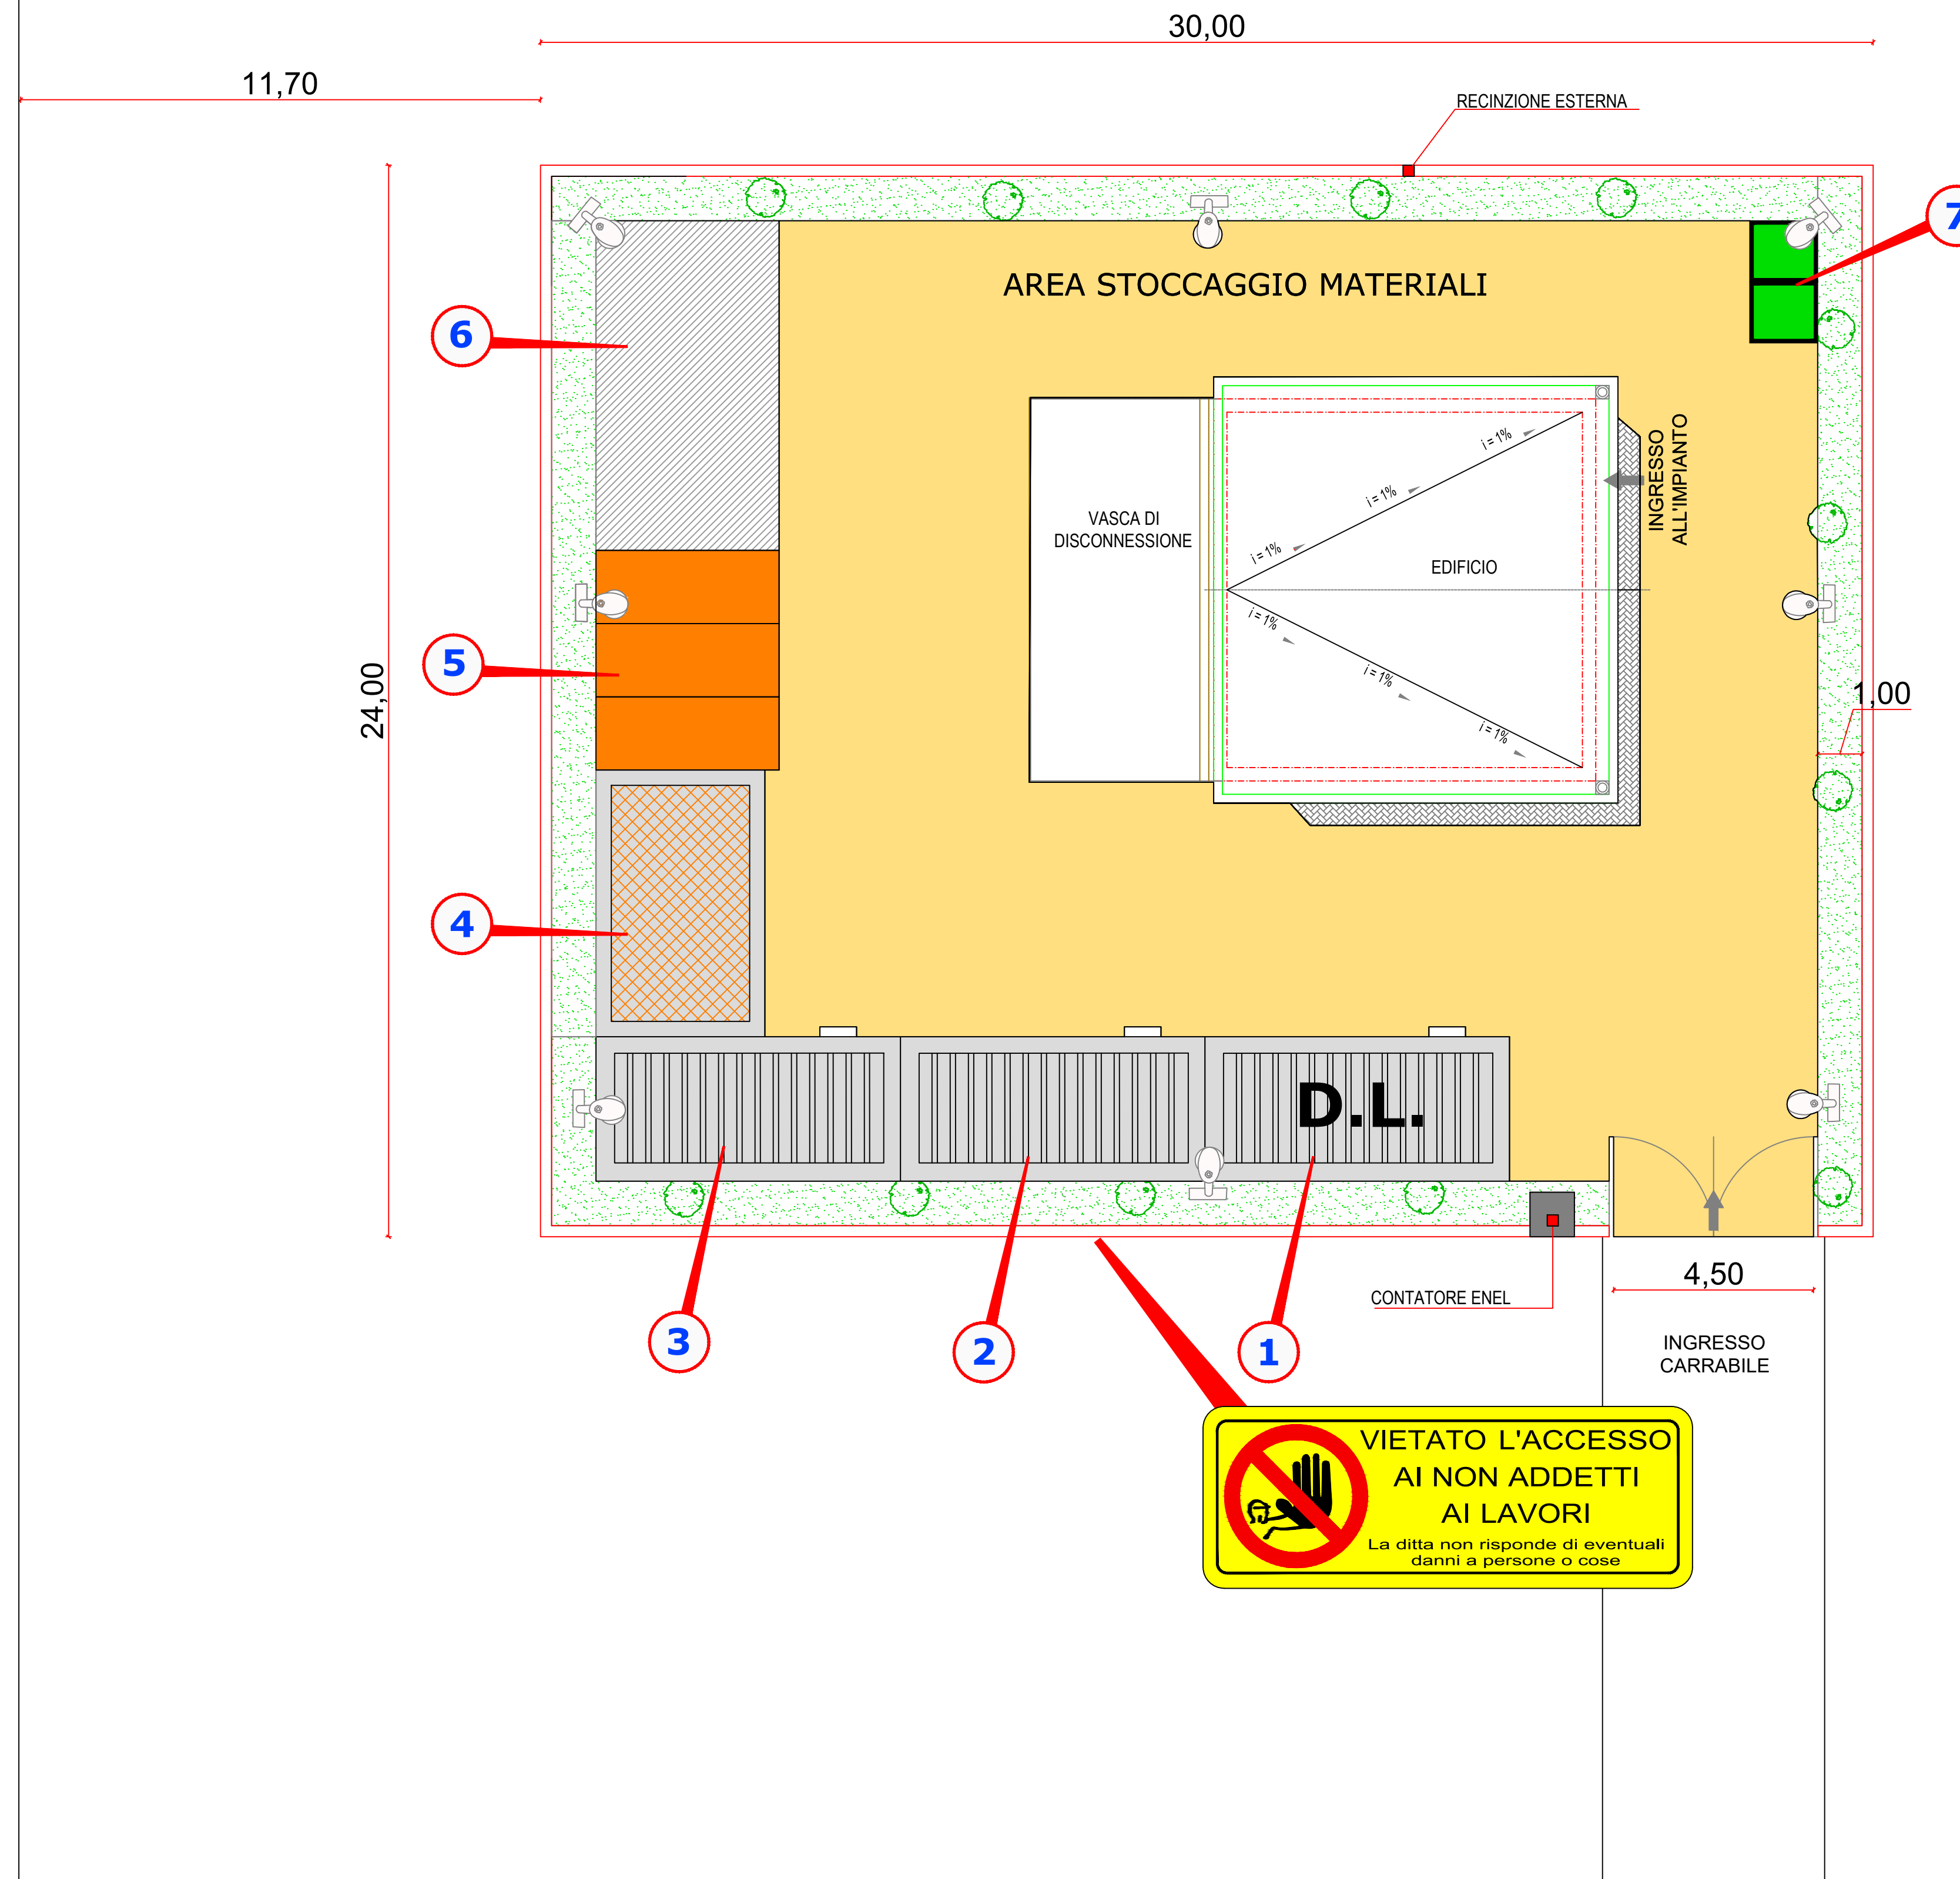

## LEGENDA

- PIAZZALE PAVIMENTATO CON MISTO STABILIZZATO
- MARCIAPIEDE
- AREA VERDE IN PROSSIMITA' DELLA RECINZIONE
- LAMPIONE

- 1** Locali ufficio cantiere e Direzione Lavori
- 2** Locale spogliatoio
- 3** Locale mensa
- 4** Locale deposito attrezzi
- 5** Tettoia ricovero automezzi
- 6** Area lavaggio automezzi
- 7** Servizi igienici

## CARTELLONISTICA DI CANTIERE

### (1) ACCESSO AL CANTIERE

In prossimità dell'accesso al cantiere deve essere posto, unitamente alla tabella informativa, un cartello riportante le norme di sicurezza da adottare sul cantiere.



### (2) ACCESSO AL CANTIERE

In prossimità dell'accesso al cantiere, in modo ben visibile dalla strada, deve essere posto un cartello di pericolo che avverte gli automobilisti della possibilità di transito di veicoli in entrata e uscita dal cantiere.



### (3) UFFICIO DI CANTIERE

In prossimità, o all'interno di tale ufficio, deve essere posto un cartello riportante gli interventi di pronto soccorso ed una tabella con i numeri di soccorso.



### (4) MACCHINE IN MOVIMENTO

Le aree dove vi sono macchine in movimento vanno delimitate con nastro bianco-rosso e vanno posti i seguenti cartelli.



### (5) BANCHI DI LAVORAZIONE

In prossimità dei banchi di lavorazione vanno apposti i seguenti cartelli.



### (6) PERICOLO DI FOLGORAZIONE

In prossimità del punto di allacciamento e di ogni altro luogo dove esista il pericolo di contatto con dei cavi elettrici va posto il seguente cartello.



### (7) ESTINTORE PORTATILE

La posizione degli estintori portatili va segnalata col seguente cartello.



### (8) OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

E' opportuno stabilire delle norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei carichi utilizzando mezzi meccanici ausiliari per carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti. I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa. Durante le manovre in retromarcia i mezzi devono essere assistiti da personale a terra.

Le operazioni di carico e scarico saranno effettuate in zone delimitate e segnalate. E' opportuno mantenere idonee distanze di sicurezza in cui dovrà accedere solo il personale interessato alle operazioni.
