
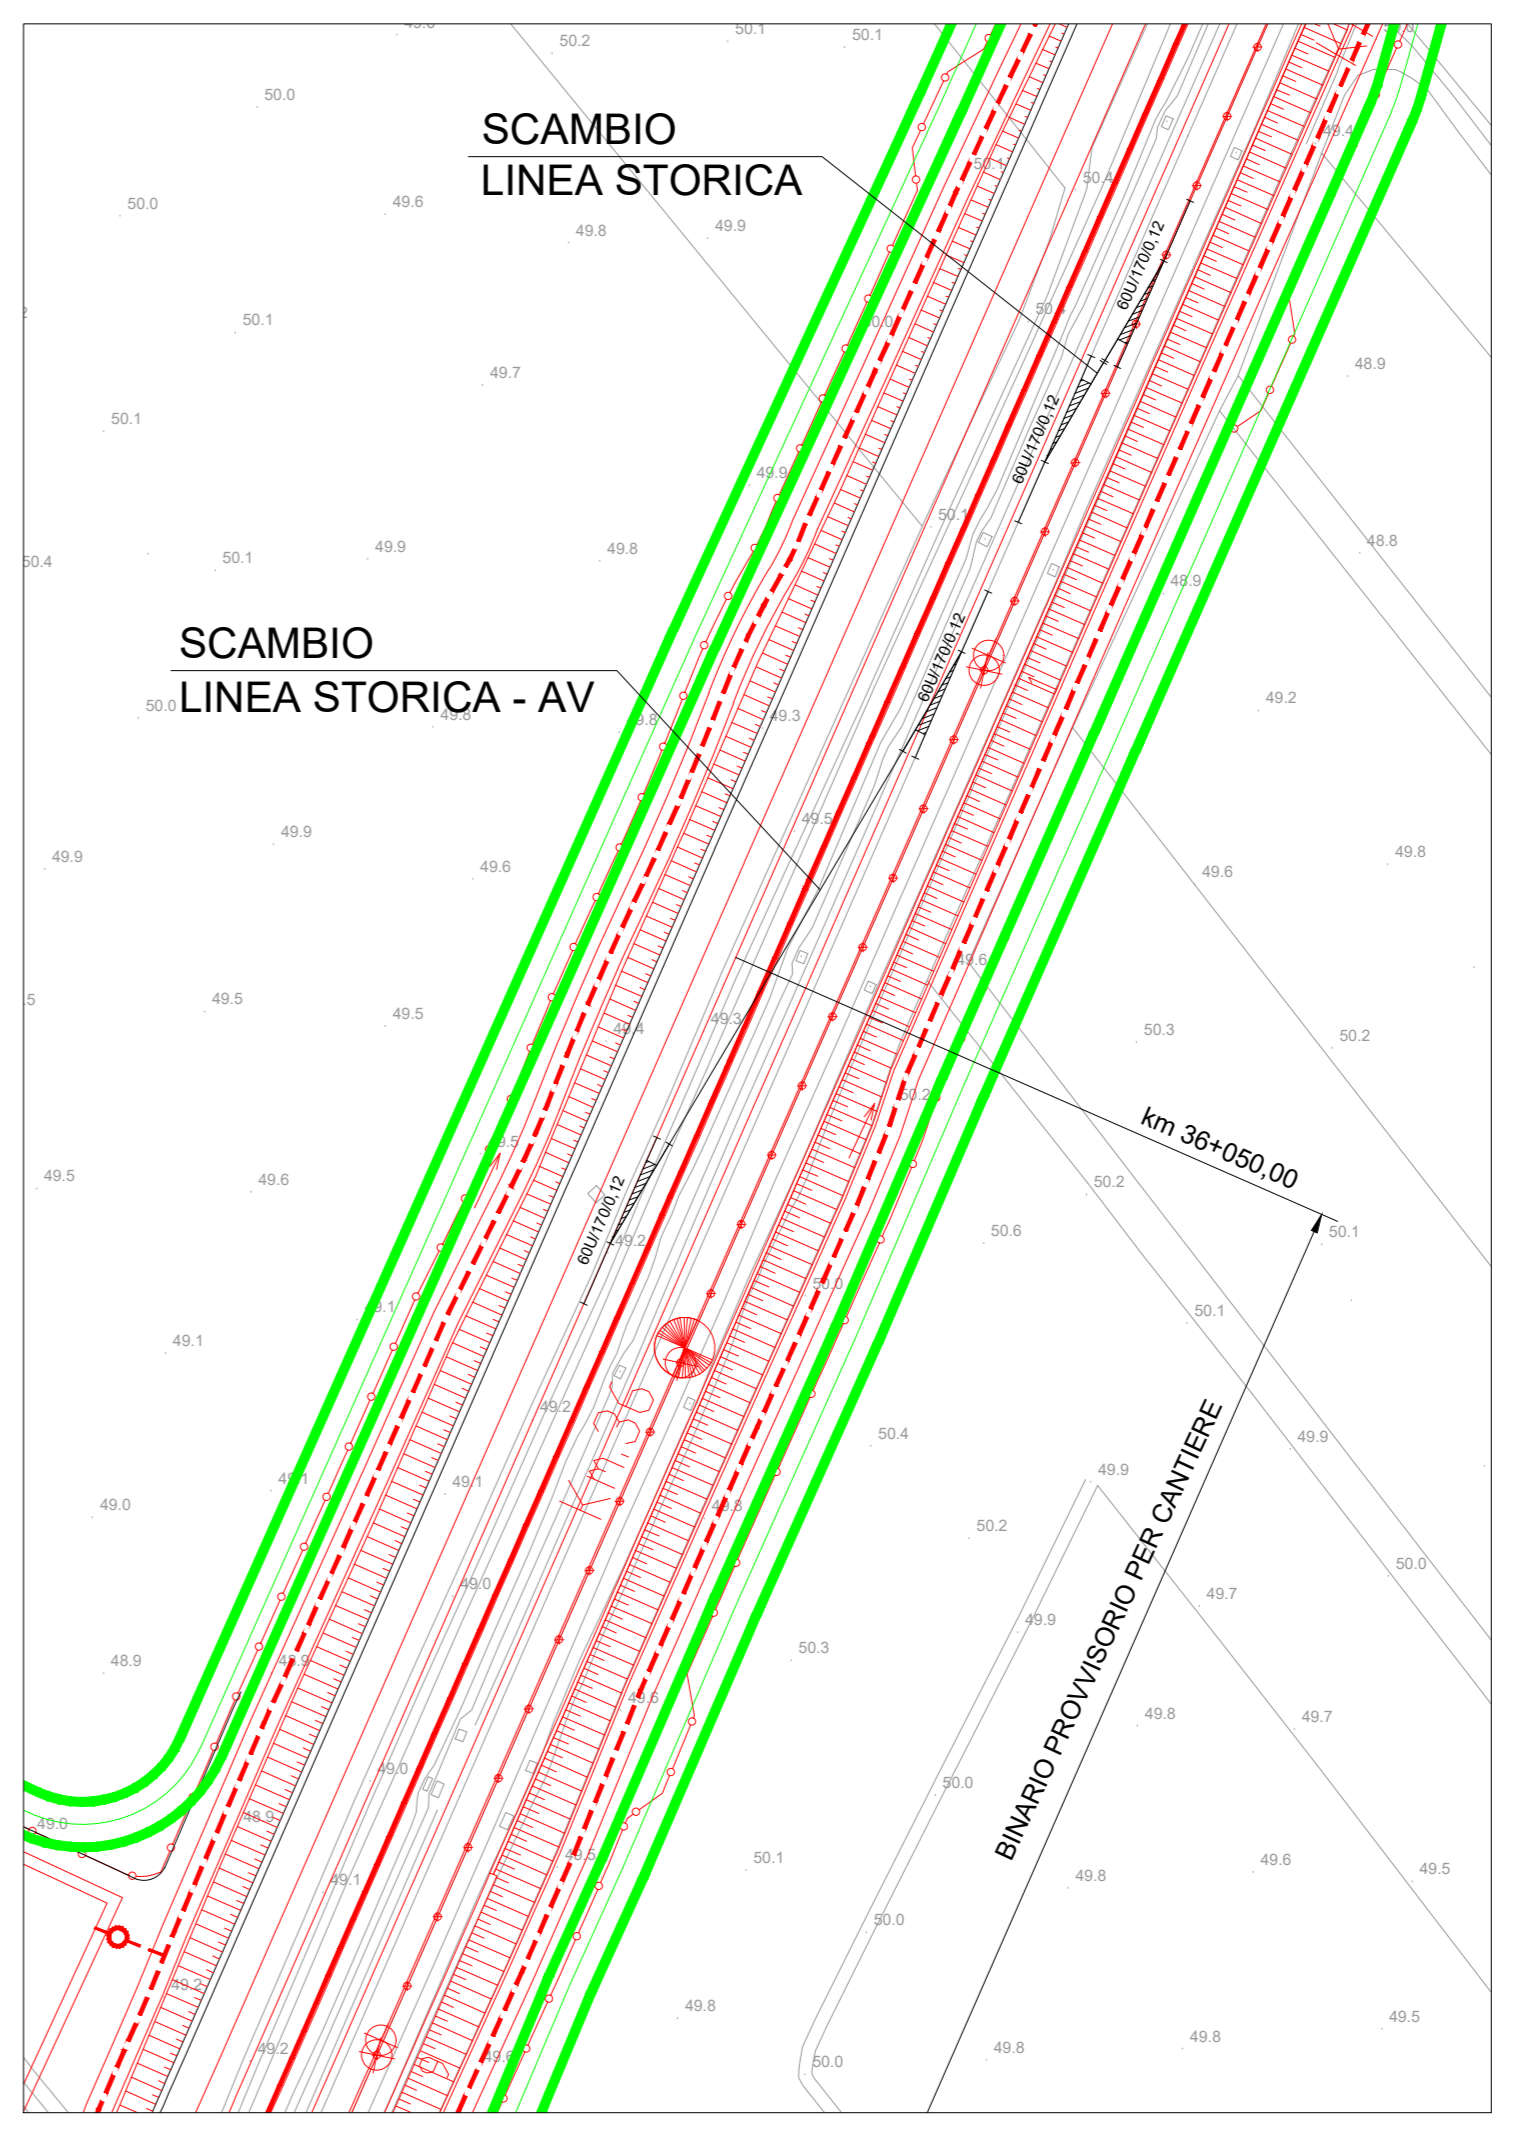
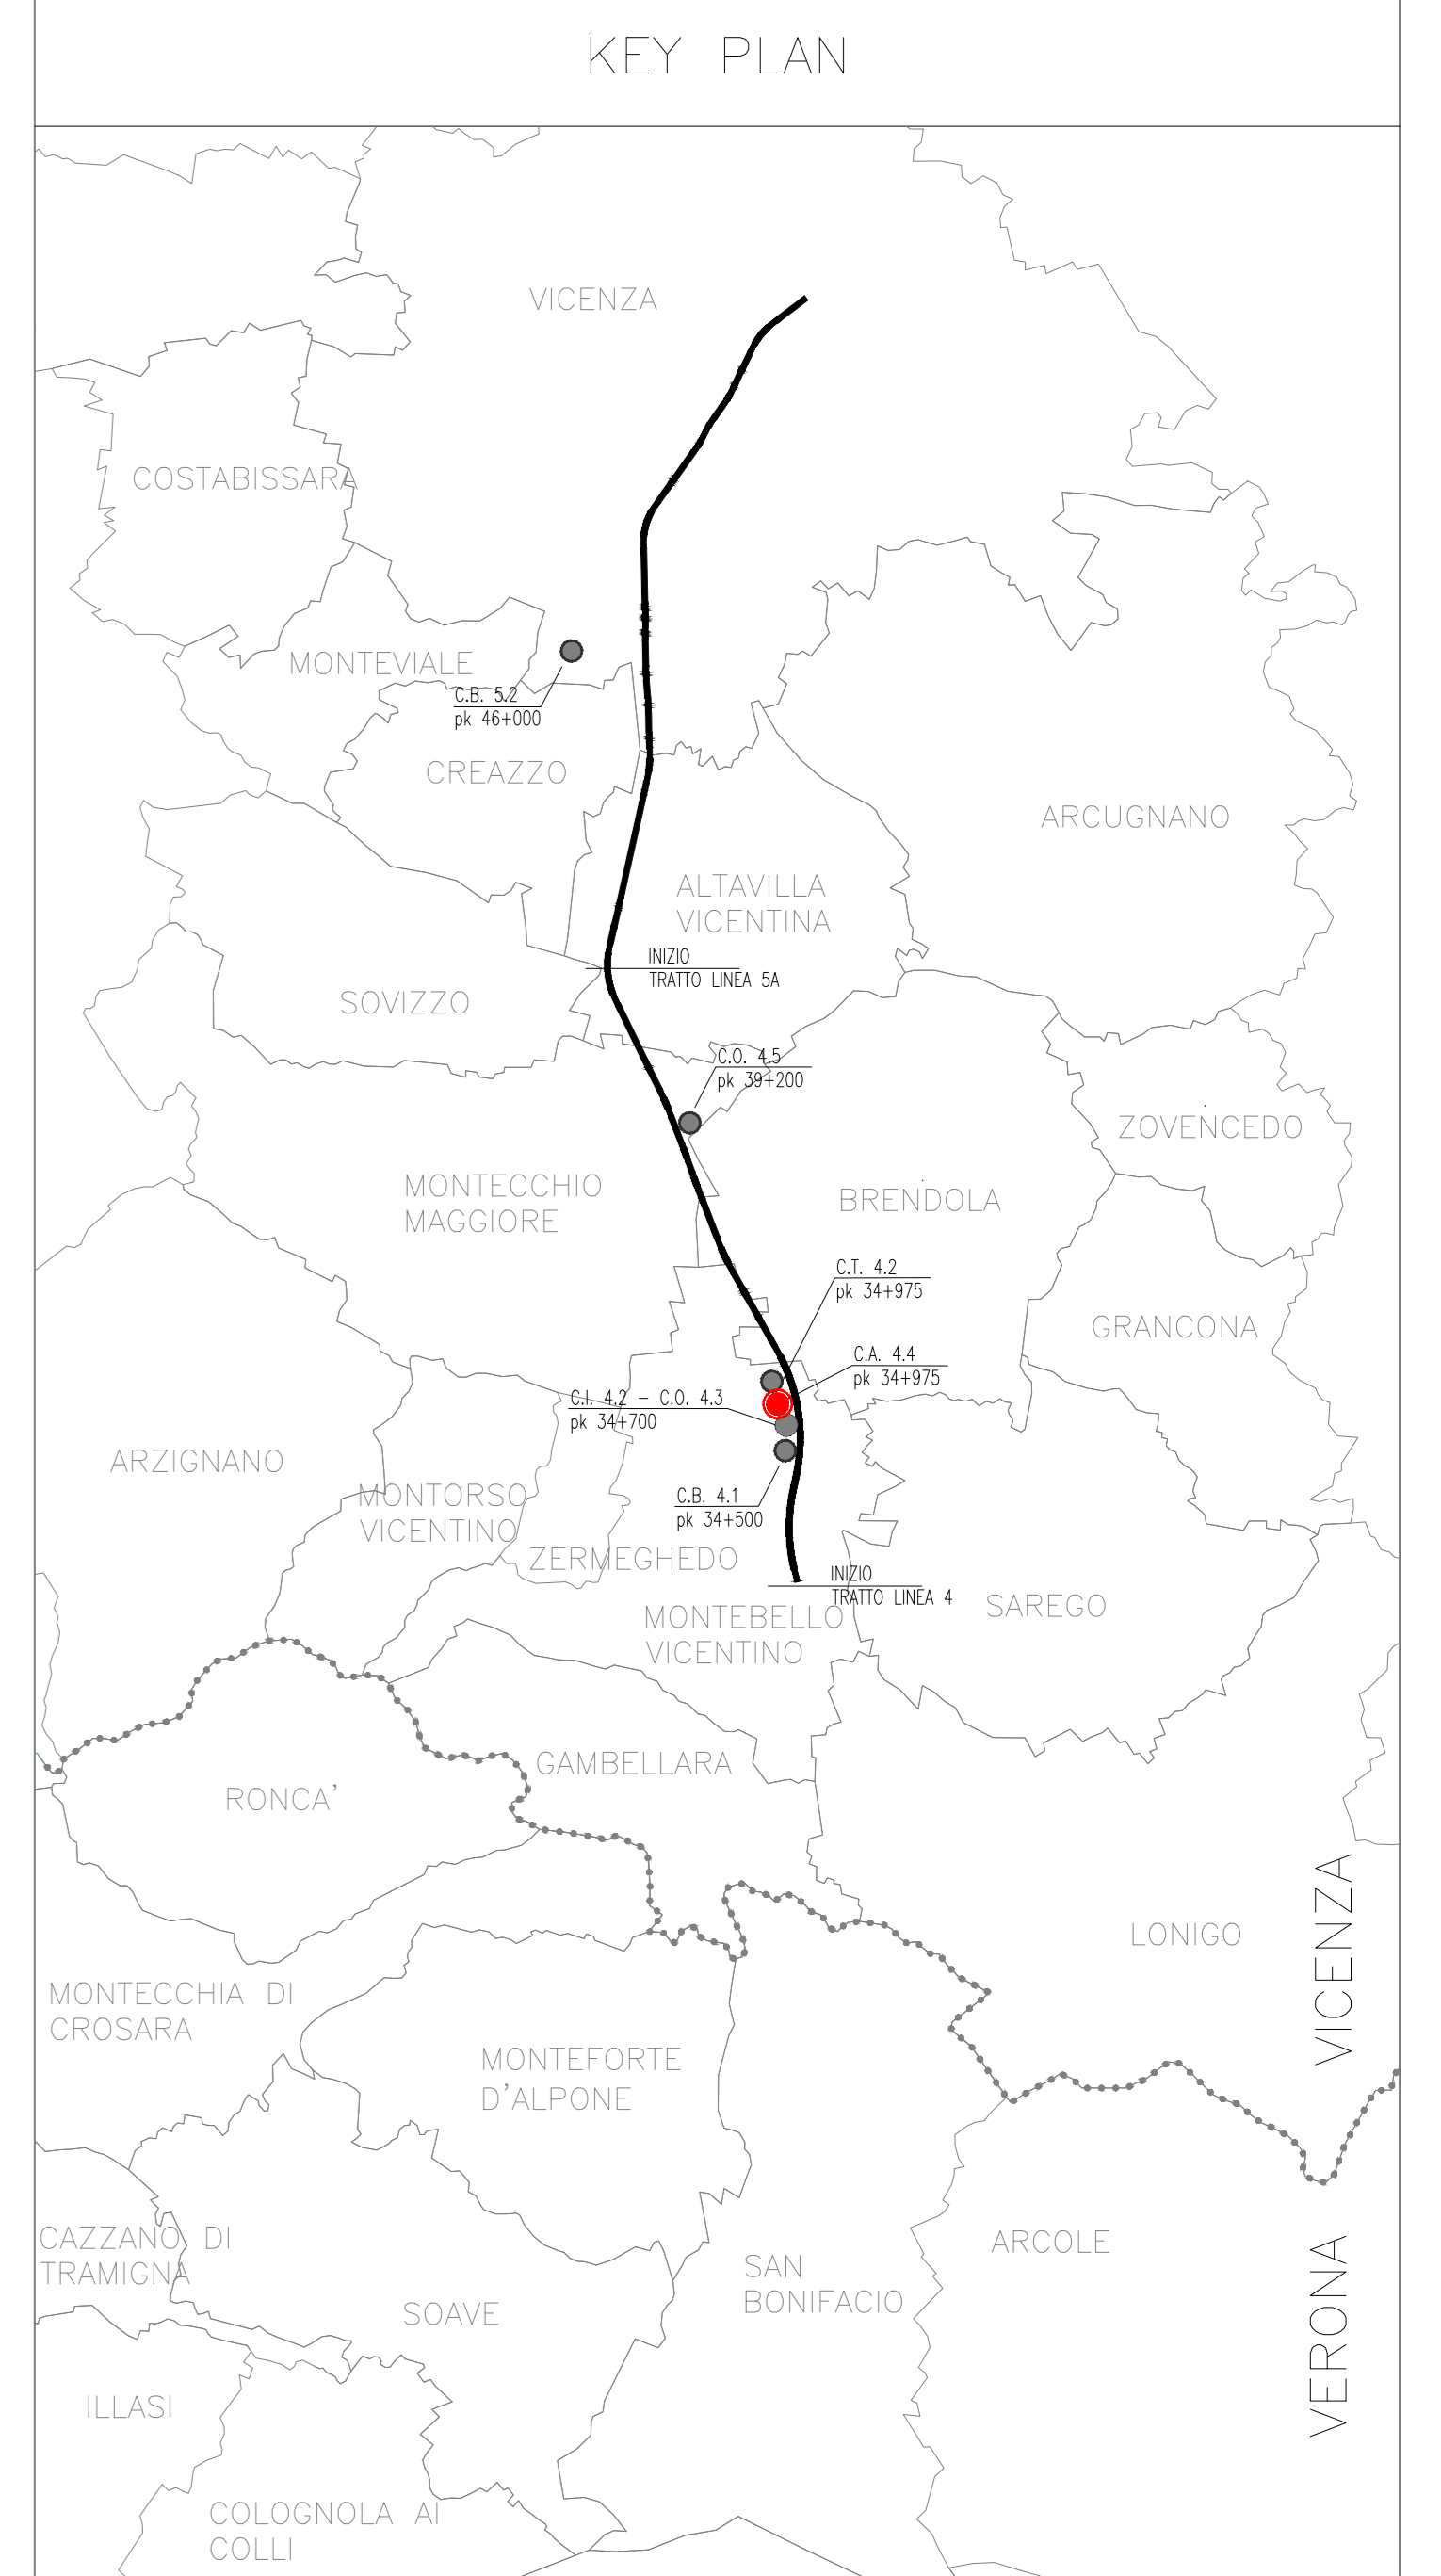


CANTIERE ARMAMENTO GUA' (C.A. 4.4) WBS CAA2		PROGRESSIVA	PK 34+975
TRATTO DI LINEA 4 (32+525 - 44+250)		SUPERFICIE	99.470,00 mq
ALLOGGI PERSONALE E SERVIZI			
5.1	Impress/DL	25,00 mq	
SERVIZI GENERALI			
1	Guardiola	13,75 mq	8 Parcheggio mezzi di cantiere 11 posti
2	Parcheggio personale/visitatori	6 posti	
	Area Piazzali e Strade asfaltate	26.747,00 mq	Area a Verde 0,00 mq
	Area Marciopiede	334,00 mq	Area Duna 5012,00 mq
	Piazzali in misto cementato 30cm e misto stabilizzato 20cm	15.574,00 mq	
SERVIZI AGLI IMPIANTI			
11	Lavaggio ruote		15 Ufficio 522,65 mq
12	Area pesa		16 Magazzino 281,95 mq
AREA STOCCAGGIO E IMPIANTI			
21	Area riservata al trasporto binari	6.692,00 mq	23 Area riservata al deposito traverse 6.382,00 mq
22	Area riservata al deposito mezzi	5.990,00 mq	24 Area riservata al deposito ballast 18.884,00 mq
9	Area deposito materiali di scotto	3.020,00 mq	

LEGENDA	
Strada Asfaltata	Entrata/Uscita Cantiere
Marciopiedi	Percorso Carriabile
Area verde	Percorso Mezzi
Duna	Percorso Pedonale
Area riservata al trasporto binari	Quota Progetto
Area riservata al deposito mezzi	Quota Terreno
Area riservata al deposito traverse	Entrata/Uscita Mezzi di Cantiere
Area riservata al deposito ballast	Entrata/Uscita Personale
	Rete Gas esistente
	Tracciato di progetto ad opere connesse
	Pista accesso cantiere
	Nuovo pista di cantiere longitudinale (temporanea)
	Allargamento visibilità locale esistente
	Nuovo pista di cantiere longitudinale

NOTA: l'eccesso di scotto sarà depositato c/o il campo base CB 4.1 nell'area appositamente predisposta

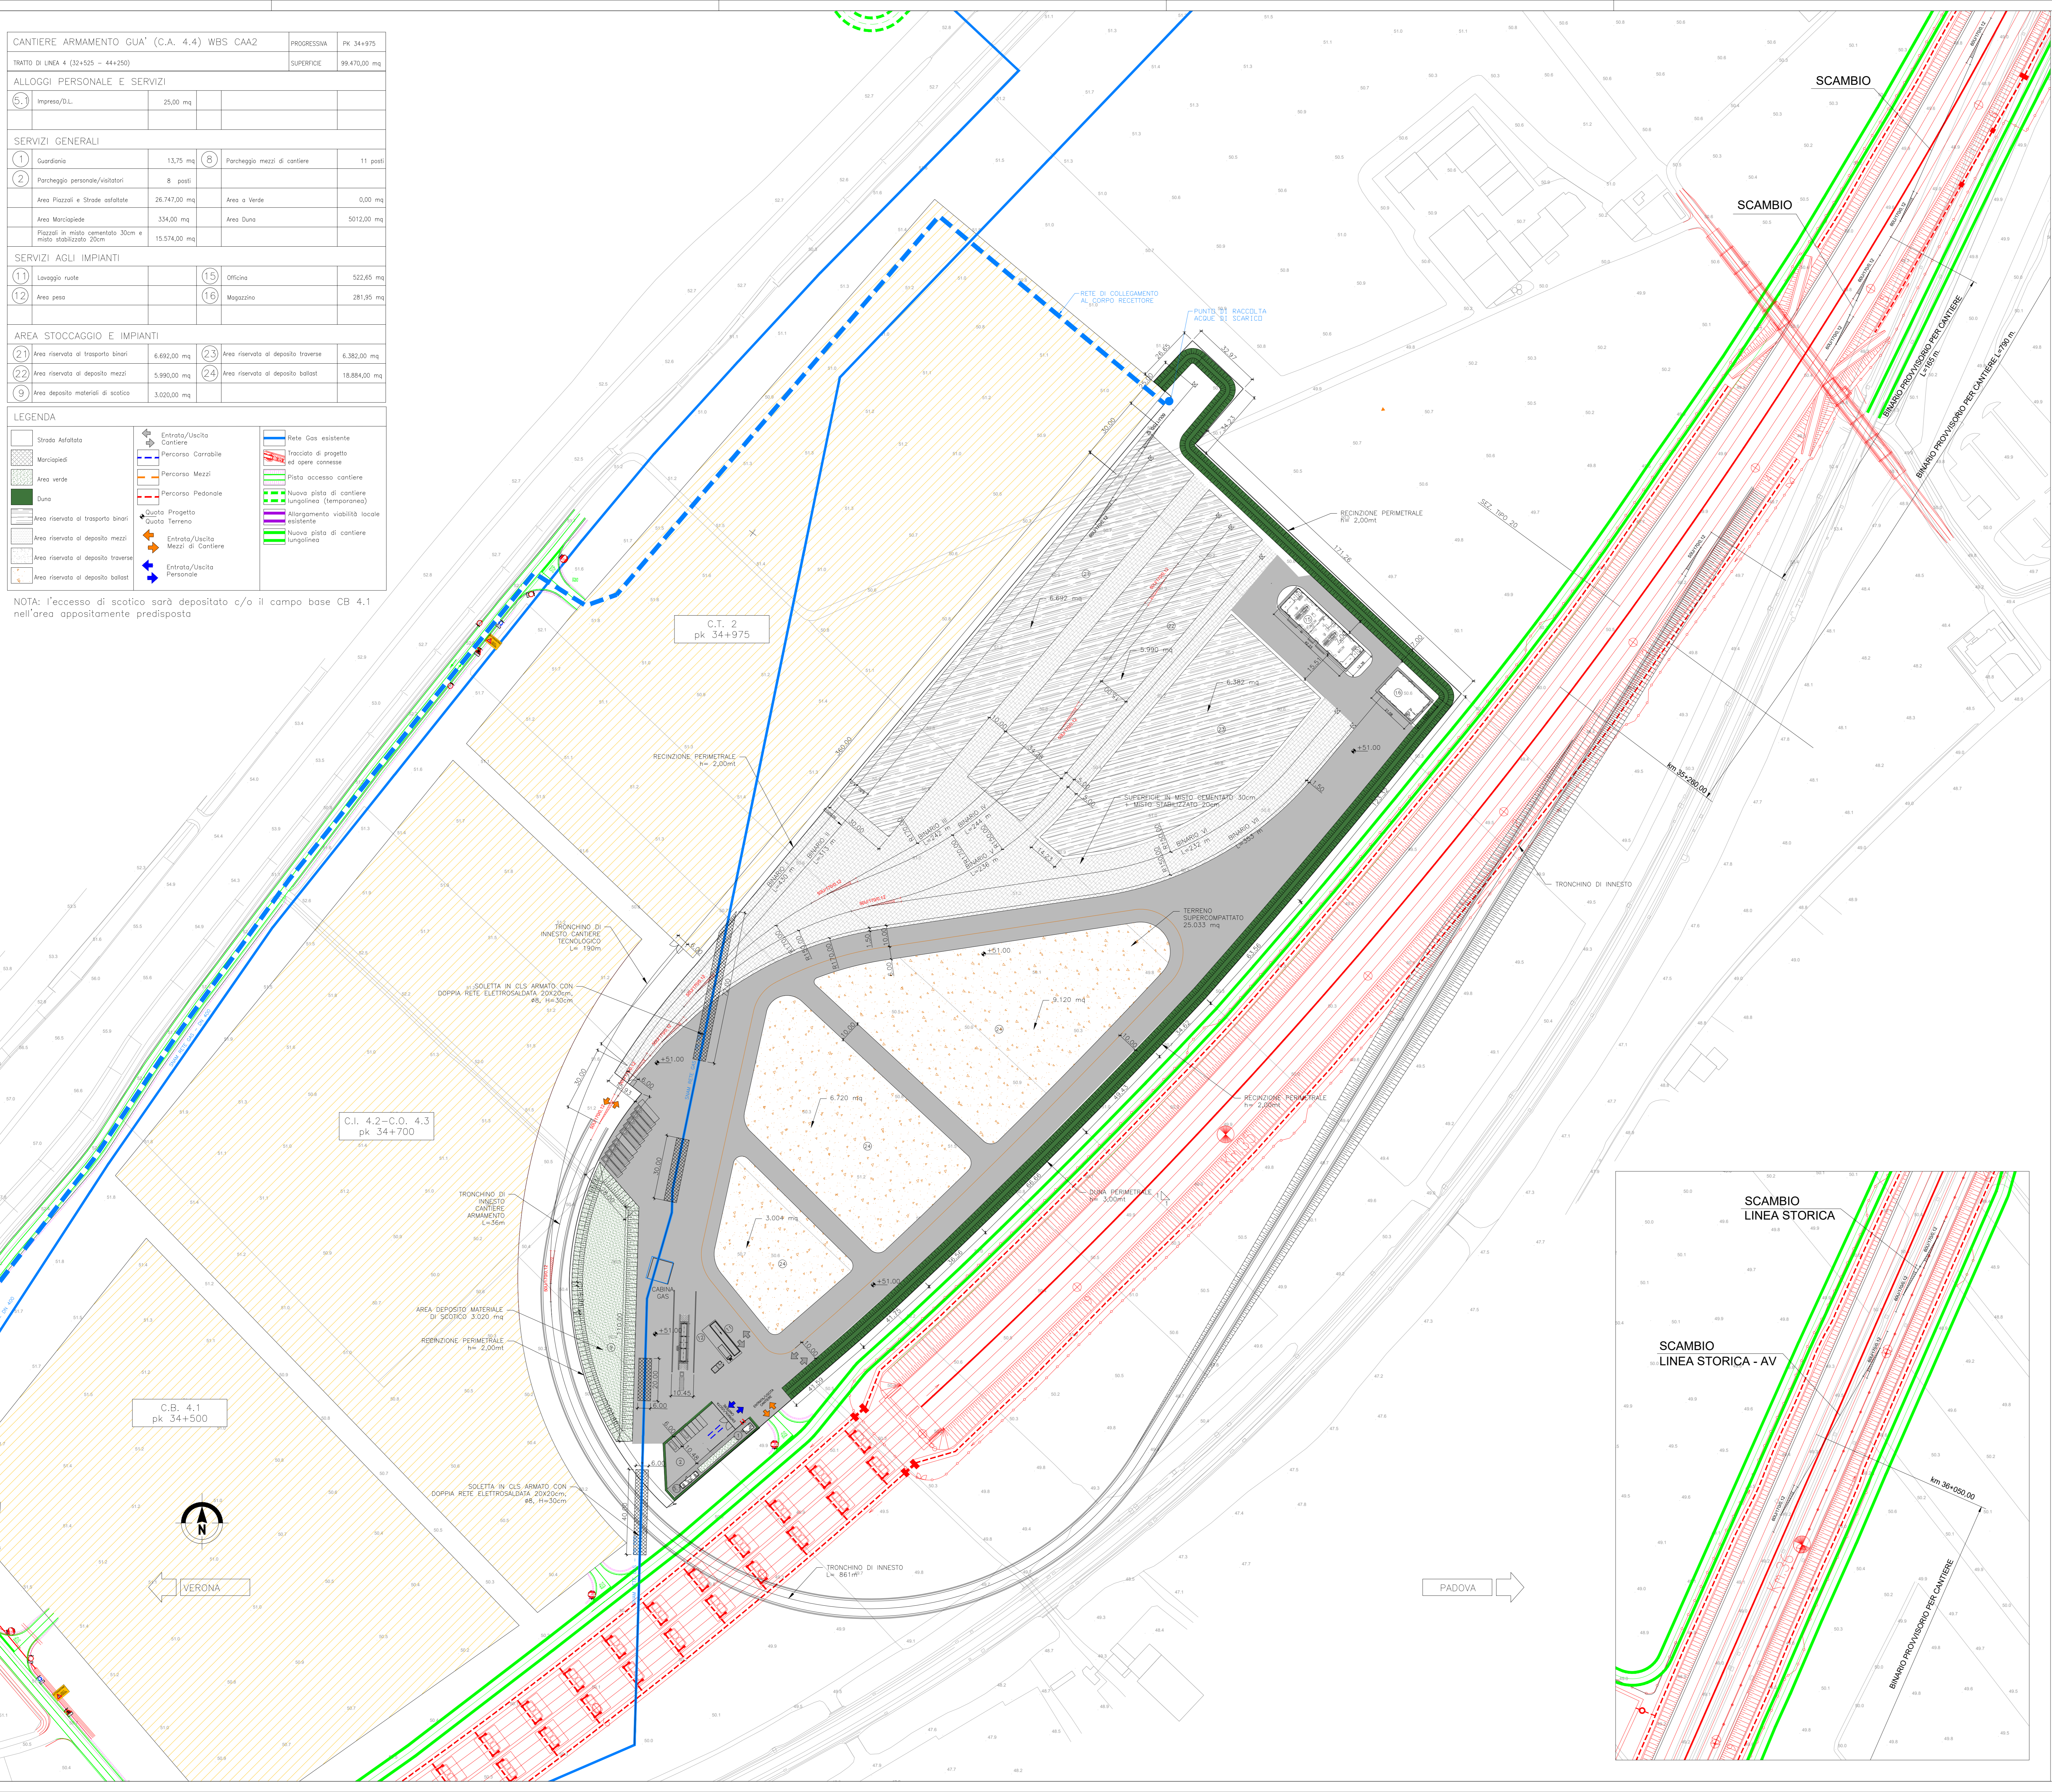

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

ALTA - SUPERVISOR: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

GENERAL CONTRACTOR: **Consorzio IricAV Due**

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01
 LINEA A.V. /A.C. TORINO-VENEZIA Tratto VERONA-PADOVA
 Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza
 PROGETTO ESECUTIVO
 DISEGNO
 CANTIERIZZAZIONE: LAYOUT CANTIERI
 CANTIERE ARMAMENTO GUA' - CA 4.4
 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO

GENERAL CONTRACTOR: Consorzio IricAV Due
 DIRETTORE LAVORI: Visto per costruzione
 SCALA: VARIE

PROGETTAZIONE: Ing. Paolo CARMINA
 DATA: 04-05-2021

COMPRESA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	FOGLIO
11	17	10	E	12	P2	CAA200	002	A

VISTO CONSORZIO IRICAV DUE
 Firma: Ing. Luca RAOCCI
 Data: 03-05-2021

Progettazione:	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	IL PROGETTISTA
A	EMISSIONE	03/05/2021		03/05/2021		03/05/2021	
B							
C							

Cod. 8377957001 | CUP: J41E91000000009 | File: W:\PROGETTA\CAA200024.DWG
 Cod. origine: cbae
