
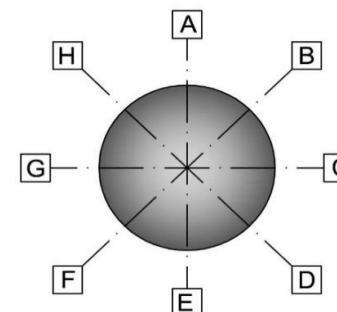


Cliente:	Snam Rete Gas S.p.A.	ORDINE N. 5000002477 del 08/02/2016	Rif.:	Serbatoio di Accumulo	NF:	V12
Ditta Esecutrice	EUROCONTROL SRL		Data di esecuzione delle prove:		26/08/2021	

Mappatura Rilievi: come da Specifica Snam Rete Gas S.p.A. R.04.01.01 Rev. 0 del 26/06/2012 - Appendice A3 Tab. A.3.1

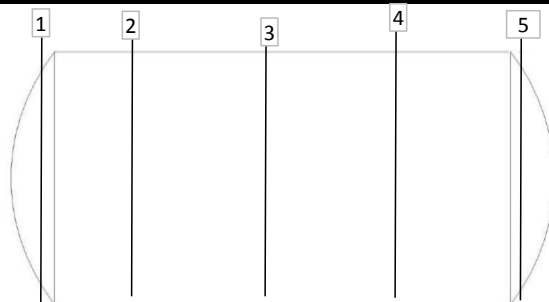

USS-Risultati Rilievi: tutte le misure sono espresse in mm

Pos.	DN	Sp. Nom.	Tolleranza Costruttore	SEZIONI														Spess. Min.
				A	B	C	D	E	F	G	H							
1	Ø1600	7,0	N.A	7,28	7,31	7,27	7,24	7,26	7,20	7,29	7,31							7,20
2	Ø1600	5,0	N.A	5,27	5,29	5,24	5,21	5,26	5,29	5,25	5,29							5,21
3	Ø1600	5,0	N.A	5,23	5,29	5,25	5,15	5,19	5,24	5,27	5,31							5,15
4	Ø1600	5,0	N.A	5,31	5,28	5,31	5,32	5,27	5,30	5,31	5,27							5,27
5	Ø1600	7,0	N.A	7,27	7,23	7,31	7,26	7,31	7,29	7,25	7,30							7,23
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

Verifica delle superfici (ricognizione visiva esterna VTE): come da Specifica Snam Rete Gas S.p.A. R.04.01.01 Rev. 0 del 26/06/2012 - Appendice A1

VTE-Risultati ispezione visiva delle superfici del mantello, dei fondi, dei bocchelli, delle saldature di assemblaggio e di quelle dei supporti, per come applicabile

<input checked="" type="checkbox"/> Esito positivo: non si notano corrosioni superficiali o sfogliature del materiale, ammaccature o altri difetti superficiali. - (**) VTE prova non Accreditata -	<input type="checkbox"/> Altro (specificare):
---	---

DATA	RESPONSABILE IMPRESA	OPERATORE II LIV ISO 9712	ISPETTORE	COMMITTENTE
14/10/2021		FRANCESCO PAGNOTTA		
