
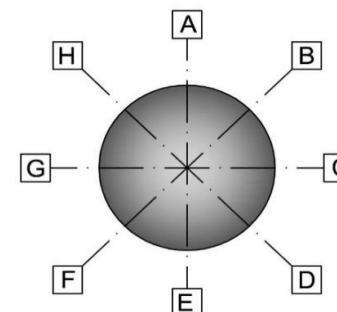


Cliente:	Snam Rete Gas S.p.A. MASERA	ORDINE N. 5000002477 del 08/02/2016	Rif.:	Serbatoio di Accumulo	NF:	V5
Ditta Esecutrice	EUROCONTROL SRL		Data di esecuzione delle prove:	26/08/2021		

Mappatura Rilievi: come da Specifica Snam Rete Gas S.p.A. R.04.01.01 Rev. 0 del 26/06/2012 - Appendice A3 Tab. A.3.1

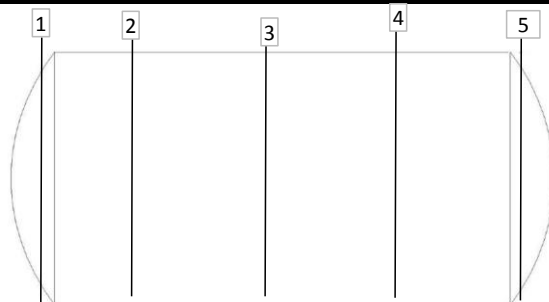

USS-Risultati Rilievi: tutte le misure sono espresse in mm

Pos.	DN	Sp. Nom.	Tolleranza Costruttore	SEZIONI														Spess. Min.
				A	B	C	D	E	F	G	H							
1	60"	8,0	N.A	7,92	7,90	8,05	8,00	8,04	8,01	8,06	8,00							7,90
2	60"	6,0	N.A	5,97	5,94	5,97	6,00	6,02	5,99	5,97	6,04							5,94
3	60"	6,0	N.A	6,02	6,00	6,01	5,92	6,01	6,00	6,02	6,00							5,92
4	60"	6,0	N.A	5,80	5,95	6,00	6,03	6,00	5,97	6,04	6,01							5,80
5	60"	8,0	N.A	7,89	8,00	8,06	8,04	7,98	8,01	8,02	7,98							7,89
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

Verifica delle superfici (ricognizione visiva esterna VTE): come da Specifica Snam Rete Gas S.p.A. R.04.01.01 Rev. 0 del 26/06/2012 - Appendice A1

VTE-Risultati ispezione visiva delle superfici del mantello, dei fondi, dei bocchelli, delle saldature di assemblaggio e di quelle dei supporti, per come applicabile

<input checked="" type="checkbox"/> Esito positivo: non si notano corrosioni superficiali o sfogliature del materiale, ammaccature o altri difetti superficiali. - (**) VTE prova non Accreditata -	<input type="checkbox"/> Altro (specificare):
---	---

DATA	RESPONSABILE IMPRESA	OPERATORE II LIV ISO 9712	ISPETTORE	COMMITTENTE
14/10/2021		FRANCESCO PAGNOTTA		
