
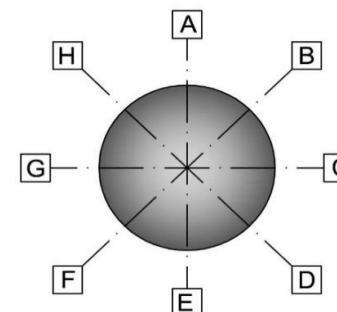


Cliente:	Snam Rete Gas S.p.A. MASERA	ORDINE N. 5000002477 del 08/02/2016	Rif.:	Serbatoio di Accumulo	NF:	V1
Ditta Esecutrice	EUROCONTROL SRL		Data di esecuzione delle prove:	26/08/2021		

Mappatura Rilievi: come da Specifica Snam Rete Gas S.p.A. R.04.01.01 Rev. 0 del 26/06/2012 - Appendice A3 Tab. A.3.1

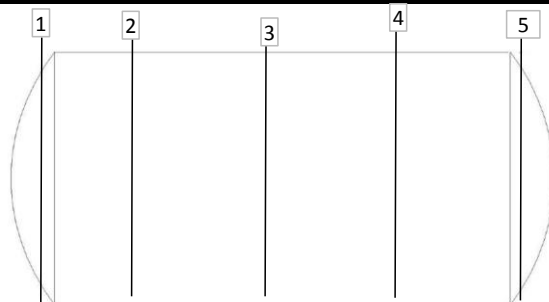

USS-Risultati Rilievi: tutte le misure sono espresse in mm

Pos.	DN	Sp. Nom.	Tolleranza Costruttore	SEZIONI														Spess. Min.
				A	B	C	D	E	F	G	H							
1	60"	8,0	N.A	8,08	8,11	8,01	8,09	8,11	8,16	8,10	8,04							8,01
2	60"	6,0	N.A	7,91	7,20	7,31	7,25	7,27	7,38	7,24	7,19							7,19
3	60"	6,0	N.A	7,83	8,04	7,97	8,00	7,91	8,02	8,00	7,91							7,83
4	60"	6,0	N.A	8,00	7,94	8,01	8,02	7,95	7,97	7,91	7,97							7,91
5	60"	8,0	N.A	8,18	8,20	8,03	8,14	8,16	8,21	8,19	8,16							8,03
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

Verifica delle superfici (ricognizione visiva esterna VTE): come da Specifica Snam Rete Gas S.p.A. R.04.01.01 Rev. 0 del 26/06/2012 - Appendice A1

VTE-Risultati ispezione visiva delle superfici del mantello, dei fondi, dei bocchelli, delle saldature di assemblaggio e di quelle dei supporti, per come applicabile

<input checked="" type="checkbox"/> Esito positivo: non si notano corrosioni superficiali o sfogliature del materiale, ammaccature o altri difetti superficiali. - (**) VTE prova non Accreditata -	<input type="checkbox"/> Altro (specificare):
---	---

DATA	RESPONSABILE IMPRESA	OPERATORE II LIV ISO 9712	ISPETTORE	COMMITTENTE
14/10/2021		FRANCESCO PAGNOTTA		
