
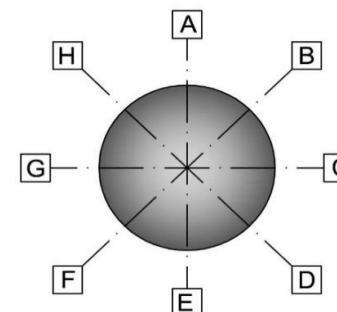


Cliente:	Snam Rete Gas S.p.A. MASERA	ORDINE N. 5000002477 del 08/02/2016	Rif.:	Serbatoio di Accumulo	NF:	V2
Ditta Esecutrice	EUROCONTROL SRL		Data di esecuzione delle prove:	26/08/2021		

Mappatura Rilievi: come da Specifica Snam Rete Gas S.p.A. R.04.01.01 Rev. 0 del 26/06/2012 - Appendice A3 Tab. A.3.1

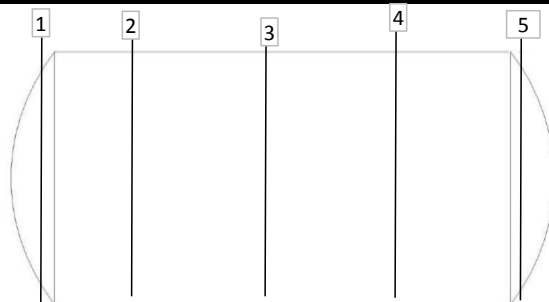

USS-Risultati Rilievi: tutte le misure sono espresse in mm

Pos.	DN	Sp. Nom.	Tolleranza Costruttore	SEZIONI														Spess. Min.
				A	B	C	D	E	F	G	H							
1	Ø1300	7,0	N.A	7,33	7,18	7,35	7,51	7,29	7,22	7,43	7,47							7,18
2	Ø1300	5,0	N.A	5,42	5,25	5,33	5,45	5,47	5,46	5,41	5,22							5,22
3	Ø1300	5,0	N.A	5,28	5,47	5,31	5,05	5,28	5,36	5,31	5,42							5,05
4	Ø1300	5,0	N.A	5,41	5,32	5,19	5,21	5,29	5,46	5,33	5,36							5,19
5	Ø1300	7,0	N.A	7,30	7,20	7,11	7,23	7,12	7,25	7,21	7,29							7,11
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

Verifica delle superfici (ricognizione visiva esterna VTE): come da Specifica Snam Rete Gas S.p.A. R.04.01.01 Rev. 0 del 26/06/2012 - Appendice A1

VTE-Risultati ispezione visiva delle superfici del mantello, dei fondi, dei bocchelli, delle saldature di assemblaggio e di quelle dei supporti, per come applicabile

<input checked="" type="checkbox"/> Esito positivo: non si notano corrosioni superficiali o sfogliature del materiale, ammaccature o altri difetti superficiali. - (**) VTE prova non Accreditata -	<input type="checkbox"/> Altro (specificare):
---	---

DATA	RESPONSABILE IMPRESA	OPERATORE II LIV ISO 9712	ISPETTORE	COMMITTENTE
14/10/2021		FRANCESCO PAGNOTTA		
