

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,  
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)**

**CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011**

**Monitoraggio Ambientale Corso d'Opera**

**SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL**

**SCHEDA DI CAMPO STAZIONE DI MONITORAGGIO**

COD. ELAB.: 2021.CO.026.00.C02.SS-PF-AM-026.B	
CODICE STAZIONE	SS-PF-AM-026
DATA	28/01/2021
WBS DI RIFERIMENTO	Viadotto Della Donna Spalla Nord
TECNICO	Geol. P.Notaro
ENTI DI CONTROLLO PRESENTI	NO
INCLINOMETRO	S143
COMPONENTE	SUOLO E SOTTOSUOLO
SUBCOMPONENTE	INCLINOMETRI
TIPO STAZIONE	Puntuale
FASI D'INTERVENTO	CO
CAMPAGNA	2
TRATTA	2
Regione	Calabria
Comune	Amendolara
Toponimo	Loc. S. Bernardino
Quota s.l.m (m)	63,66
Coordinate UTM (WGS84)	636959,77 m E
	4423401,04 m N



**Caratteristiche sito/Descrizione:**

Rilievo topografico e misure inclinometriche effettuate con sonda inclinometrica.

**Attività di cantiere in corso**

Non ci sono attività di cantiere in corso

**Note:**

Dati delle letture inclinometriche fornite da Sirjo con mail del 24/02/2021

ECOPLAME SRL

*lopre granillo*

<b>Dati cantiere</b>	
Cantiere	<b>S.S. 106 Jonica DG 41 - 3° Megalotto</b>
Committente	<b>Sirjo S.c.p.A</b>
Opera	<b>Monitoraggio Ambientale</b>
Impresa esecutrice	<b>Ecoplame</b>
<b>Dati sondaggio</b>	
Data installazione	<b>20/10/2012</b>
Punto di misura	<b>SS-PF-AM-026</b>
Tubo inclinometrico	<b>S 143</b>
Data inizio sondaggio	<b>24/11/2012</b>
Data fine sondaggio	<b>27/11/2012</b>
Data cementazione	<b>27/11/2012</b>
Letture zero (monitoraggio)	<b>22/11/2018</b>
Lunghezza foro (m)	<b>39</b>
Lunghezza tubo (m)	<b>39</b>
Diametro foro (mm)	<b>140</b>
Diametro interno guide (mm)	<b>64,0</b>
Diametro esterno guide (mm)	<b>71,0</b>
Tipo di perforazione	<b>A Distruzione</b>
Tipo strumento di misura	<b>sisgeo</b>
Tubo utilizzato	<b>tubo Alluminio</b>
Tipo di cementazione	<b>dal basso</b>
Rapporto acqua cemento	<b>2:1</b>
Percentuale bentonite	<b>5%</b>
<b>N. Letture</b>	
Ultima lettura utile da p.c. (m)	<b>40</b>
Passo di misura (m)	<b>1</b>
N° totale letture	<b>40</b>

Committente principale	SIRJO S.c.p.A
Impresa committente	Ecoplame
Opera	MONITORAGGIO AMBIENTALE

**MISURE INCLINOMETRICHE  
ELABORAZIONE DA FONDO FORO  
-GRAFICI-**



Ubicazione	DG 41
Nome tubo	S 143
Azimut di riferimento (°)	110
Data lettura di zero	22/11/2018

Misura	6	IN DATA	28/01/2021
--------	---	---------	------------

SPOSTAMENTI DIFFERENZIALI INTEGRALI  
EST/OVEST

SPOSTAMENTI DIFFERENZIALI INTEGRALI  
NORD/SUD

MISURA N°  
DATA - ORA

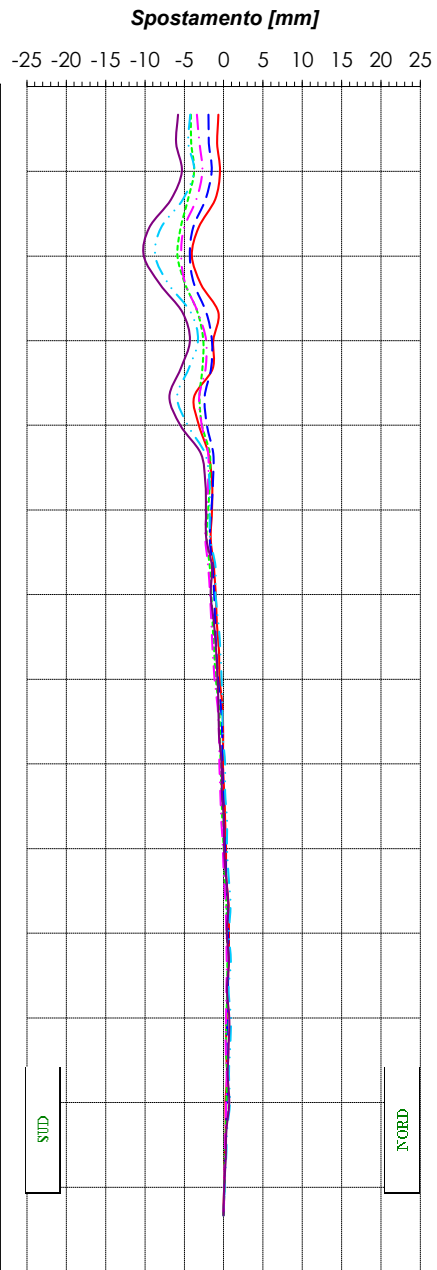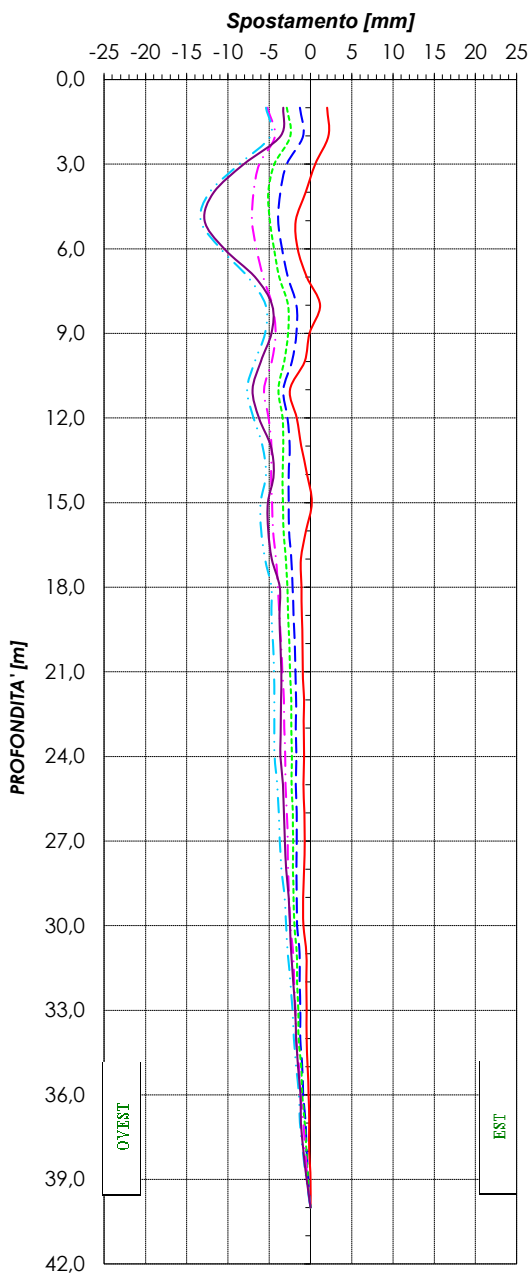

- LETT.1  
26/6/19
- - - LETT.2  
17/9/19
- · - · - LETT.3  
4/12/19
- · - · - LETT.4  
18/3/20
- · - · - LETT.5  
16/9/20
- LETT.6  
28/1/21
- - - LETT.7

Committente principale	SIRJO S.c.p.A
Impresa committente	Ecoplame
Opera	MONITORAGGIO AMBIENTALE

**MISURE INCLINOMETRICHE  
ELABORAZIONE DA FONDO FORO  
-GRAFICI-**


Ubicazione	DG 41
Nome tubo	S 143
Azimut di riferimento (°)	110
Data lettura di zero	22/11/2018

Misura	6	IN DATA	28/01/2021
--------	---	---------	------------

SPOSTAMENTI DIFFERENZIALI INTEGRALI -  
RISULTANTE -

SPOSTAMENTI DIFFERENZIALI INTEGRALI -  
AZIMUT -

MISURA N°  
DATA - ORA

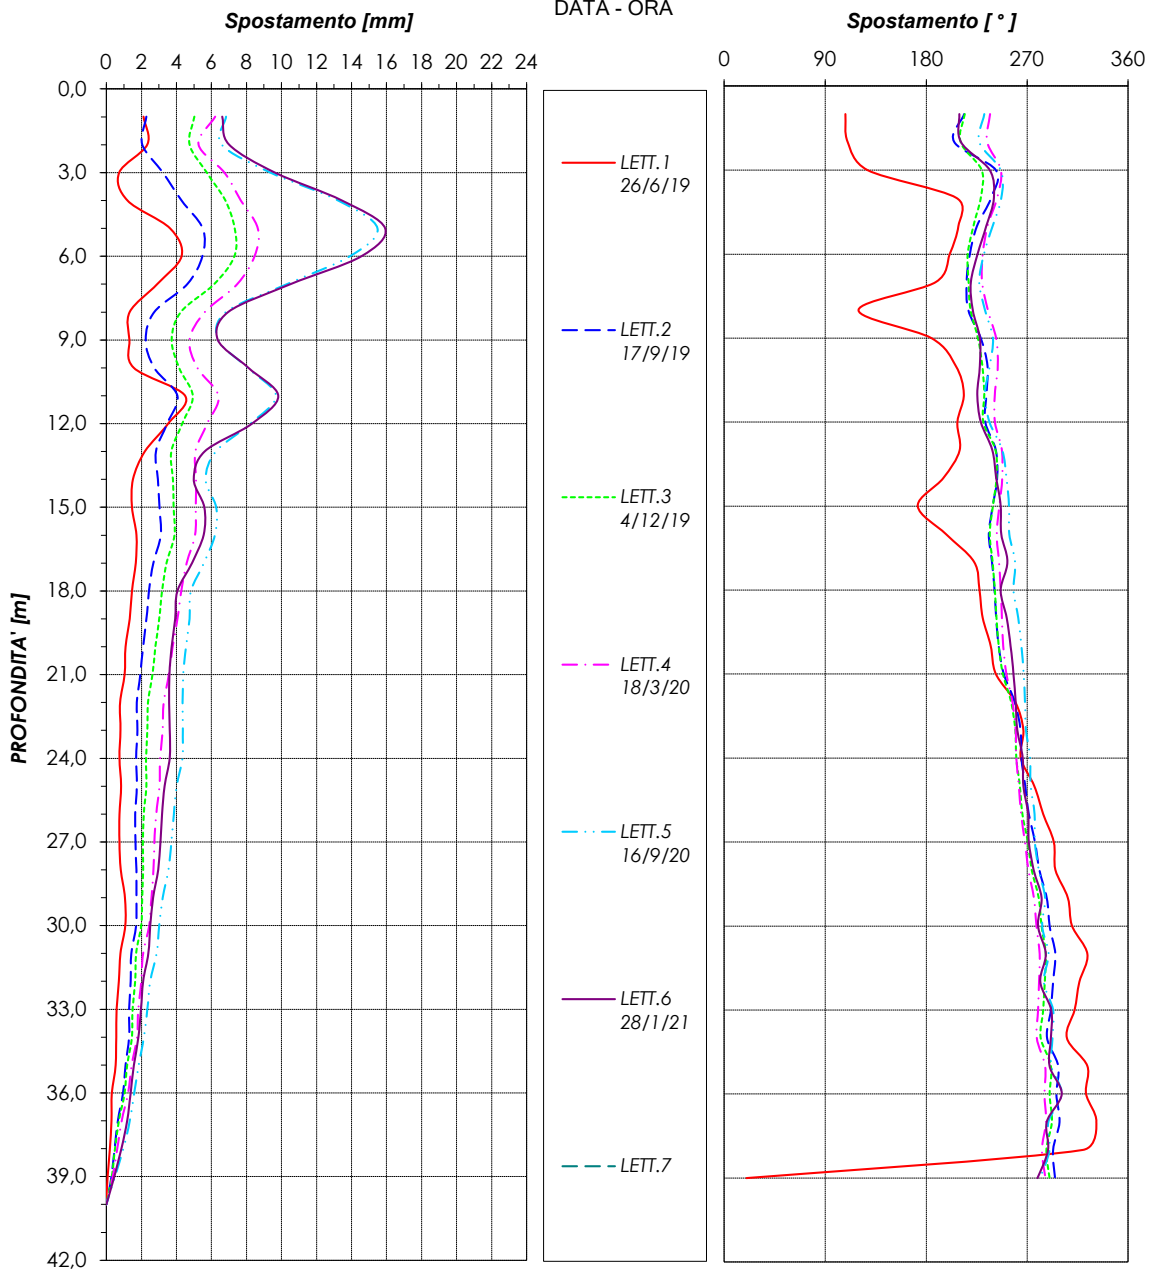


Committente principale	SIRJO S.c.p.A
Impresa committente	Ecoplame
Opera	MONITORAGGIO AMBIENTALE

**MISURE INCLINOMETRICHE  
ELABORAZIONE DA FONDO FORO  
-GRAFICI-**

Ubicazione	DG 41
Nome tubo	S 143
Azimut di riferimento (°)	110
Data lettura di zero	22/11/2018

Misura	6	IN DATA	28/01/2021
--------	---	---------	------------

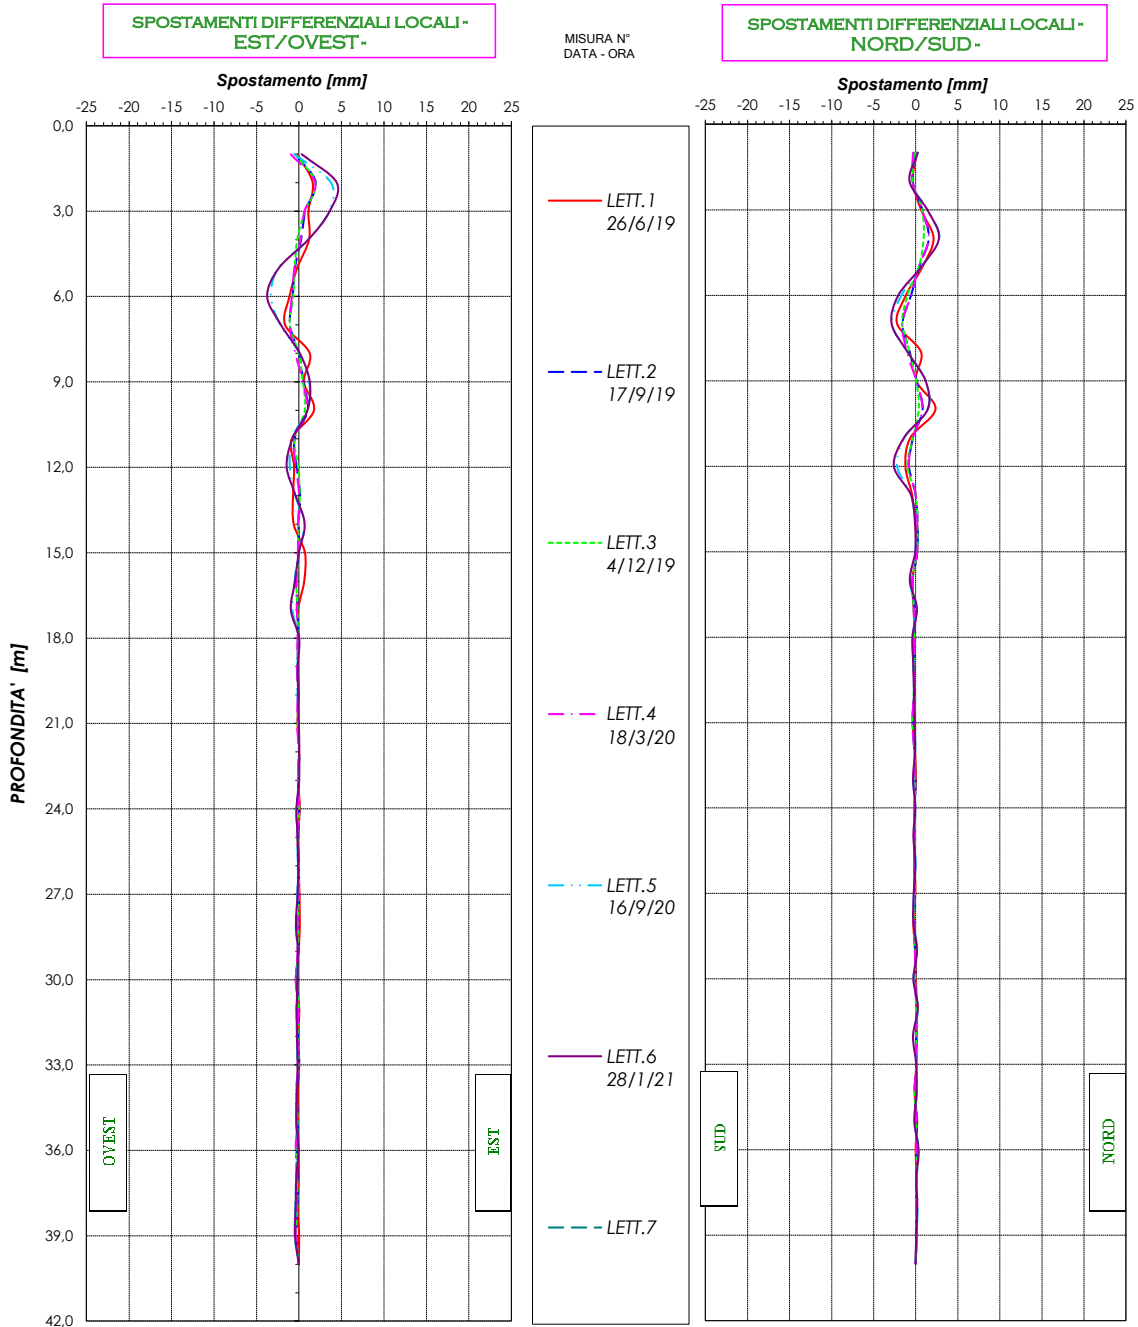


Committente principale	SIRJO S.c.p.A
Impresa committente	Ecoplame
Opera	MONITORAGGIO AMBIENTALE

**MISURE INCLINOMETRICHE  
ELABORAZIONE DA FONDO FORO  
-GRAFICI-**

Ubicazione	DG 41
Nome tubo	S 143
Azimut di riferimento (°)	110
Data lettura di zero	22/11/2018

Misura	6	IN DATA	28/01/2021
--------	---	---------	------------

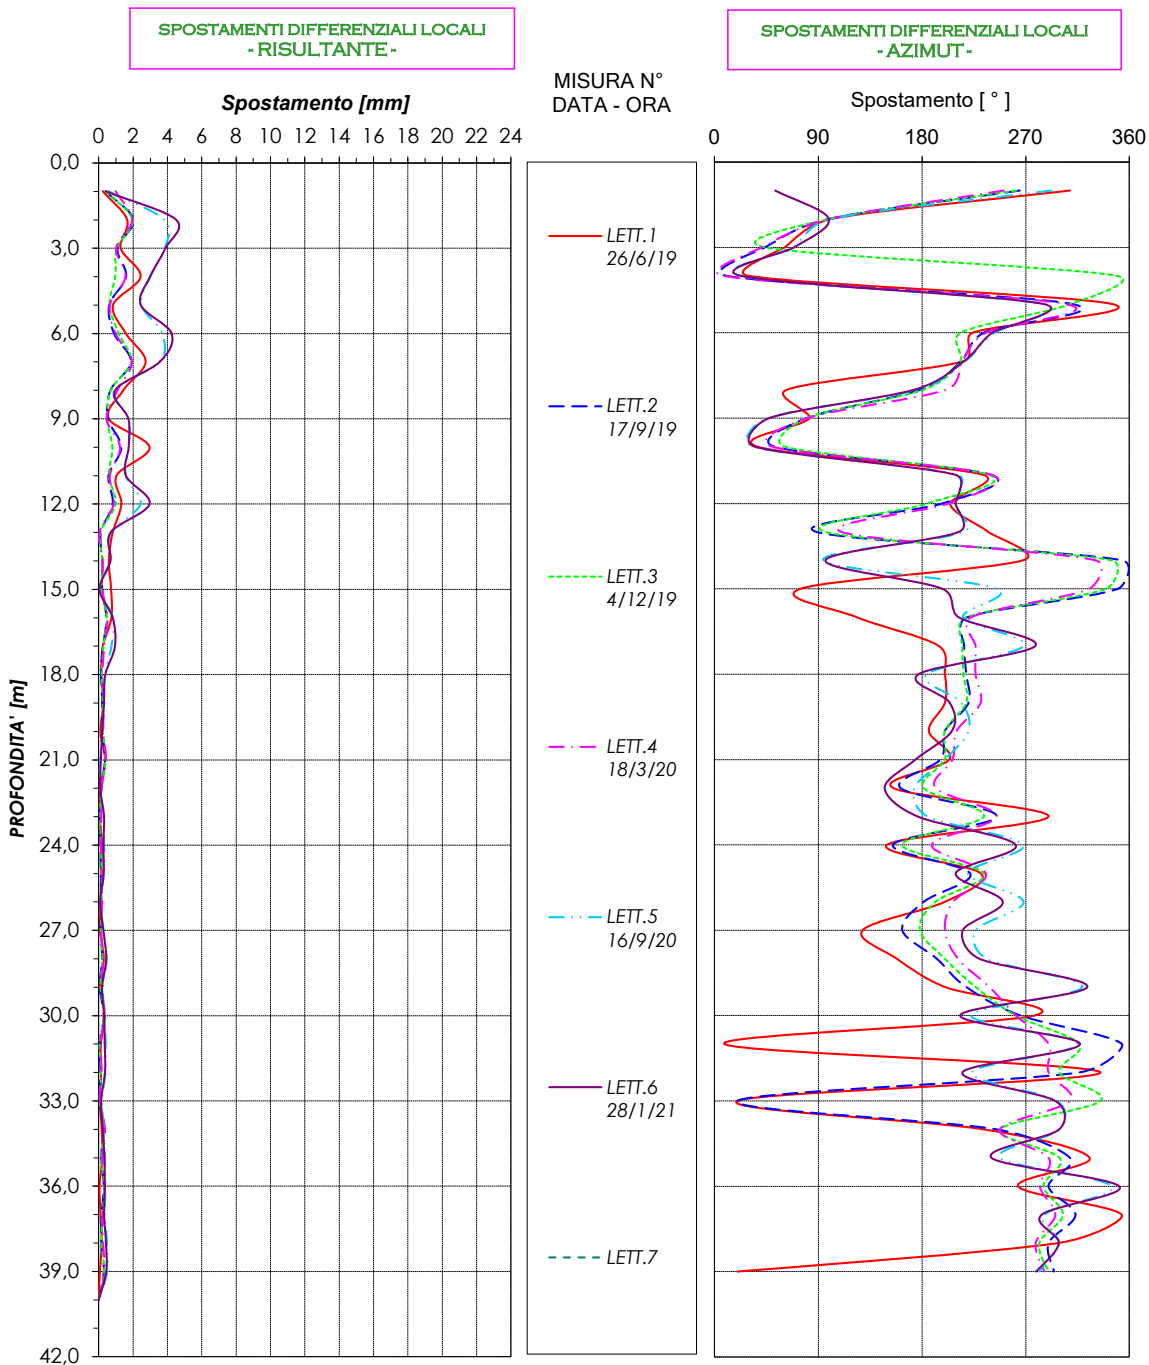


Committente principale	SIRJO S.c.p.A
Impresa committente	Ecoplame
Opera	MONITORAGGIO AMBIENTALE

**MISURE INCLINOMETRICHE  
ELABORAZIONE DA FONDO FORO  
-GRAFICI-**

Ubicazione	DG 41
Nome tubo	S 143
Azimut di riferimento (°)	110
Data lettura di zero	22/11/2018

Misura	6	IN DATA	28/01/2021
--------	---	---------	------------

**SPOSTAMENTI DIFFERENZIALI INTEGRALI  
- DIAGRAMMA POLARE -**

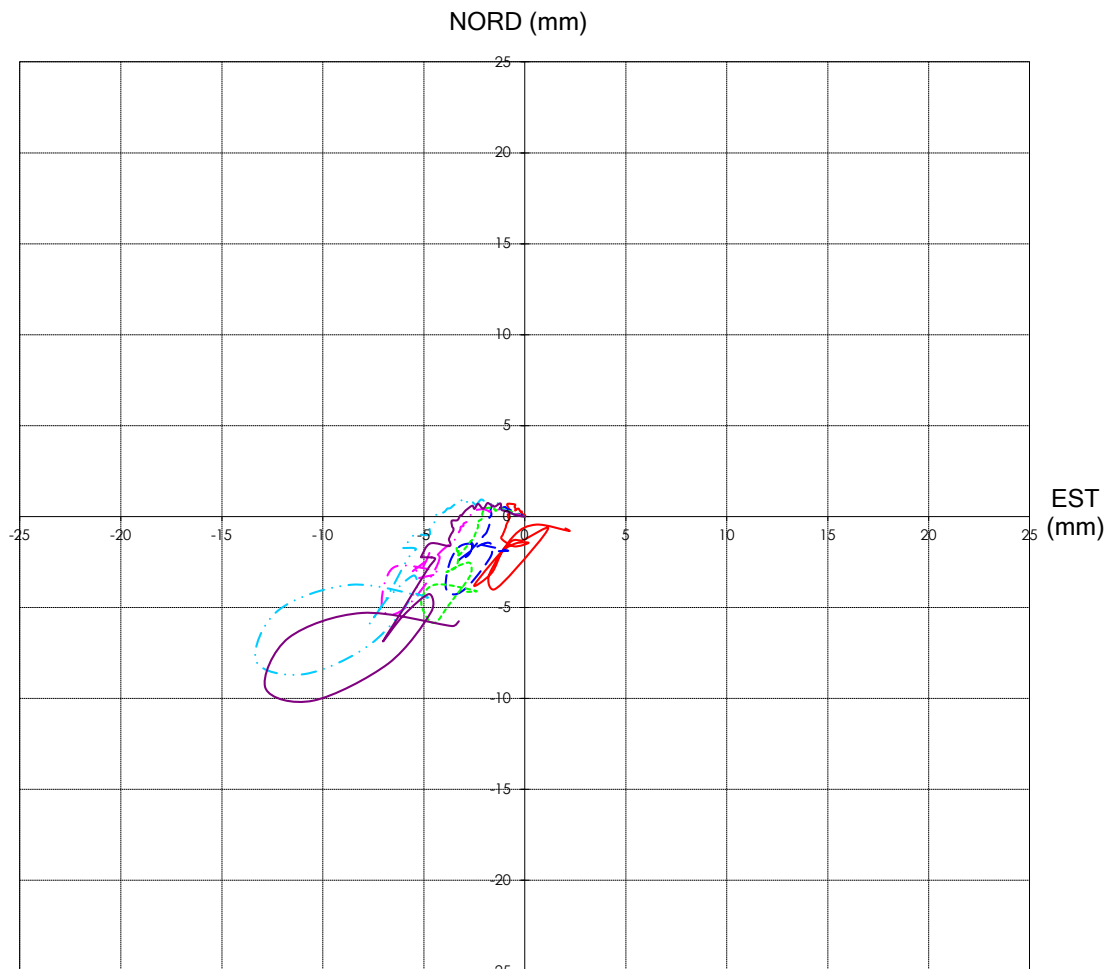

MISURA N° - DATA

— LETT.1 26/6/19	- - - LETT.2 17/9/19	- - - LETT.3 4/12/19
- - - LETT.4 18/3/20	- - - LETT.5 16/9/20	— LETT.6 28/1/21
- - - LETT.7		
