


VE02_C8
Siepe bassa - arbustiva
Superficie area di intervento 345 mq

ARBUSTI (n.9 piante ogni 60 mq)		N.
Vt	VIBURNO	23
Sj	GINESTRA	29
INERBIMENTO		

VE02_C9
Siepe bassa - arbustiva
Superficie area di intervento 219 mq

ARBUSTI (n.9 piante ogni 60 mq)		N.
Vt	VIBURNO	15
Sj	GINESTRA	18
INERBIMENTO		

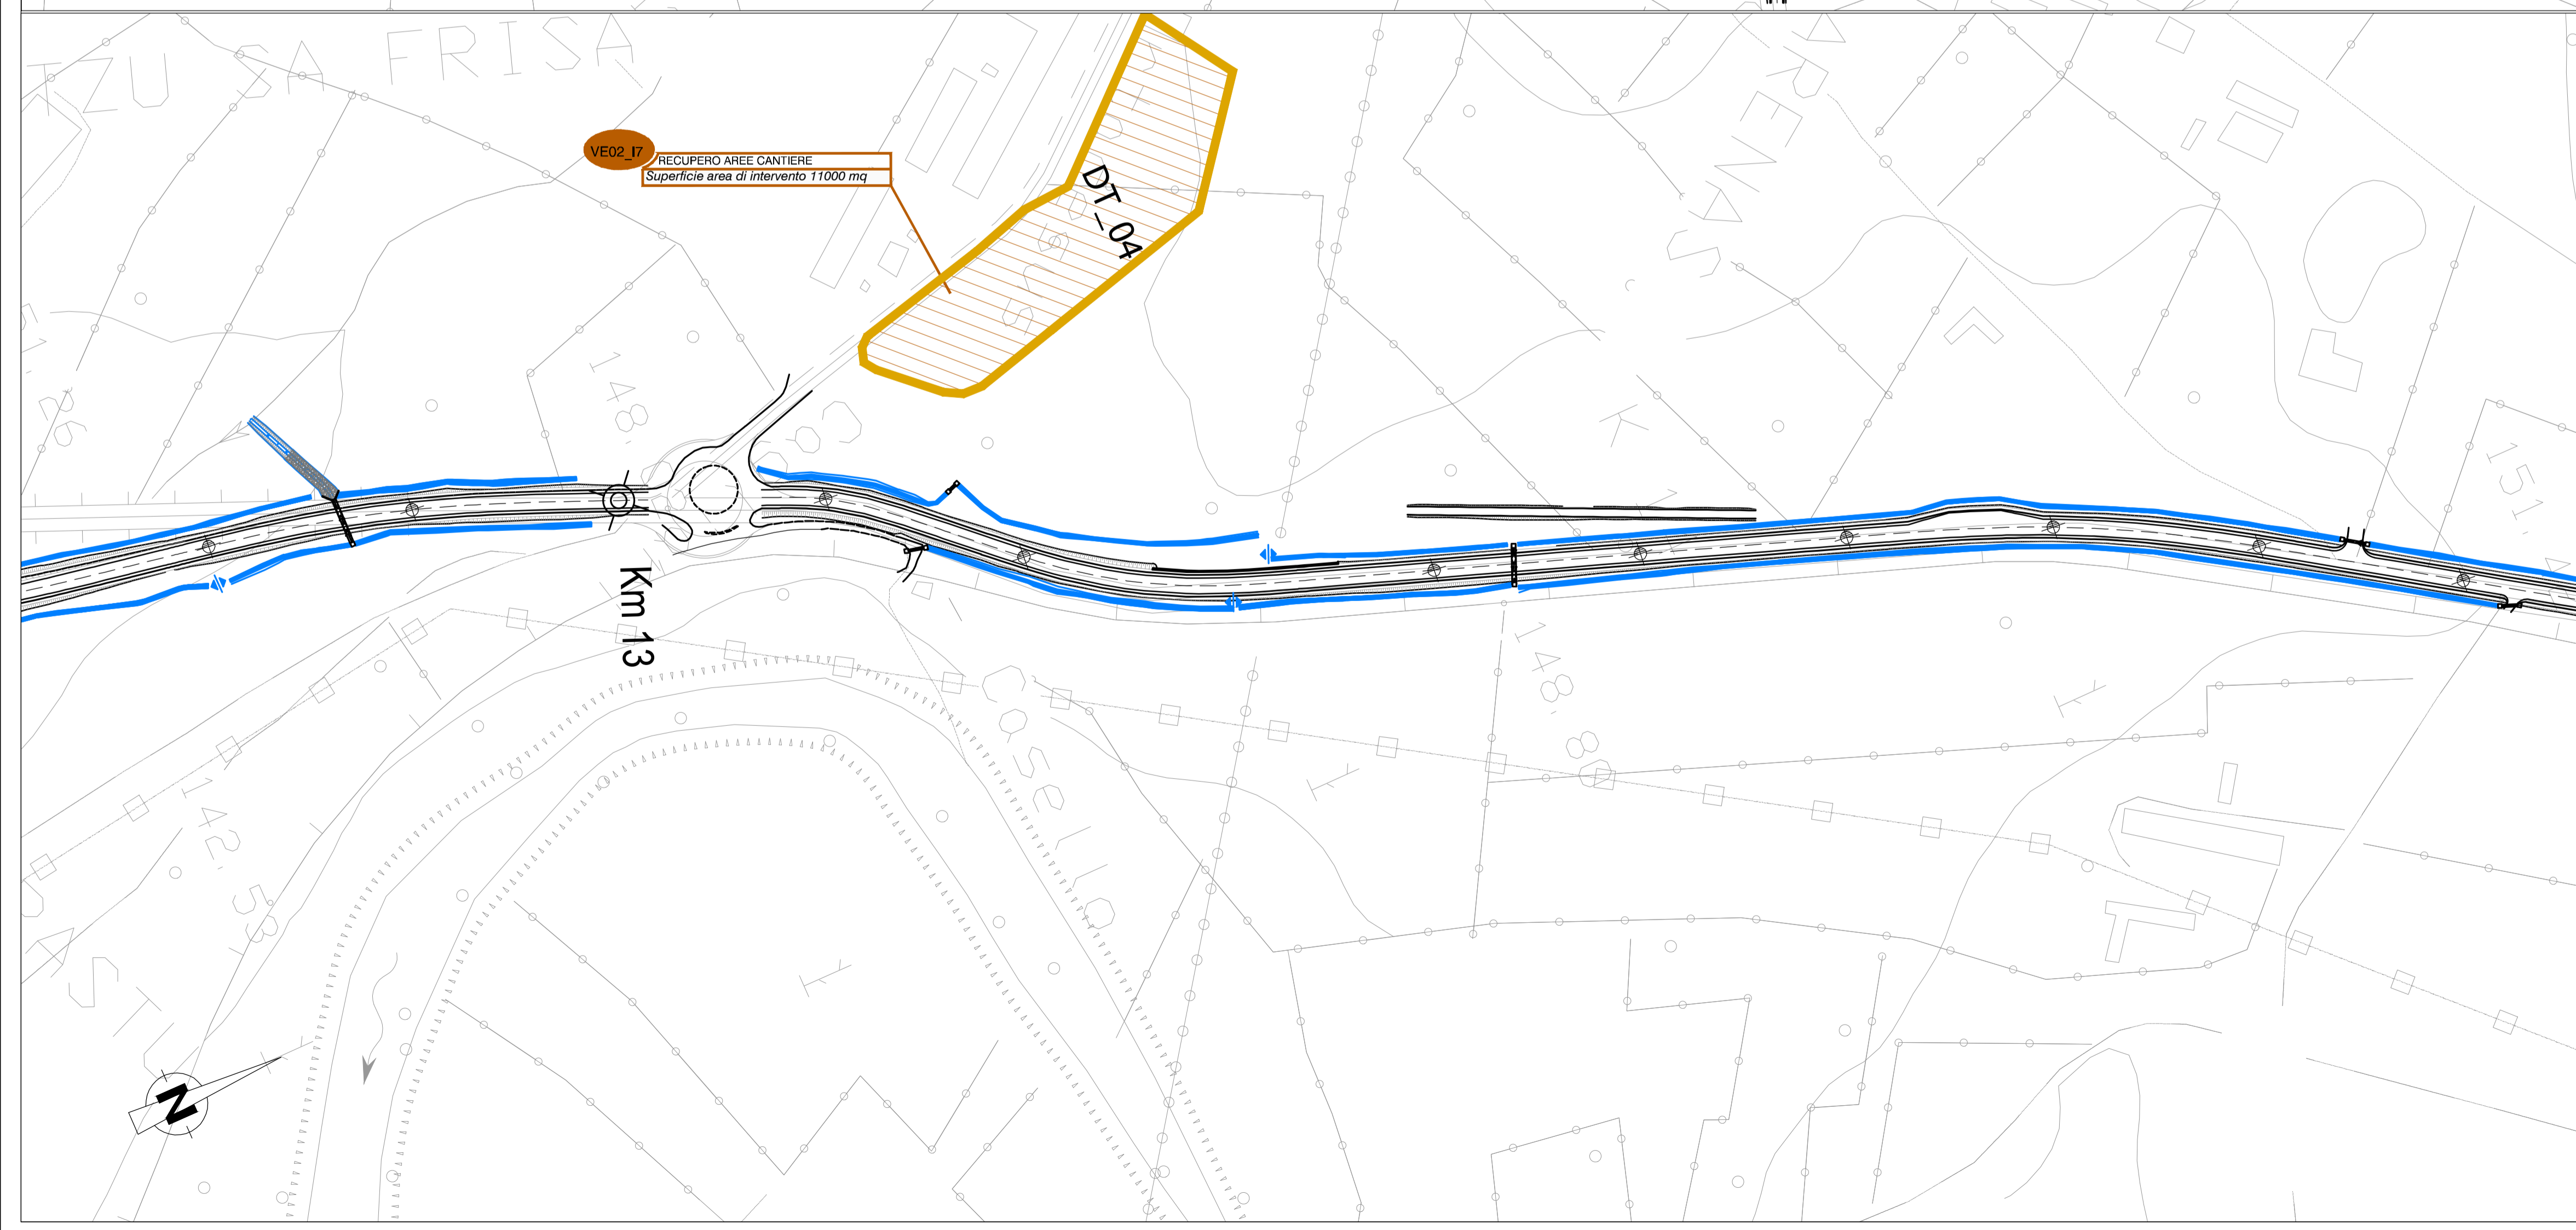

VE02_I7
RECUPERO AREE CANTIERE
Superficie area di intervento 11000 mq


LEGENDA

Tracciato di progetto

Area di cantiere

Confini comunali

FUNZIONE GENERALE	CODICE INTERVENTO	TIPO INTERVENTO	FUNZIONE SPECIFICA	Descrizione	Superficie complessiva (mq)
PAESAGGISTICA		Inerbimento dei rilevati	Stabilizzazione suolo	Protezione e consolidamento delle scarpate dove non è prevista la piantumazione di essenze arboree e arbustive	-
	A	Prato cespugliato	Estetica/Ornamentale	Intervento di arredo in corrispondenza delle rotatorie	1.883
	B	Cespugliato arborato	Ripristino aree intercluse	Intervento di arredo in corrispondenza degli svincoli	2.047
	C	Siepe bassa - arbustiva	Rinaturalizzazione fasce intercluse	Piantumazione di elementi lineari di vegetazione arbustiva in corrispondenza delle fasce intercluse	2.270
	D	Filare alberato	Recupero ambientale e paesaggistica	Piantumazione di elementi lineari con valenza paesaggistica	1.472
NATURALISTICA	E	Arbusti a gruppi in corrispondenza di rilevati e trincee	Consolidante	Intervento di consolidamento dei tratti in rilevato e valorizzazione paesaggistica	5.314
	F	Siepe campestre	Ripristino e ricucitura con la vegetazione esistente	Ripristino della vegetazione esistente in ambito agricolo	5.780
	G	Fasce arboreo - arbustive a carattere igrofilo	Ripristino ecologico	Potenziamento della vegetazione igrofila in corrispondenza delle fasce ripariali dei corsi d'acqua interferiti dal tracciato di progetto	1.105
AGRICOLA	H	Recupero dei suoli e inerbimento dei tratti in dismissione	Recupero suolo e costituzione cotico erboso	Ripristino dei suoli	33.560
	I	Ripristino dei suoli in corrispondenza delle aree di cantiere ed intercluse	Ripristino ante - operam, recupero suolo e costituzione cotico erboso	Ripristino della fertilità del terreno mediante semina di leguminose e graminacee, per restituirlo alla coltura	186.584
		Area di rimpianto definitivo degli olivi	Recupero degli individui di olivo espianati durante la fase di cantiere	Salvaguardia e recupero degli olivi oggetto di espianto	24.380

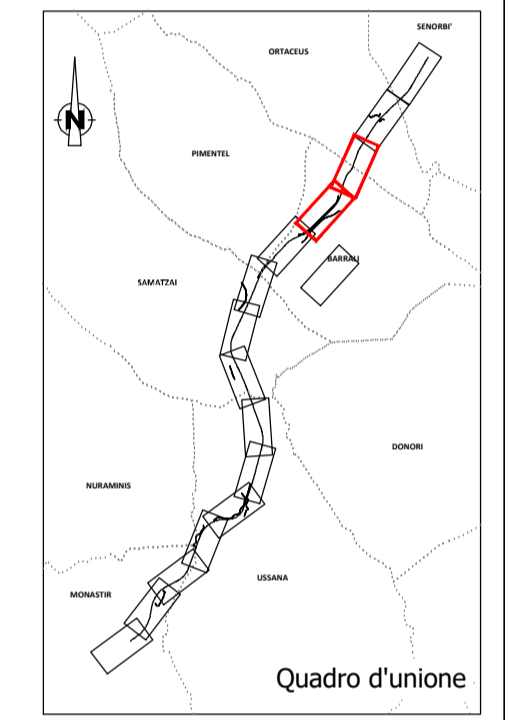

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. n.128 "Centrale Sarda"
Lotto 0 bivio Monastir - bivio Senorbì
1° stralcio dal km 0+200 al km 16+700

PROGETTO DEFINITIVO COD. CA356

PROGETTAZIONE: ATI VIA - SERING - VDP - BRENG

PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Dott. Ing. Francesco Nichiarelli (Ord. Ing. Prov. Roma 14711)

GRUPPO DI PROGETTAZIONE SPECIALISTICHE:

MANDATARIA: **VIA INGEGNERIA**

MANDANTE: **SERING INGEGNERIA** e **vdp**

RESPONSABILI D'AREA:
Responsabile Tracciato Stradale: Dott. Ing. Massimo Capasso (Ord. Ing. Prov. Roma 26031)
Responsabile Strutture: Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma 22366)
Responsabile Idraulico, Geotecnico e Impianti: Dott. Ing. Sergio Di Maio (Ord. Ing. Prov. Palermo 2872)
Responsabile Ambiente: Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)

GEOLOGO:
Dott. Geol. Enrico Curcuruto (Ord. Geo. Regione Sicilia 986)

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Matteo Di Girolamo (Ord. Ing. Prov. Roma 15138)

RESPONSABILE SIA:
Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Ing. Edoardo Quattrone

**INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE
OPERE A VERDE
PLANIMETRIA DI DETTAGLIO INTERVENTI OPERE A VERDE
tav. 7/8**

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO: DPCA0356 D 21	TO0IA01AMBPL11A	A	1:2.000
ELAB.:	TO0IA01AMBPL11		
D			
C			
B			
A	EMISSIONE	DIC. 2021	F. NICHIARELLI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDDATO VERIFICATO APPROVATO
