




PLANIMETRIA  
SCALA 1:1000  
DEMOLIZIONE

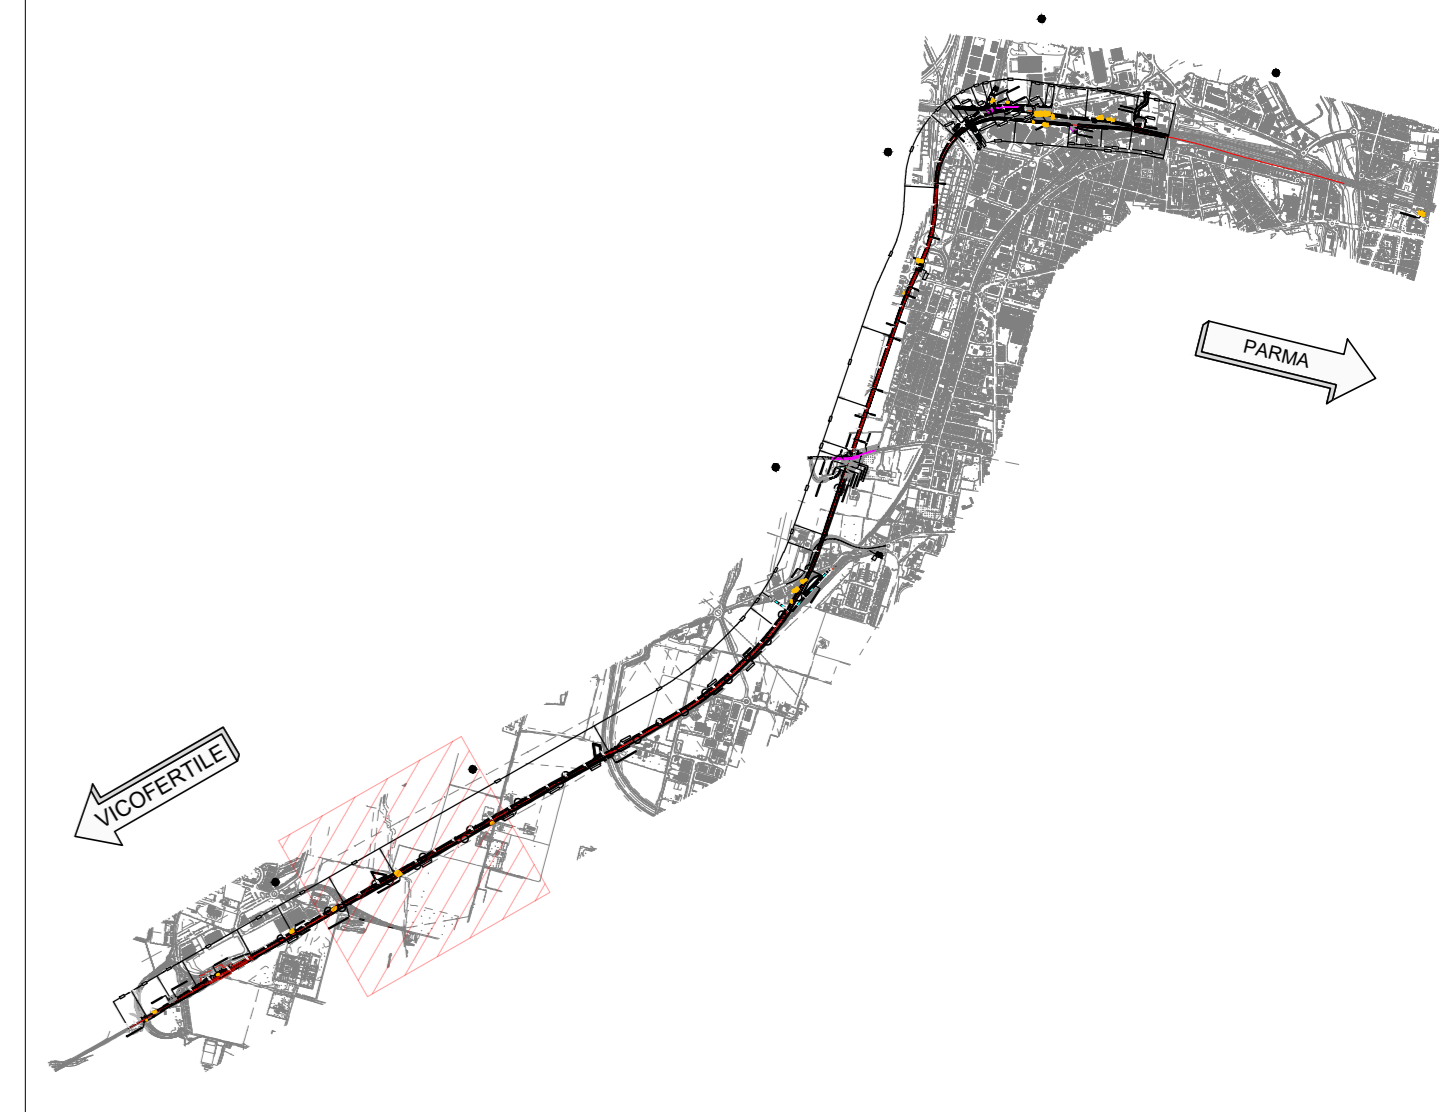


KEY PLAN - Scala 1:35.000





| DESCRIZIONE OPERE DA DEMOLIRE |               |                               |                        |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|
| CODIFICA                      | TIPOLOGIA     | POSIZIONE                     | DESCRIZIONE            |
| FB-03                         | Fabbricato 03 | Strada dei mercati            | Fabbricato da demolire |
| FB-04                         | Fabbricato 04 | Strada dei mercati            | Fabbricato da demolire |
| FB-05                         | Fabbricato 05 | Tangenziale Unione Europea    | Fabbricato da demolire |
| FB-06                         | Fabbricato 06 | Via Martiri della Liberazione | Fabbricato da demolire |
| FB-07                         | Fabbricato 07 | Via Martiri della Liberazione | Fabbricato da demolire |
| FB-10                         | Fabbricato 10 | Strada Bergonzi               | Fabbricato da demolire |
| FB-14                         | Fabbricato 14 | Strada Scarzara               | Fabbricato da demolire |
| FB-15                         | Fabbricato 15 | Stazione Parma                | Fabbricato da demolire |
| FB-16                         | Fabbricato 16 | Via Roma                      | Fabbricato da demolire |
| FB-17                         | Fabbricato 17 | Biglietteria Mercato Bestiame | Fabbricato da demolire |
| FB-18                         | Fabbricato 18 | La Colombiella                | Fabbricato da demolire |
| FB-19                         | Fabbricato 19 | La Colombiella                | Fabbricato da demolire |
| FB-20                         | Fabbricato 20 | Via Emilia Ovest              | Fabbricato da demolire |
| FB-21                         | Fabbricato 21 | Via Martiri della Liberazione | Fabbricato da demolire |
| SL-01                         | Tettoia 01    | Strada Bergonzi               | Tettoia da demolire    |
| TT-02                         | Tettoia 02    | Strada dei mercati            | Tettoia da demolire    |
| TT-03                         | Tettoia 03    | Strada dei mercati            | Tettoia da demolire    |
| TT-04                         | Tettoia 04    | Strada dei mercati            | Tettoia da demolire    |
| TT-05                         | Tettoia 05    | Via Martiri della Liberazione | Tettoia da demolire    |
| TT-06                         | Tettoia 06    | Via Ugo Ferrandi              | Tettoia da demolire    |
| TT-07                         | Tettoia 07    | Stazione Vicofertile          | Tettoia da demolire    |
| TT-09                         | Tettoia 09    | Via Roma                      | Tettoia da demolire    |
| TT-10                         | Tettoia 10    | Stabilimento Froner           | Tettoia da demolire    |
| TT-11                         | Tettoia 11    | Stabilimento Froner           | Tettoia da demolire    |
| TT-12                         | Tettoia 12    | Tettoia da demolire           | Tettoia da demolire    |

N.B. Alcune misure sono state ipotizzate visto la difficoltà di reperire

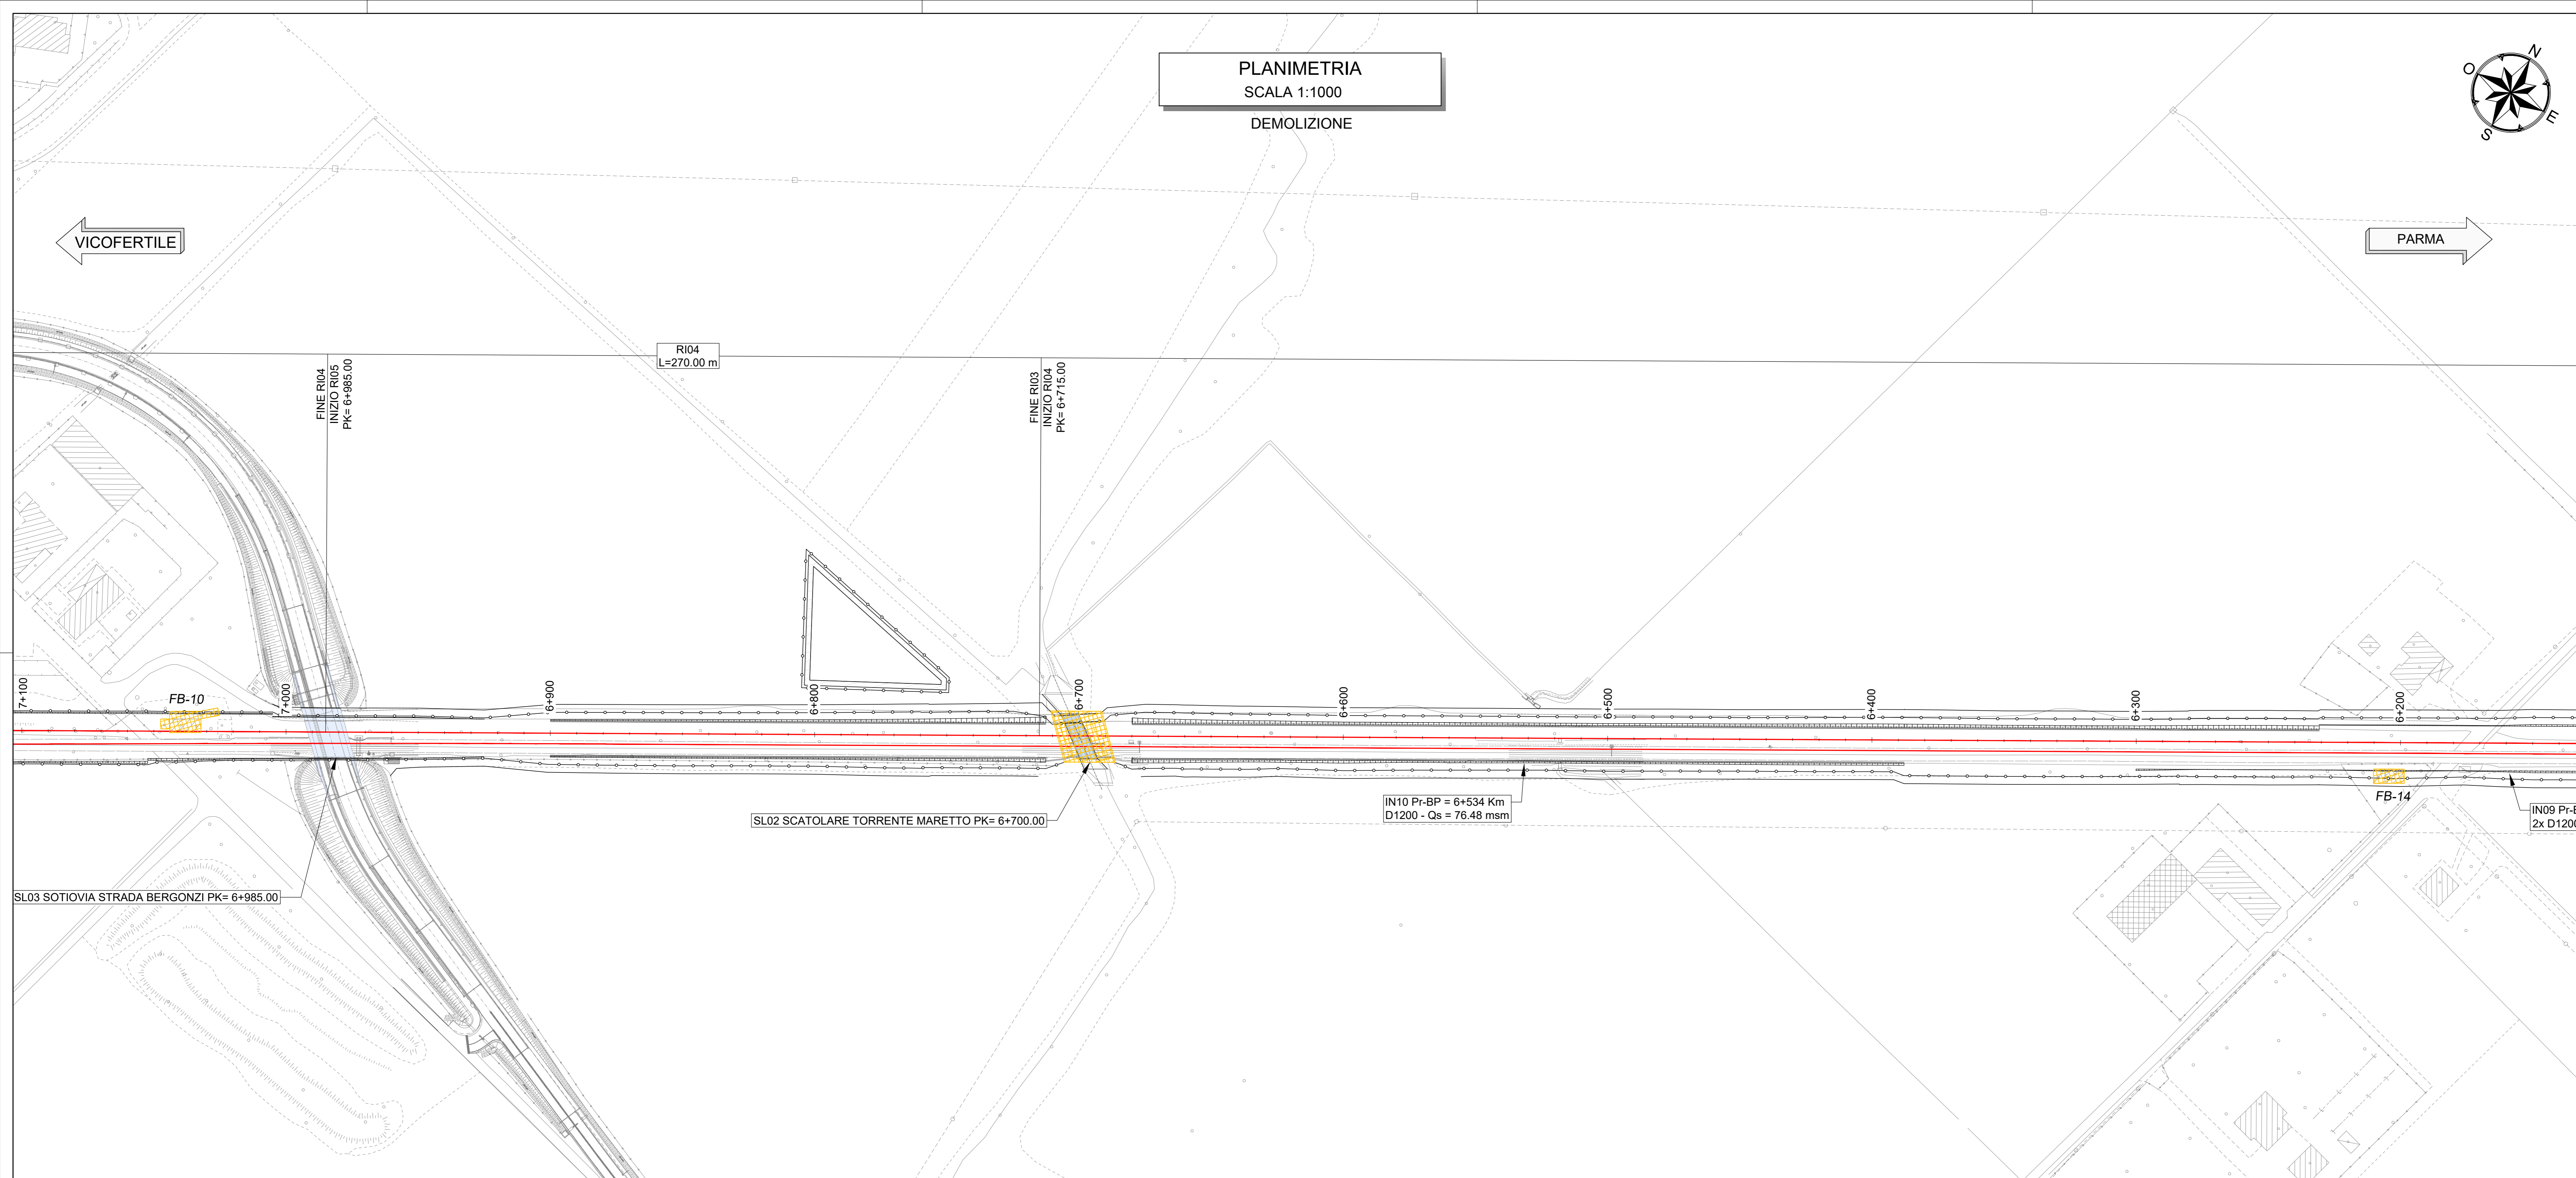

LEGENDA

- AREA DI DEMOLIZIONE
- IMBOCCO NORD (PIAZZALE)
- ASSE DI DEMOLIZIONE
- ASSE DI PROGETTO

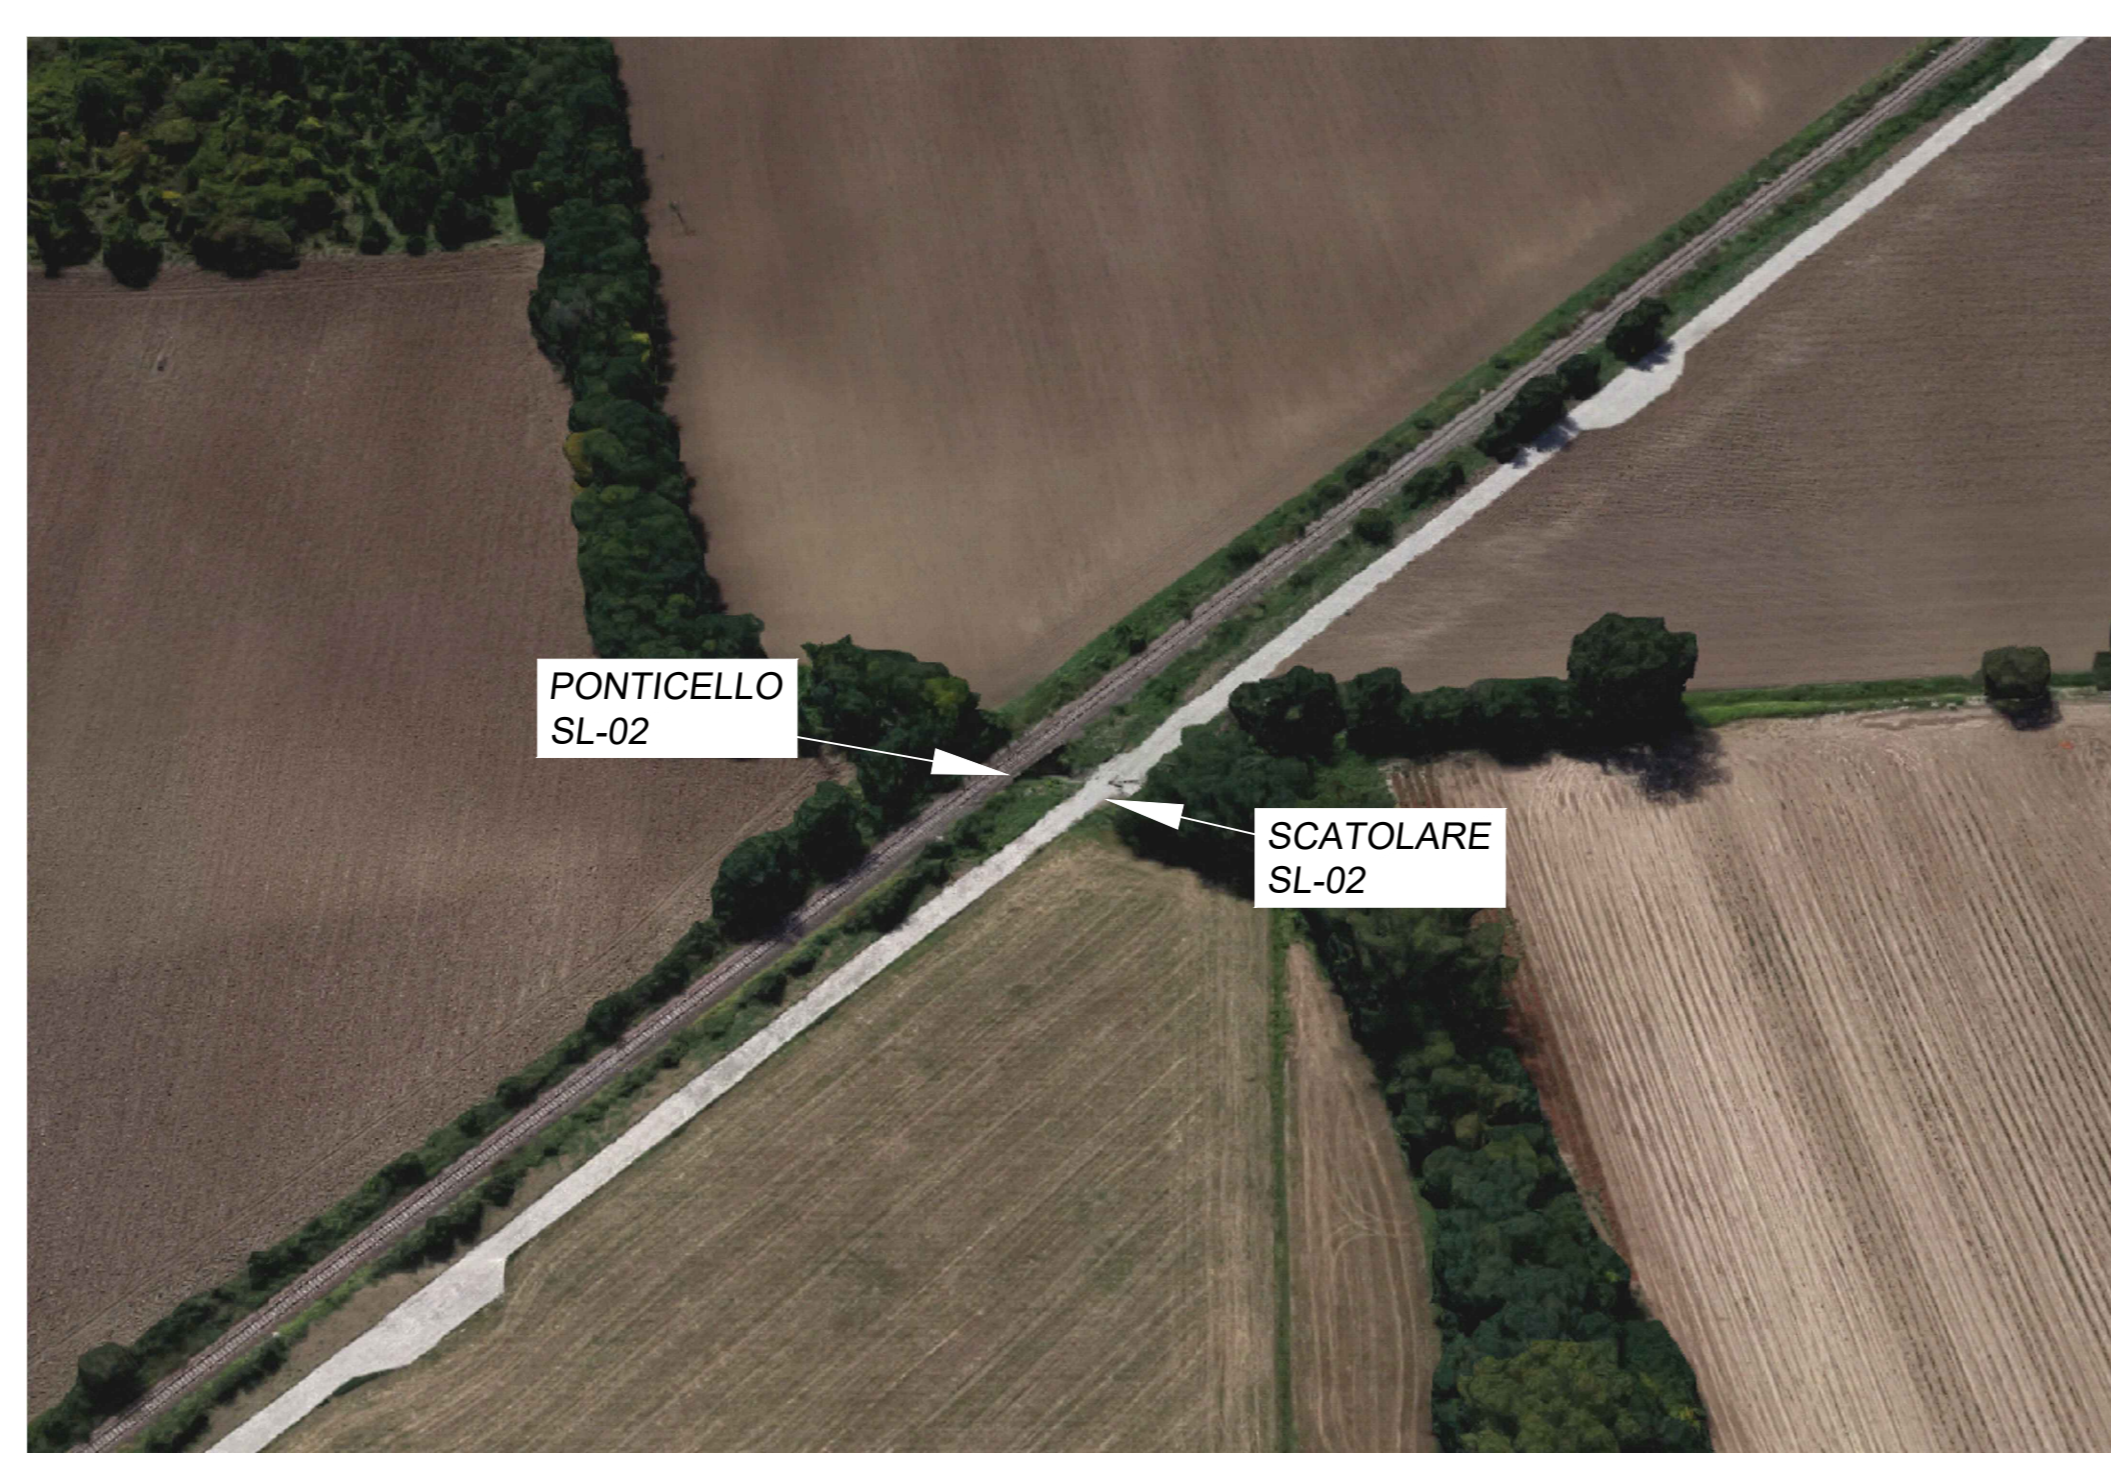

| Demolizione fabbricato visto per piano FB-10 |        |         |               |                  |
|--|--------|---------|---------------|------------------|
| Descrizione                                  | Area   | Altezza | Volume        | Vol mat. Demolti |
| Demolizione fabbricato                       | 127.40 | 6.00    | 764.40        | 152.88           |
| <b>TOTALE Demolizione fino a 0,2 m</b>       |        |         | <b>764.40</b> | <b>152.88</b>    |
| Struttura gliere e ospitali                  | -      | -       | 38.23         | -                |
| Scatolato - muri perimetrali                 | -      | -       | -             | -                |
| Scatolato - tramezzi                         | -      | -       | -             | -                |
| Scatolato - demolizione platea               | -      | -       | -             | -                |
| <b>TOTALE Demolizione</b>                    |        |         |               | <b>191.10</b>    |

| Descrizione FB-10                       |      |        |        |
|---|------|--------|--------|
| Descrizione                             | Area | Volume | Peso   |
| Demolizione serrande                    | 10   | -      | 47.1   |
| Demolizione porte e finestre in metallo | 18.3 | -      | 430.05 |
| Demolizione porte e finestre in ferro   | -    | -      | -      |
| Demolizione ringhiere esterne           | -    | -      | -      |
| Demolizione lastre amianto              | -    | -      | -      |

| Descrizione FB-10 |  |            |            |
|-------------------|--|------------|------------|
| Forme             | Area                                     | Volume     | Peso       |
| Irregolare        | 127.40m <sup>2</sup>                     | 6.00m      |            |
| Materiali         | Murature + Strutture Metalliche          |            |            |
| Finestre          | Intonaco esterno + soglie marmo + tegole |            |            |
| Tipologia         | Deposito                                 |            |            |
| Copertura         | Tettoia fide in laterocemento            |            |            |
| Infissi           | Metallici                                | 1 Serrande | 6 Finestre |
| Amianto           | Non presente                             |            |            |
| Piuviali e Gronde | Grande 22.61m <sup>2</sup>               |            |            |
| Scatolati         | Non presenti                             |            |            |
| Sottoservizi      | Presenza di sottoservizi                 |            |            |

N.B. Alcune misure sono state ipotizzate visto la difficoltà di reperire

| Demolizione fabbricato visto per piano FB-14 |       |         |               |                  |
|--|-------|---------|---------------|------------------|
| Descrizione                                  | Area  | Altezza | Volume        | Vol mat. Demolti |
| Demolizione fabbricato                       | 63.05 | 10.00   | 630.50        | 126.10           |
| <b>TOTALE Demolizione fino a 0,2 m</b>       |       |         | <b>630.50</b> | <b>126.10</b>    |
| Struttura gliere e ospitali                  | -     | -       | 18.52         | -                |
| Scatolato - muri perimetrali                 | 10.25 | 3.00    | 30.76         | -                |
| Scatolato - tramezzi                         | 4.00  | 3.00    | 12.00         | -                |
| Scatolato - demolizione platea               | 63.05 | 0.50    | 31.53         | -                |
| <b>TOTALE Demolizione</b>                    |       |         |               | <b>219.30</b>    |

| Descrizione FB-14                       |      |        |      |
|---|------|--------|------|
| Descrizione                             | Area | Volume | Peso |
| Demolizione serrande                    | -    | -      | -    |
| Demolizione porte e finestre in metallo | -    | -      | -    |
| Demolizione porte e finestre in ferro   | -    | -      | -    |
| Demolizione ringhiere esterne           | -    | -      | -    |
| Demolizione lastre amianto              | -    | -      | -    |

| Descrizione FB-14 |  |        |      |
|-------------------|--|--------|------|
| Forme             | Area                                     | Volume | Peso |
| Rettangolare      | 63.05m <sup>2</sup>                      | 10.00m |      |
| Materiali         | Murature + Strutture Metalliche          |        |      |
| Finestre          | Intonaco esterno + soglie marmo + tegole |        |      |
| Tipologia         | Deposito                                 |        |      |
| Copertura         | Laterocemento                            |        |      |
| Infissi           | Non presenti                             |        |      |
| Amianto           | Non presente                             |        |      |
| Piuviali e Gronde | Non presenti                             |        |      |
| Scatolati         | 63.05m <sup>2</sup>                      |        |      |
| Sottoservizi      | Presenza di sottoservizi                 |        |      |

N.B. Alcune misure sono state ipotizzate visto la difficoltà di reperire

COMMITTENTE:  
**RFI**  
RETE FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:  
**ITALFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

CUP J81H0200000001

S.O. PROGETTAZIONE INTEGRATA NORD  
PROGETTO DEFINITIVO

COMPLETAMENTO RADDOPPIO LINEA PARMA - LA SPEZIA  
(PONTREMOLSE)  
TRATTA PARMA - VICOFERTILE

06-DEMOLIZIONI  
DD01 - TRATTA PARMA-VICOFERTILE (pk.0+000,00-8+136,59)

PLANIMETRIE DEMOLIZIONI DI DETTAGLIO  
TAV. 6/7

SCALA:  
TAV. 6/7  
VARIE

| Rev. | Descrizione         | Redatto   | Data     | Verificato | Data     | Approvato | Data     | Autorizzato Data |
|------|---------------------|-----------|----------|------------|----------|-----------|----------|------------------|
| A    | EMISSIONE ESECUTIVA | P. Cusani | Feb 2022 | G. Fadda   | Feb 2022 |           | Feb 2022 |                  |
| B    | EMISSIONE ESECUTIVA | P. Cusani | Apr 2022 | L. Masi    | Apr 2022 |           | Apr 2022 | A. Pirego        |
