

## COMUNI DI APOLLOSA, CASTELPOTO, BENEVENTO

Proponente

**Apolloso Solar Park S.R.L.**

VIALE FRANCESCO RASTELLI, 3/7

20124 MILANO

P.IVA 06055390659

*Progetto per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile*

Opera

**REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE UTENZA DI TRASFORMAZIONE 30\150 kV PER LA CONNESSIONE MEDIANTE COSTRUZIONE DI UN CAVIDOTTO INTERRATO AT PER COLLEGAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA NOMINALE PARI A 35.000 KW ALLO STALLO ASSEGNATO ALL'INTERNO DELLA STAZIONE ELETTRICA ESISTENTE 150/380 KV DENOMINATA "BENEVENTO 2"**

Progettazione

**M.E. Free Srl**

Via Athena,29

Cap 84047 Capaccio Paestum

P.Iva 04596750655

Ing. Giovanni Marsicano



IL TECNICO

ING. GIOVANNI MARSICANO

Elaborato


Nome Elaborato:

**CRONOPROGRAMMA - OPERE UTENTE**

Contenuto Elaborato:

02	30/09/2022	PRIMA EMISSIONE	G. Marsicano	G. Marsicano	G. Marsicano
Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione
Scala:					
Formato:	Codice Pratica	<b>202100416</b>	Codice Elaborato	<b>IT-APB-R8</b>	

REALIZZAZIONE STAZIONE CONDIVISA 150 KV+ STAZIONE UTENTE	DATA INIZIO	DURATA	DATA FINE
APERTURA CANTIERE STAZIONE CONDIVISA + UTENTE	01/06/2024	10	11/06/2024
SISTEMAZIONE AREA CANTIERE E STRADA DI ACCESSO	11/06/2024	40	21/07/2024
POSA RETE DI TERRA	21/07/2024	25	15/08/2024
OPERE CIVILI STAZIONE	15/08/2024	210	13/03/2025
MONTAGGIO APPARECCHIATURE AT	13/03/2025	50	02/05/2025
MONTAGGIO SISTEMA DI CONTROLLO	02/05/2025	15	17/05/2025
PROVE STAZIONE	17/05/2025	10	27/05/2025

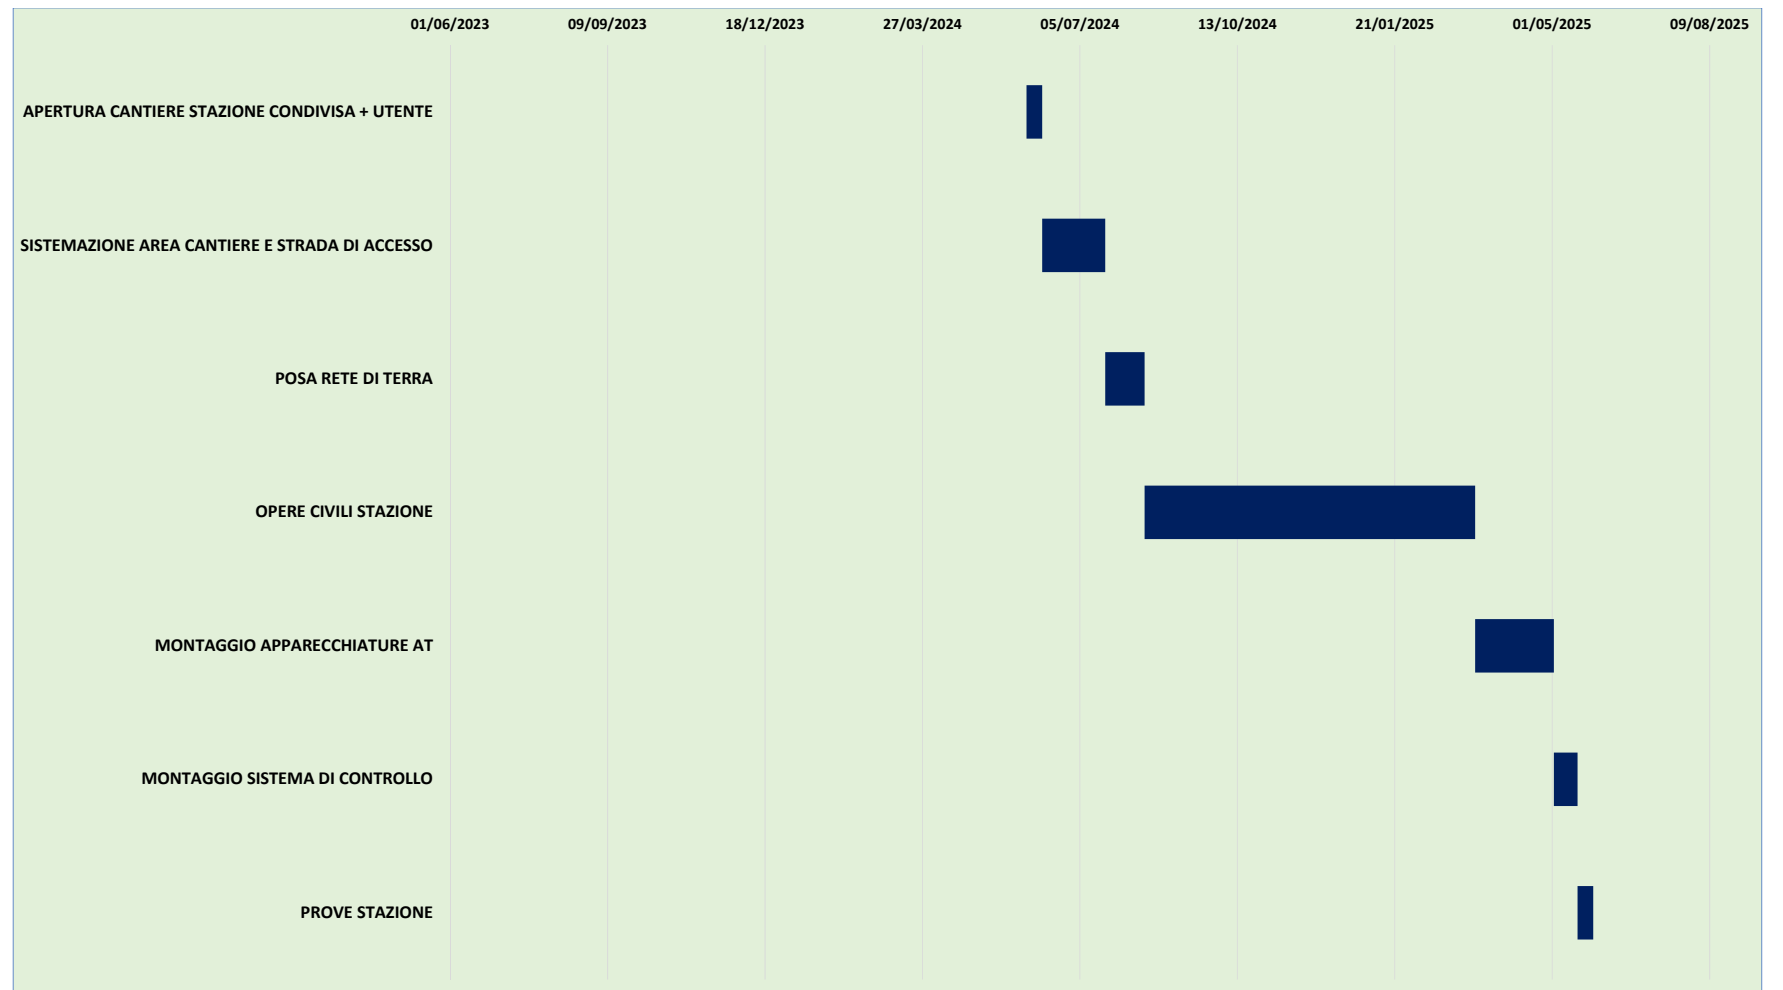

REALIZZAZIONE CAVIDOTTO AT	DATA INIZIO	DURATA	DATA FINE
APERTURA CANTIERE CAVIDOTTO AT	01/08/2024	6	07/08/2024
REALIZZAZIONE TRINCEA DI SCAVO	07/08/2024	40	16/09/2024
POSA IN OPERA CAVO ED ESECUZIONE GIUNTI	16/09/2024	20	06/10/2024
PROVE CAVI AT	06/10/2024	5	11/10/2024

