

**REGIONE
FRIULI - VENEZIA GIULIA**

COMUNE DI BICINICCO (UD)

COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA (UD)

ATLAS SOLAR 1 s.r.l.
Via Cino Del Duca, 5
20122 MILANO (MI)
P.IVA 03035010309

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
AGRIVOLTAICO CON FOTOVOLTAICO AD INSEGUITORI MONOASSIALI
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, COMPRESIVO DI
IMPIANTO AGRICOLO CON ANNESSO APIARIO, SITO NEI COMUNI DI
BICINICCO (UD) E SANTA MARIA LA LONGA (UD), FORMATO DA DUE
SEZIONI CIASCUNO PER UNA POTENZA NOMINALE MASSIMA DI 6668 KW
E POTENZA IN A.C. DI 5860 KW, ALLA TENSIONE RETE DI 20 KV E DELLE
RELATIVE OPERE DI RETE RICADENTI NEI COMUNI DI BICINICCO (UD),
SANTA MARIA LA LONGA (UD) E PALMANOVA (UD)**

**PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE
COMPRESIVO DELLE OPERE DI RETE PER LA CONNESSIONE**

ELABORATO

PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

DATA: 20/10/2021

aggiornamento : 27/04/2023

PROGETTISTI

Ing. Nicola ROSELLI

Ing. Rocco SALOME

CONSULENZE E COLLABORAZIONI

Arch. Gianluca DI DONATO

Dott. Massimo MACCHIAROLA

Ing. Elvio MURETTA

Archeol. Gerardo Fratianni

Geol. Davide SERAVALLI

Per. Ind. Alessandro CORTI



Energy for the Future

Udine (UD) Via Andreuzzi n°12, CAP 33100


Partita IVA 02943070306

www.atlas-re.eu

revisione	descrizione	data	DOC R05
A	PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	
B	PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	26/09/2022	
C	PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	27/04/2023	



Impianto agrivoltaico con fotovoltaico a terra del tipo a inseguimento solare da ubicare nei Comuni di Bicinicco e Santa Maria La Longa (Provincia di Udine)



Studio di Ingegneria

Ditta Proponente: ATLAS SOLAR 1 s.r.l.

A.01.A	PREMESSA	2
A.01.B	DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE	4
A.01.C	INQUADRAMENTO AMBIENTALE DEL SITO	11
A.01.C.1	Inquadramento Geografico	11
A.01.C.2	Inquadramento Geologico e Geomorfologico	15
A.01.C.3	Inquadramento Idrogeologico	22
A.01.D	FASI DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	25
A.01.E	OPERE CIVILI	26
A.01.E.1	Impianto fotovoltaico	26
A.01.E.2	Viabilità interna e piazzali	27
A.01.E.3	Cabine elettriche, cabina di impianto (di consegna) e vano tecnico	27
A.01.E.4	Recinzioni	28
A.01.E.5	Cavidotto in MT	28
A.01.E.6	Modalità di esecuzione degli scavi	30
A.01.F	SITI A RISCHIO POTENZIALE DI INQUINAMENTO E DETERMINAZIONE NUMERO E CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI INDAGINE	32
A.01.G	VOLUMETRIE PREVISTE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	38
A.01.H	VOLUMETRIE E MODALITA' DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO DA RIUTILIZZARE IN SITO	41
A.01.I	CONCLUSIONI	42
A.01.L	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	44

	<p align="center">Impianto agrivoltaico con fotovoltaico a terra del tipo a inseguimento solare da ubicare nei Comuni di Bicinicco e Santa Maria La Longa (Provincia di Udine)</p> <p align="center">Ditta Proponente: ATLAS SOLAR 1 s.r.l.</p>	 <p align="center">Studio di Ingegneria</p>
---	---	---

A.01.A PREMESSA

Il progetto in oggetto riguarda la realizzazione di due impianti agrivoltaici con fotovoltaico a terra allacciati alla Rete Nazionale in MT.

Gli impianti agrivoltaici di cui la presente sorgeranno nella Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Bicinicco e Santa Maria La Longa (Provincia di Udine) e saranno allacciati alla rete MT di e-distribuzione nazionale tramite realizzazione di due nuove cabine di consegna collegate in antenna da cabina primaria AT/MT PALMANOVA, il tutto secondo i preventivi di connessione aventi codice di rintracciabilità n. 269434952 e n. 269414989, trasmessi da e-distribuzione e allegati al progetto. Le opere necessarie alla realizzazione della connessione riguardano la costruzione di due linee elettriche di media tensione (20 KV) in cavo interrato elicordato ad elica, atta al collegamento di nuove due cabine di consegna (ciascuna costituita da un blocco prefabbricato), ubicate nel Comune di Bicinicco (UD) al foglio di mappa n. 11, particella n. 113.

Gli impianti fotovoltaici avranno potenze rispettivamente di:

- Bicinicco - Santa Maria La Longa 1 (nel seguito "Bicinicco 1"): potenza massima di picco 6668 kW e potenza nominale in uscita dagli apparati di conversione (AC) pari a 5860 kW;
- Bicinicco - Santa Maria La Longa 2 (nel seguito "Bicinicco 2"): potenza massima di picco 6668 kW e potenza nominale in uscita dagli apparati di conversione (AC) pari a 5860 kW.

L'area d'interesse (di seguito "Area") per la realizzazione degli impianti agrivoltaici a terra ad inseguimento mono-assiale, presenta un'estensione complessiva di circa 25,3 ha, nella disponibilità del proponente, anche se la superficie reale d'intervento risulta essere di circa 16,70 ha.

L'Area è ubicata Regione Friuli Venezia Giulia, nei Comuni di Bicinicco (UD) e Santa Maria la Longa (UD), ad una quota di circa 35 ml s.l.m. e non risulta acclive ma piuttosto pianeggiante.

La predetta "area" sarà adibita ai due impianti agrivoltaici e saranno così distinte:

- Impianto denominato "Bicinicco - Santa Maria La Longa 1" – superficie complessiva a disposizione del proponente pari a circa mq 152.316 e superficie d'intervento pari a circa mq 89000;

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	2	45

	<p align="center">Impianto agrivoltaico con fotovoltaico a terra del tipo a inseguimento solare da ubicare nei Comuni di Bicinicco e Santa Maria La Longa (Provincia di Udine)</p> <p align="center">Ditta Proponente: ATLAS SOLAR 1 s.r.l.</p>	 <p align="center">Studio di Ingegneria</p>
---	---	---

- Impianto denominato "Bicinicco - Santa Maria La Longa 2" – superficie complessiva a disposizione del proponente pari a circa mq 100.655 e superficie d'intervento pari a circa mq 78000.

Inoltre alla proposta d'intervento è previsto un impianto agricolo formato da agro-forestazione e realizzazione di un impianto apiario.

Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo che si intende riutilizzare in sito devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, la non contaminazione sarà verificata ai sensi dell'allegato 4 del DPR 120/2017.

Poiché il progetto risulta essere sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del DPR 120/2017, è stato redatto il presente "Piano Preliminare di Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo" che riporta:

- La descrizione delle opere da realizzare comprese le modalità di scavo;
- L'inquadramento ambientale del sito;
- La proposta di piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o prima dell'inizio dei lavori;
- Le volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;
- Le modalità e le volumetrie delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	3	45

	<p align="center">Impianto agrivoltaico con fotovoltaico a terra del tipo a inseguimento solare da ubicare nei Comuni di Bicinicco e Santa Maria La Longa (Provincia di Udine)</p> <p align="center">Ditta Proponente: ATLAS SOLAR 1 s.r.l.</p>	 <p align="center">Studio di Ingegneria</p>
---	---	---

A.01.B DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE

Il presente progetto è finalizzato alla costruzione di due impianti agrivoltaici, per la produzione di energia elettrica da ubicarsi nei Comuni di Bicinicco (Provincia di Udine) e di Santa Maria La Longa (Provincia di Udine) e con l'installazione delle opere ed infrastrutture connesse (cabine elettriche di conversione e smistamento, cabine di impianto, rete elettrica interrata a 20 kV, strade e opere connesse).

I pannelli fotovoltaici sono montati su strutture di supporto che consentono l'orientamento automatico Est - Ovest dei moduli fotovoltaici in funzione della posizione del Sole durante il corso della giornata. Le strutture di supporto impiegate vengono denominate "**tracker a inseguimento**" e permettono di massimizzare la produzione di energia elettrica mantenendo un'inclinazione sempre ottimale con la direzione di propagazione dei raggi solari.

Per ciò che attiene agli elementi del campo fotovoltaico, si rimanda a quanto già esposto nell'elaborato "Relazione Tecnica Impianto Fotovoltaico".

I terreni di progetto ricadenti nel territorio comunale di Bicinicco (UD) e Santa Maria La Longa (UD) e sono classificati, nei vigenti Strumenti Urbanistici, come segue:

Comune di Bicinicco:

Aree ubicate in zona omogenea "E5" – art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione:

"E5" – "di preminente interesse agricolo" – "Le zone E5 – Di preminente interesse agricolo identificano quei territori caratterizzati da un utilizzo agricolo che differentemente dagli altri territori non si manifestano con caratteristiche o valori paesaggistici elevati, ma che hanno una loro conformazione ed un loro utilizzo finalizzato unicamente alla produzione agricola".

Comune di Santa Maria La Longa:

Aree ubicate in zona omogenea "E6" – art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione:


"Zona E6" – "DEGLI AMBITI DI INTERESSE AGRICOLO" – Comprende le parti del territorio comunale destinate all'attività agricola e all'insediamento delle strutture connesse con la gestione agricola dei fondi e delle attività zootecniche".

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	4	45

Il tracciato interrato del cavidotto interessa il territorio comunale di Bicinicco, Santa Maria La Longa e Palmanova; le opere di connessione, tutte previste con elettrodotti interrati, verranno realizzate su viabilità esistente.

Di seguito si riporta l'elenco delle zone omogenee dei PRGC dei comuni suddetti che verranno attraversate dai singoli tratti stradali sui quali saranno realizzati gli elettrodotti.

Comune di Bicinicco:

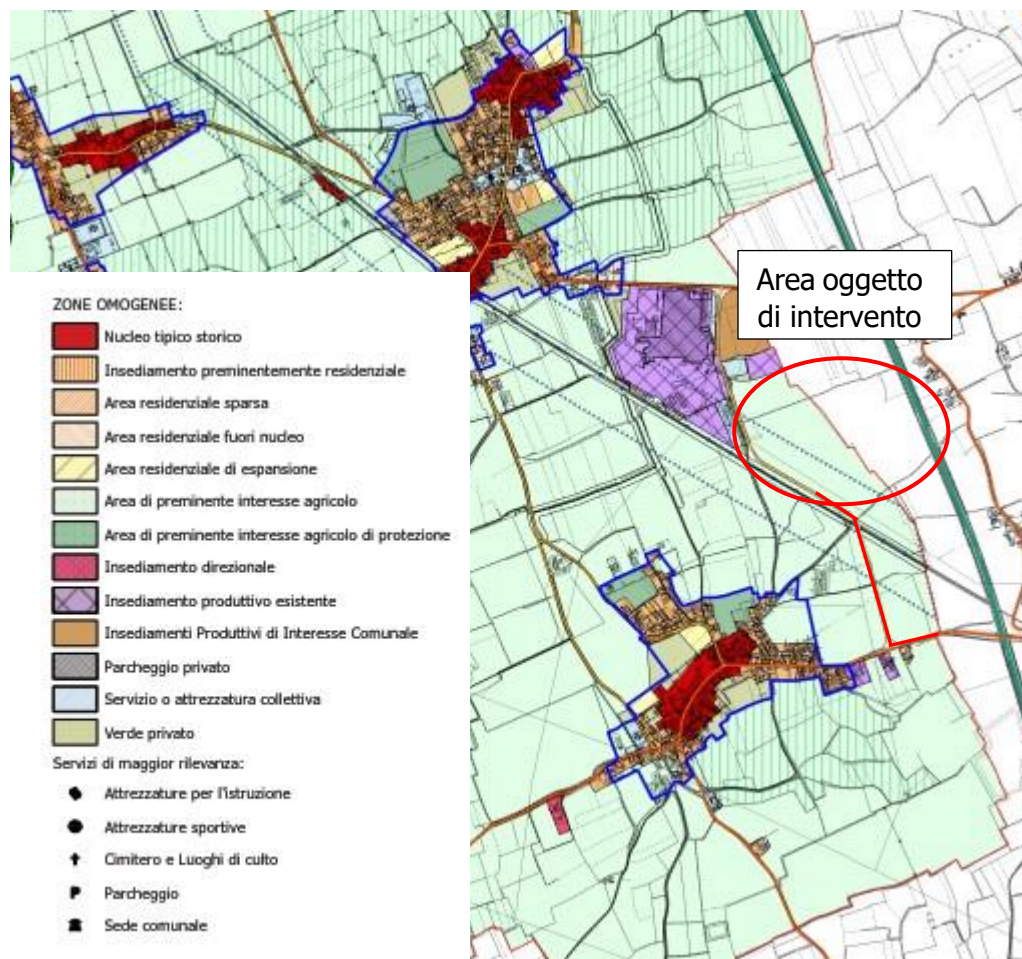


Estratto del PRGC del comune di Bicinicco con percorso dell'elettrodotta (in rosso)

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	5	45


Denominazione tratto stradale interessato dagli elettrodotti interrati	Zona omogenea del PRGC
Strada comunale	E5 - Zona di preminente interesse agricolo
Via G. Verdi	E5 - Zona di preminente interesse agricolo

Comune di Santa Maria La Longa:

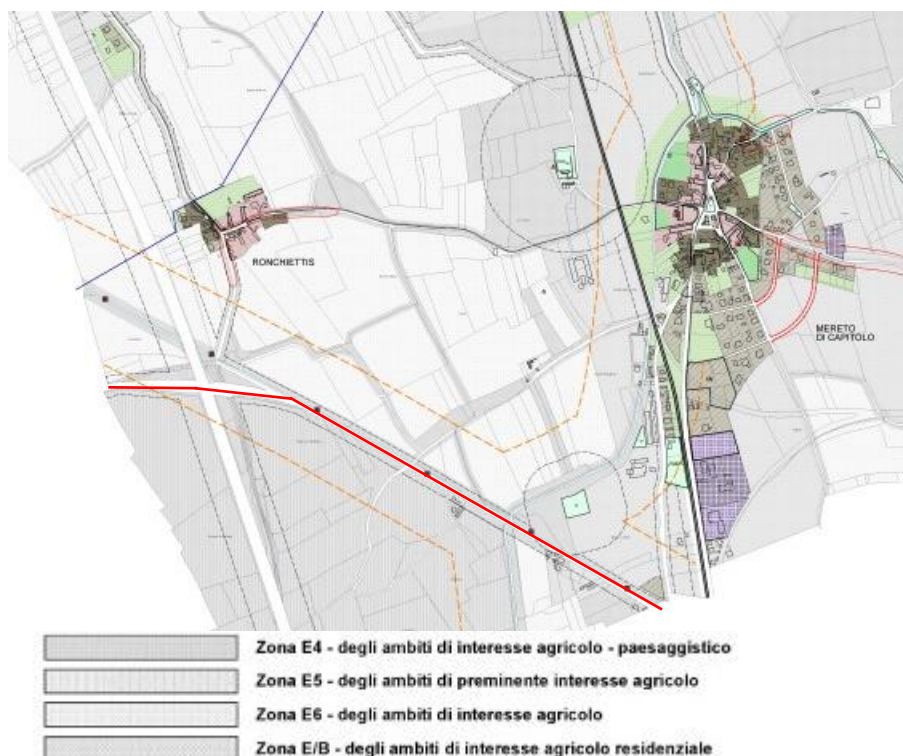


Estratto del PRGC del comune di Santa Maria La Longa con percorso dell'elettrodotto (in rosso)

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	6	45




Denominazione tratto stradale interessato dagli elettrodotti interrati	Zona omogenea del PRGC
SP71	E4-E5-E6 e E6/B

Comune di Palmanova:

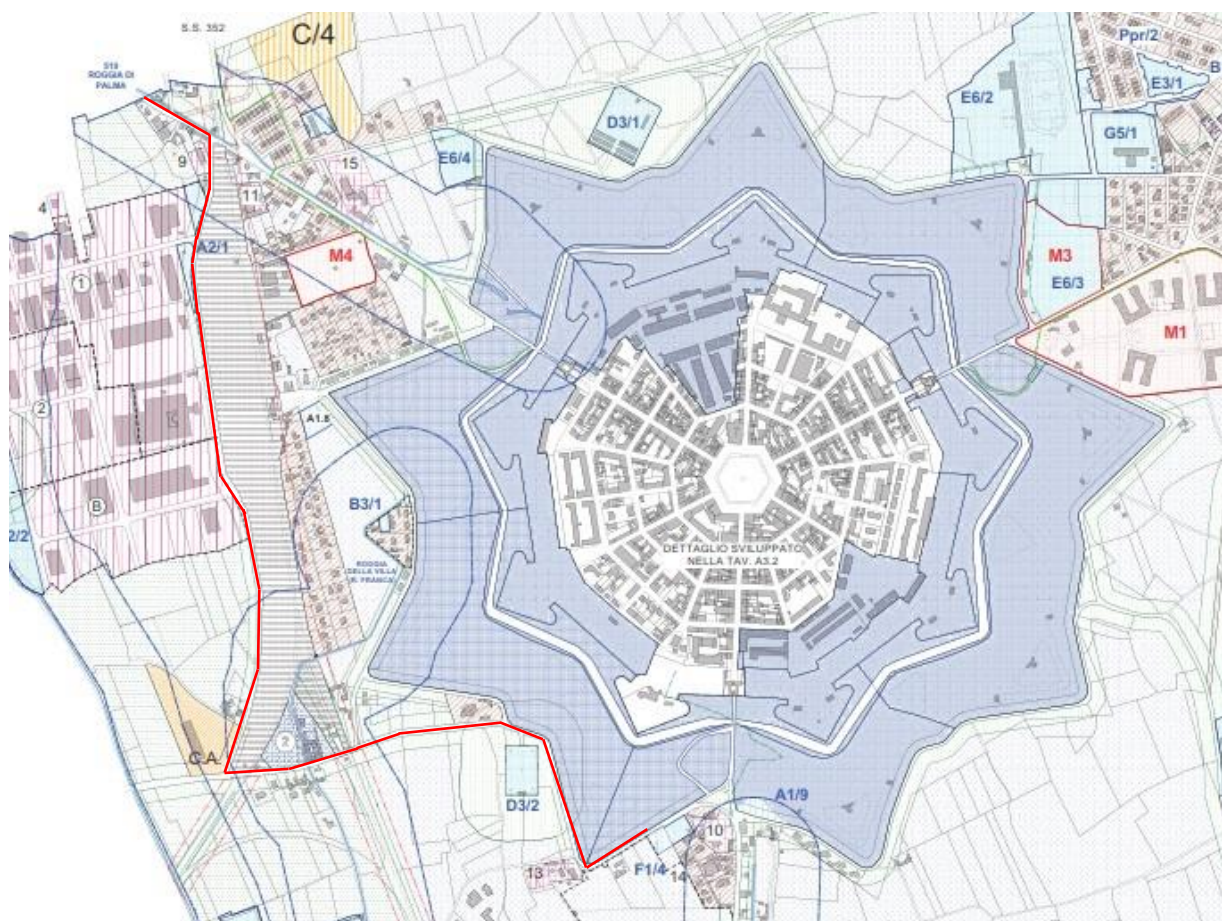









Estratto del PRGC del comune di Palmanova con percorso dell'elettrodotto (in rosso)

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	7	45



LEGENDA

	Perimetro dettaglio tav. A3.2 (scala 1:2.000), con isolati edificabili
	Limite di piano attuativo
	Zona demaniale delle caserme e della cinta fortificata (artt. 10, 11, 12)
	Zona B1, residenziale semintensiva di ristrutturazione ed integrazione dei borghi (art. 13)
	Zona E0 di pertinenza dei borghi (art. 14)
	Zona EV verde di filtro e riqualificazione ambientale (art. 32)
	Zona B2, residenziale di completamento (art. 15) art. 16 <i>soppresso con variante 75</i>
	Zona C, di espansione (art. 17)
	Zona D2-A, industriale comunale già attuata (art. 18)
	Zona D2-B, industriale comunale di espansione (art. 18)
	Zona D3, degli insediamenti industriali esistenti (art. 19)
	Zona H3, degli insediamenti terziari esistenti (art. 20)

	Zona agricola. ((art. 21)
	Zona H , del Consorzio Agrario C.A. ((art. 21 bis)
	Zona E7, agricola con insediamenti rurali (art. 21 ter)
	Zona E4, agricola con vincolo di tutela ambientale (art. 22)
	Zona M, militare esterna (art. 23)
	Zona S2, attrezzature e servizi (art. 24) esistenti  di progetto
	Zona V, vincoli stradali e cimiteriali (art. 27)
	Tronchi viari di progetto (art. 35)
	Vincoli ferroviari
	Zone con falda affiorante (F) - (art. 28)
	Vincolo ex L. 431 (n. e nome corso d'acqua) (art. 26)
	Ciclopista
	Zona RFI (art. 61)
	Canale scolmatore in Destra Torre (art. 28)

Denominazione tratto stradale interessato dagli elettrodotti interrati	Zona omogenea del PRGC
SP71	Zona agricola
Via Mazzini	RF1 – D2A- zona agricola-H
SR252	H3-RF1- zona agricola-E4-B2-D3

	<p align="center">Impianto agrivoltaico con fotovoltaico a terra del tipo a inseguimento solare da ubicare nei Comuni di Bicinicco e Santa Maria La Longa (Provincia di Udine)</p> <p align="center">Ditta Proponente: ATLAS SOLAR 1 s.r.l.</p>	 <p align="center">Studio di Ingegneria</p>
---	---	---

All'interno del campo fotovoltaico saranno previsti i seguenti elementi:

- strutture per il supporto dei moduli (tracker mono-assiali) ciascuna alloggiante 24 moduli fotovoltaici disposti in verticale su due fila in modalità "portrait"; tali strutture di supporto costituiscono una stringa elettrica e saranno sorrette da profilati in metallo infissi nel terreno.
- 958 stringhe composte da altrettanti tracker;
- 22992 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino della tipologia Jinko Solar – modello bifacciale da 580 W o altro prodotto simile e/o di potenza elettrica tale da avere la stessa potenza totale stabilita in progetto;
- 4 inverter della tipologia SMA Solar Technology del tipo Sunny Central 2930-UP, o altro prodotto simile dotati di trasformatore, il tutto rinchiuso in strutture denominate "Power Station" dotate anche di vani tecnici per i servizi ausiliari e da ubicare all'interno della proprietà secondo le posizioni indicate nell'elaborato planimetria impianto;
- 4 containers in metallo adibito a vano tecnico per la gestione dell'impianto apiario;
- cabina principali di impianto in struttura prefabbricata poggiante su piastra in cemento per ogni sottocampo;
- viabilità interna al parco per le operazioni di costruzione e manutenzione dell'impianto
- il passaggio degli elettrodotti interrati interni al campo in BT/MT (lunghezza complessiva di ml $550+2100+1500=4150$ ml);
- aree di stoccaggio materiali posizionate in diversi punti del parco, le cui caratteristiche (dimensioni, localizzazione, accessi, etc) verranno decise in fase di progettazione esecutiva;
- cavidotto interrato in MT (20 kV) di collegamento tra le cabine di campo (cabine inverter) e la cabina di consegna;
- rete telematica di monitoraggio interna per il controllo dell'impianto mediante trasmissione dati via modem o tramite comune linea telefonica;
- piantumazione di essenze arboree e piante con associato un apiario per la coltivazione delle api e la produzione di miele.

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	9	45

	<p align="center">Impianto agrivoltaico con fotovoltaico a terra del tipo a inseguimento solare da ubicare nei Comuni di Bicinicco e Santa Maria La Longa (Provincia di Udine)</p> <p align="center">Ditta Proponente: ATLAS SOLAR 1 s.r.l.</p>	 <p align="center">Studio di Ingegneria</p>
---	---	---

Per quanto riguarda le opere di connessione del campo fotovoltaico alla rete nazionale, queste sono state elencate da e-distribuzione nei rispettivi "preventivi di connessione" e riguardano la costruzione di due linee elettriche di media tensione (20 KV) in cavi interrati e necessarie al collegamento di due nuove cabine di connessione (costituite ciascuno da un blocco prefabbricato), ubicate ciascuna all'interno dell'area a disposizione del proponente, nel Comune di Bicinicco (UD), rispettivamente al foglio di mappa n. 11, particella n. 113; le opere di connessione prevedono anche, per il campo denominato "Bicinicco-Santa Maria la Longa 1", il collegamento della rispettiva cabina di consegna (Cabina FTV Felettis 1) alla linea esistente di E-Distribuzione esistente nell'area oggetto dell'intervento, attraverso l'inserimento a questa utilizzando un sostegno esistente.

Le opere di connessione, costituite da elettrodotto interrato, ricadono in parte nel Comune di Bicinicco (UD), in parte nel Comune di Santa Maria la Longa (UD) e in parte nel comune di Palmanova (UD).

Per quanto riguarda l'elettrodotto interrato di collegamento del campo fotovoltaico alla cabina primaria di e-distribuzione, questo avrà una lunghezza di circa 5,7 km (5680 ml) e percorrerà la viabilità esistente.

Saranno posizionate due cabine di consegna (una per il campo agrivoltaico "Bicinicco – Santa Maria la Longa 1" e una per il campo agrivoltaico "Bicinicco – Santa Maria la Longa 2" e denominate rispettivamente "Cabina FTV Felettis 1" e "Cabina FTV Felettis 2"). La "cabina FTV Felettis 1" si collegherà alla rete elettrica esistente di e-distribuzione sia con un elettrodotto elicordato ad elica (20 KV) in prossimità di un sostegno esistente internamente al sito d'intervento e sia alla cabina primaria di e-distribuzione "Palmanova". La "cabina FTV Felettis 2" si collegherà alla rete elettrica esistente di e-distribuzione con un elettrodotto elicordato ad elica (a 20 KV) alla cabina primaria di e-distribuzione "Palmanova".

In particolare i due elettrodotti interrati (costituiti ciascuno da una terna di cavi elicordati ad elica in alluminio da 240 mmq), nel percorso di connessione, attraverseranno una viabilità interna, asfaltata, per circa 950 ml per poi imboccare via G. Verdi e percorrerla per circa 200 ml. Si raggiunge la SP71 e la si percorre per circa 500 ml fino a intersecare via Roiale. Si percorre ancora la SP71 per circa 1200 ml sino a raggiungere Viale San Marco, quest'ultimo interessato per circa 100 ml sino ad

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	10	45

	<p align="center">Impianto agrivoltaico con fotovoltaico a terra del tipo a inseguimento solare da ubicare nei Comuni di Bicinicco e Santa Maria La Longa (Provincia di Udine)</p> <p align="center">Ditta Proponente: ATLAS SOLAR 1 s.r.l.</p>	 <p align="center">Studio di Ingegneria</p>
---	---	---

intersecare Via Mazzini. Si procederà su via Mazzini per circa 1480 ml sino a raggiungere la SR 252 che verrà interessata per un tratto di circa 1250 ml fino ad arrivare alla cabina primaria "Palmanova" di e-distribuzione, punto in cui ci si immetterà con l'elettrodotto interrato.

Lungo tale percorso si dovranno attraversare dei canali d'acqua, la sede autostradale (A23 tratto Palmanova – Tarvisio) e la ferrovia, il superamento dei quali sarà possibile applicando la tecnica del "no dig" o "perforazione teleguidata" che permette la posa in opera di tubazioni e cavi interrati senza ricorrere agli scavi a cielo aperto e senza compromettere il naturale flusso del corso d'acqua.

A.01.C INQUADRAMENTO AMBIENTALE DEL SITO

A.01.C.1 Inquadramento Geografico

L'Area è ubicata Regione Friuli Venezia Giulia, nei Comuni di Bicinicco (UD) e Santa Maria la Longa (UD), ad una quota di circa 35 ml s.l.m. e non risulta acclive ma piuttosto pianeggiante.

L'Area oggetto dell'intervento è ubicata geograficamente a Sud-Est del centro abitato del Comune di Bicinicco e a Sud-Ovest del Comune di Santa Maria la Longa.

Le coordinate geografiche del sito sono:


	Geografiche WGS84	
	LAT	LONG
Sottocampo "Bicinicco - Santa Maria La Longa 1" (baricentro)	45.924811°	13.267729°

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	11	45



Impianto agrivoltaico con fotovoltaico a terra del tipo a inseguimento solare da ubicare nei Comuni di Bicinico e Santa Maria La Longa (Provincia di Udine)

Ditta Proponente: ATLAS SOLAR 1 s.r.l.




Studio di Ingegneria

	Geografiche WGS84	
	LAT	LONG
Sottocampo "Bicinico - Santa Maria La Longa 2" (baricentro)	45.925647°	13.270990°


L'area d'interesse per la realizzazione degli impianti agrivoltaici a terra ad inseguimento mono-assiale, presenta un'estensione complessiva di circa 25,3 ha, nella disponibilità del proponente, anche se la superficie reale d'intervento risulta essere di circa 16,70 ha.

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	12	45




Inquadramento su ortofoto dell'area oggetto dell'intervento

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	13	45

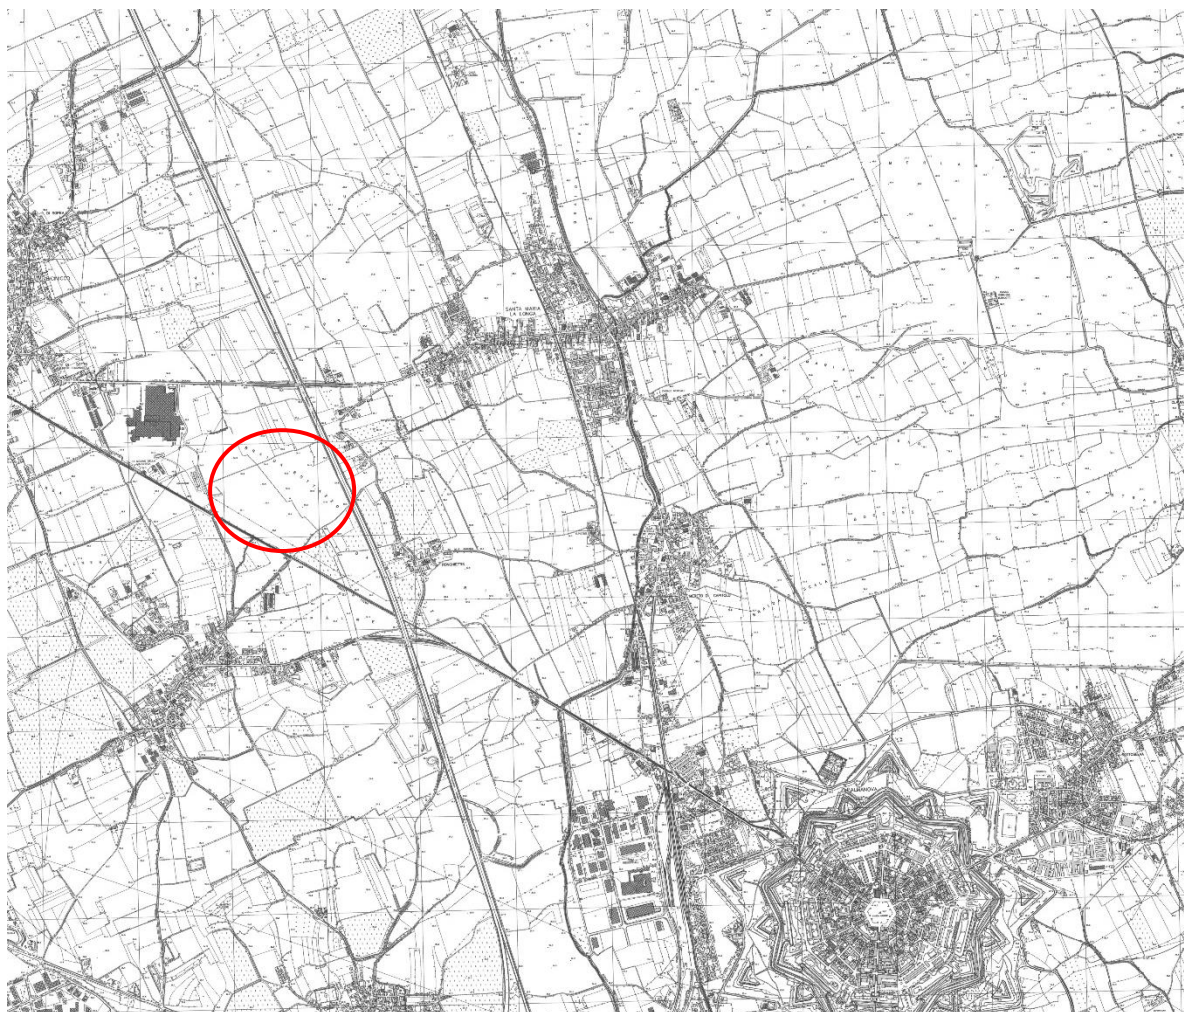

Inquadramento su Carta Tecnica Regionale dell'area oggetto dell'intervento

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	14	45

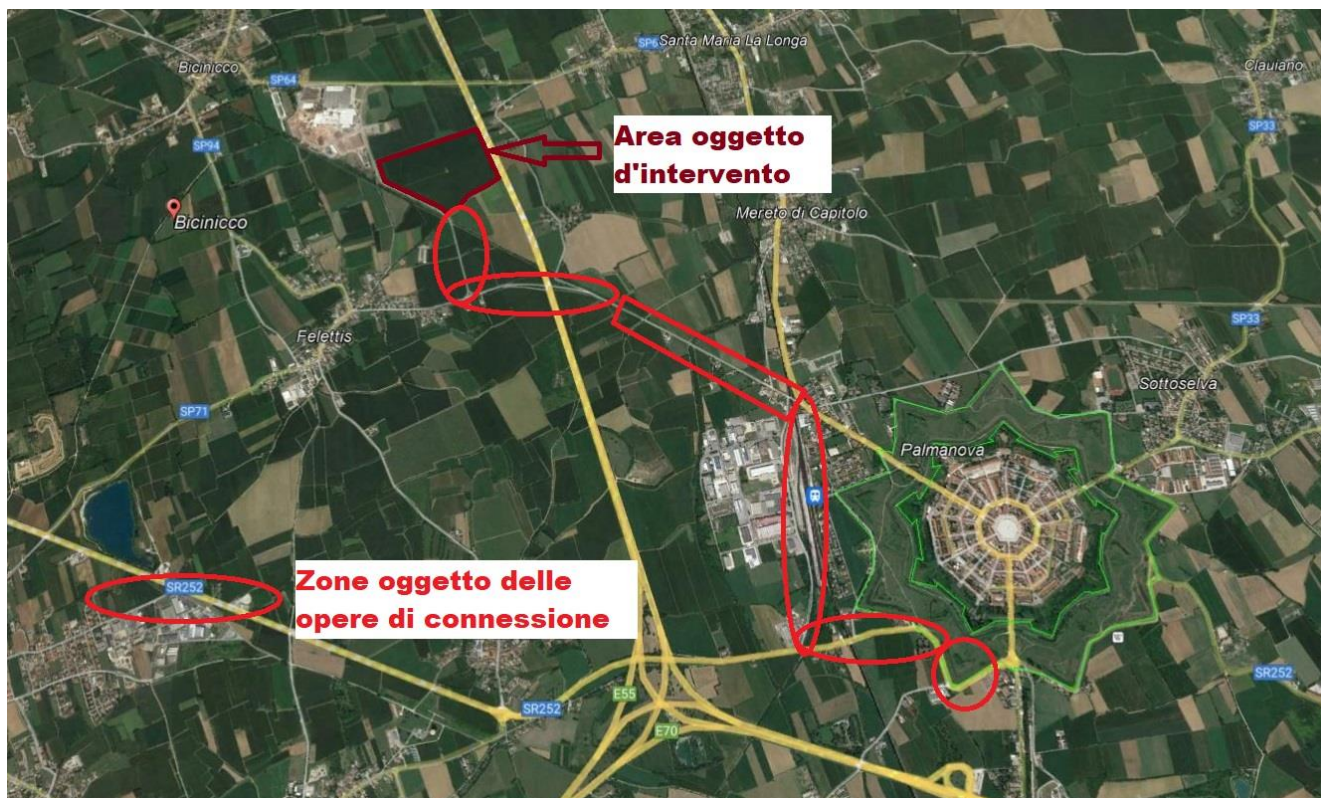

Vista d'insieme dell'impianto di connessione con collegamento cavi MT interrati su base ortofoto

A.01.C.2. Inquadramento Geologico e Geomorfologico

L'area di indagine fa parte geograficamente della porzione meridionale dell'Alta Pianura Friulana, qualche chilometro a monte della fascia delle risorgive.

I territori comunali di Santa Maria la Longa e Bicinicco si collocano in un settore di pianura che ha preso origine dalla sedimentazione di depositi fluvio-glaciali più volte rimaneggiati dalle acque di fusione dei ghiacciai quaternari, e trasportati dalla corrente del torrente Torre in epoca post glaciale. La situazione litologica rilevata è piuttosto omogenea.

Al di sotto della coltre di alterazione superficiale, spesso mediamente meno di un metro, sono presenti depositi alluvionali costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie con ciottoli. La frazione fine limoso

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	15	45


argillosa è presente in percentuale variabile.

Superficialmente si osservano delle fasce sviluppate prevalentemente in direzione N-S, di terreni prevalentemente limoso sabbiosi alternati ad altri schiettamente ghiaiosi. Questa diversificazione si osserva fino alla profondità massima di due metri.

Oltre tale profondità prevalgono le ghiaie.

Nel novembre 2021 lo scrivente ha effettuato un sopralluogo con esecuzione di quattro scavi di saggio, la cui posizione indicativa è riportata nel capitolo dedicato alle indagini.

Gli scavi sono stati realizzati nelle porzioni di lotto in cui lo spessore della coltre di alterazione è maggiore, ovvero dove le operazioni di aratura non raggiungono il tetto delle ghiaie. Tali porzioni erano visibili al momento dell'esecuzione degli scavi in quanto i terreni erano incolti ed erano stati arati. Tali aree sono chiaramente visibili anche dalle foto satellitari:

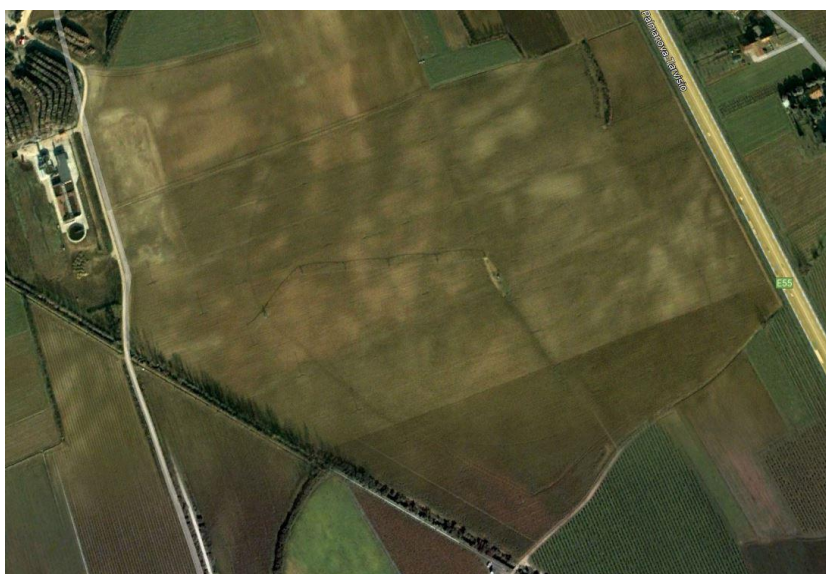


SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	16	45





	<p>Impianto agrivoltaico con fotovoltaico a terra del tipo a inseguimento solare da ubicare nei Comuni di Bicinico e Santa Maria La Longa (Provincia di Udine)</p> <p>Ditta Proponente: ATLAS SOLAR 1 s.r.l.</p>	 <p>Studio di Ingegneria</p>
---	--	--

Gli scavi hanno individuato la presenza di una coltre vegetale potente in media 60-70 centimetri, cui sottostà uno strato di transizione costituito da ghiaia e limo fino alla profondità massima di 1.20 metri. Oltre tale quota prevalgono le ghiaie sabbiose limose con sparsi ciottoli. Dalle tomografie elettriche è emerso che fino alla profondità di oltre 7 metri dal piano campagna la coltre alluvionale è omogenea.


SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	17	45



Stratigrafia scavi di saggio

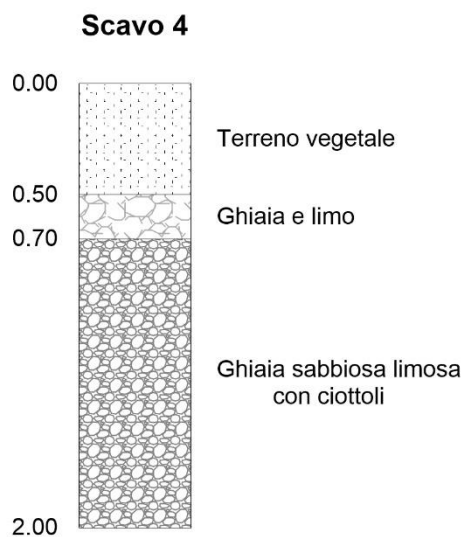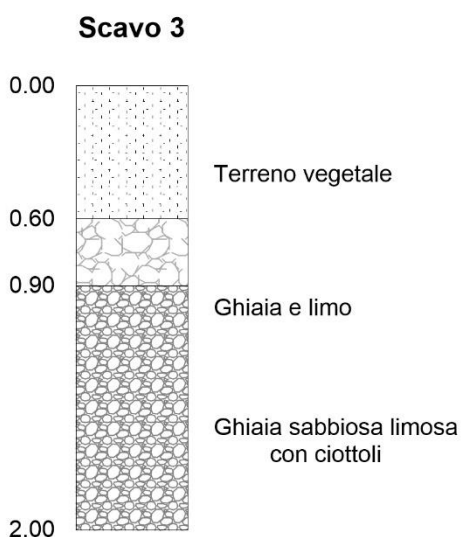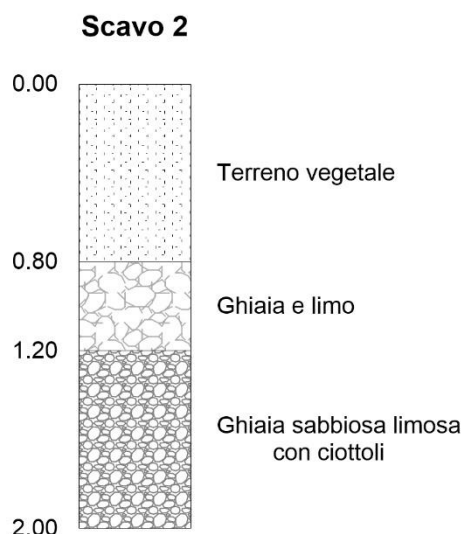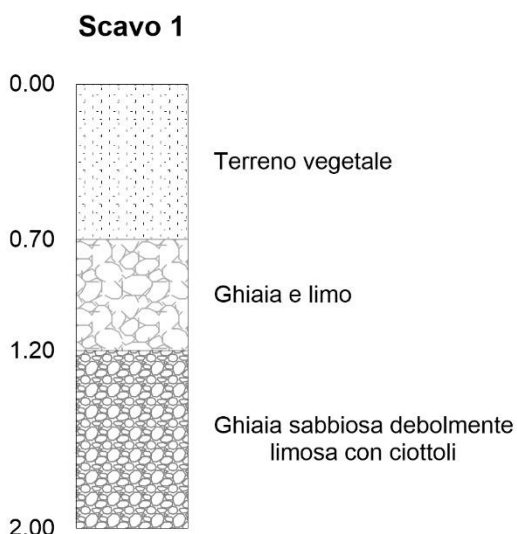

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	18	45


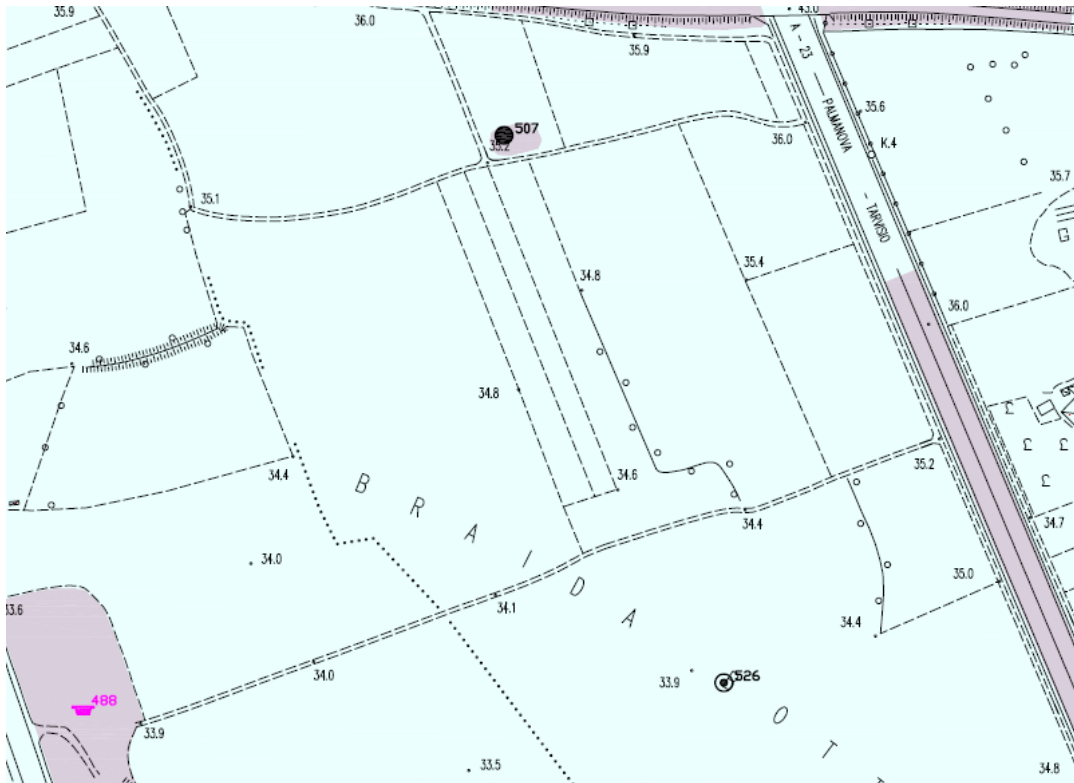


Estratto della carta geologica alla scala 1:5.000 – Servizio Geologico Regione FVG



TERRE CON STRATI DI LIMO E / O ARGILLA INFERIORI O UGUALI AL 10 %

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	19	45

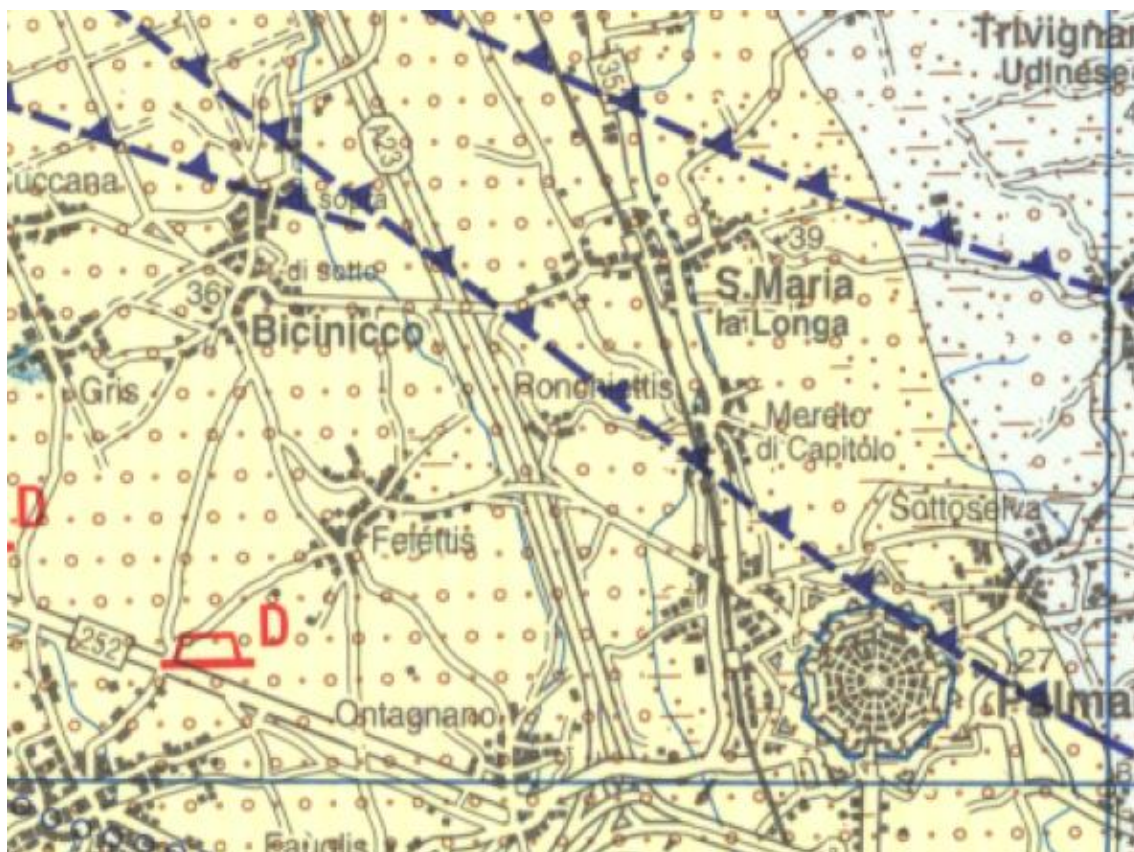


Estratto della carta geologica del Friuli Venezia Giulia alla scala 1:150.000


24


Sedimenti fluvioglaciali ed alluvionali della pianura. *Fluvioglacial and alluvial sediments of the alluvial plain. Pleistocene sup.*

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	20	45

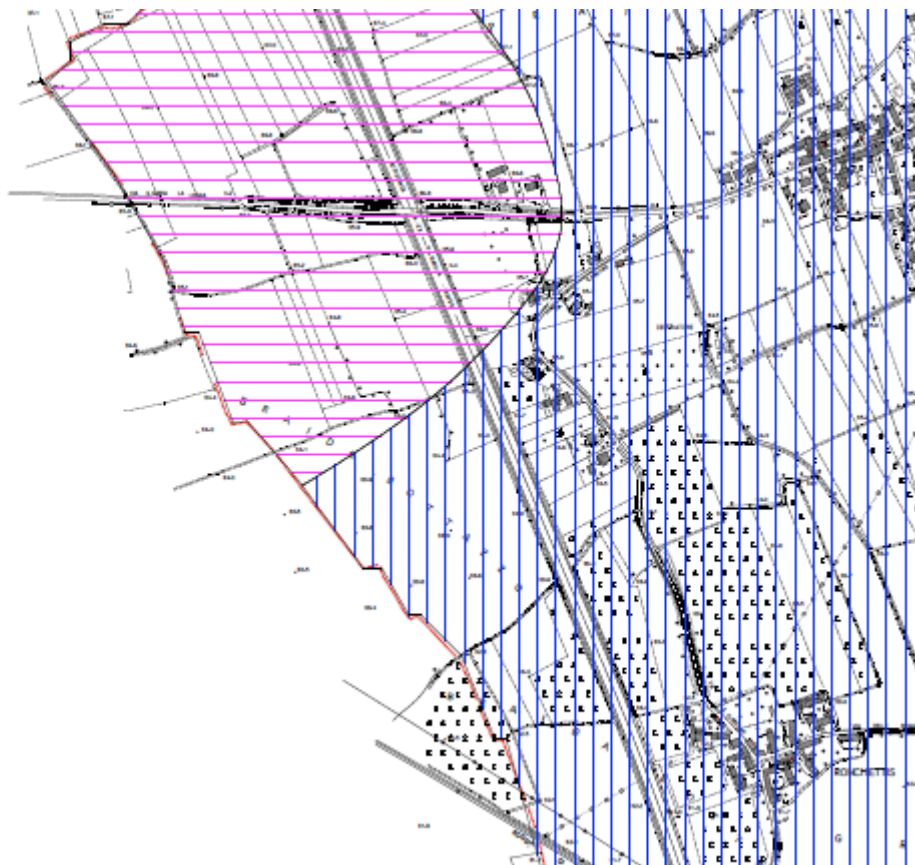

Carta geologica allegata al PRGC di Santa Maria la Longa

- 

Alluvioni prevalentemente ghiaiose ricoperte da strato terroso potente 30÷40 cm.
- 

Alluvioni prevalentemente ghiaiose ricoperte da strato terroso potente 40÷70 cm.

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	21	45

A.01.C.3. Inquadramento Idrogeologico


Le indicazioni inerenti la falda provengono dalla consultazione di dati bibliografici e da dati in possesso dallo scrivente.


L'area in cui verrà realizzato il campo fotovoltaico è posta tra i bacini idrografici del Cormor (posto ad ovest) e dell'Isonzo-Torre (ad est).

Il deflusso delle acque avviene verso sud, sia in fase di magra che di massimo impinguamento. Tale falda oscilla di una decina di metri, con valori minimi di soggiacenza di circa 8 metri


Per quanto concerne la permeabilità dei terreni presso il campo fotovoltaico, secondo le granulometrie riscontrate durante gli scavi, si ritiene che essi abbiano permeabilità discreta, dell'ordine di 10^{-5} m/s.

Valori indicativi dei coefficienti di permeabilità dei terreni in metri/secondo

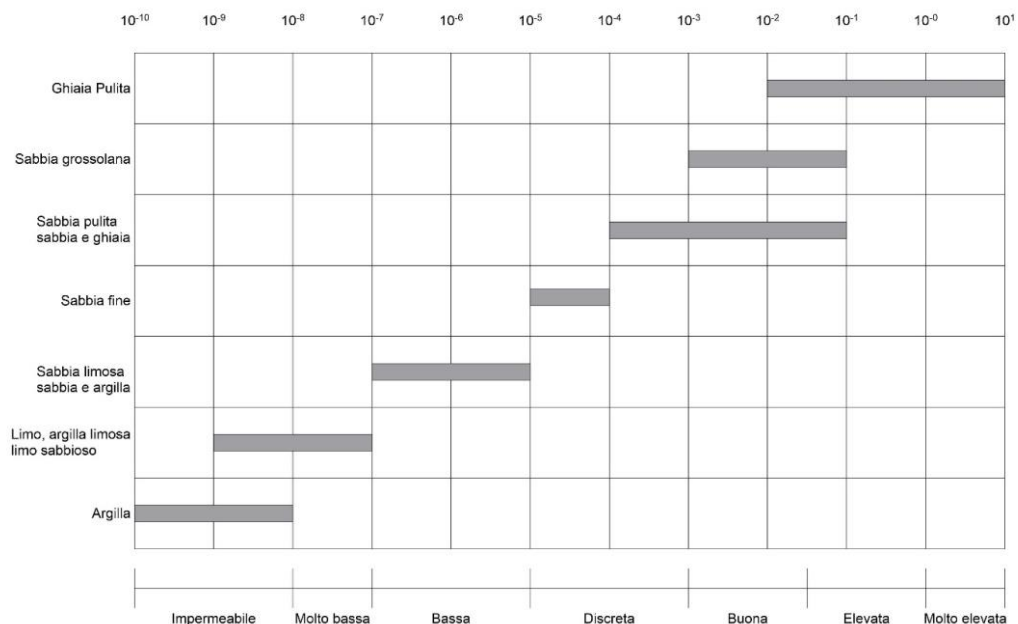

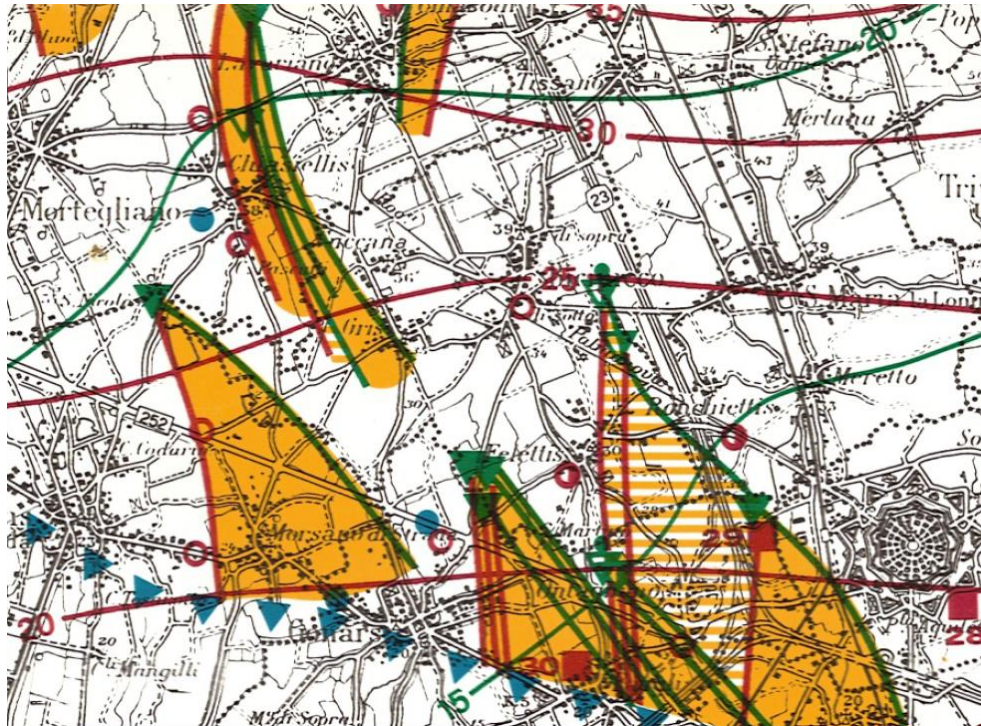


Estratto della Carta delle isofreatiche durante le fasi di massima e minima altezza della falda

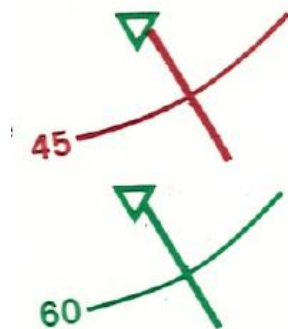


isofreatica della massima altezza della falda e direzione dei deflussi sotterranei in corrispondenza delle discariche

isofreatica della minima altezza della falda e direzione dei deflussi sotterranei in corrispondenza delle discariche

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	23	45

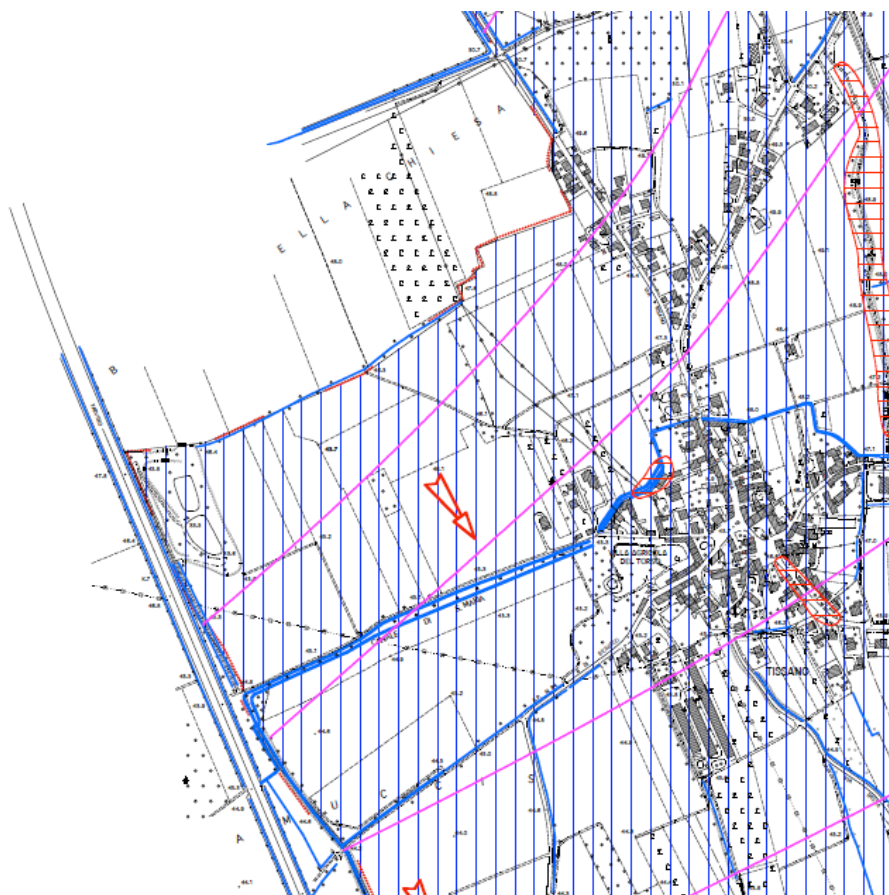

Carta idrogeologica allegata al PRGC del comune di Santa Maria la Longa



Aree con falda a profondità > di 10 m



30 Isofreatica in m s.l.m.m. (posizione media)

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	24	45

	<p align="center">Impianto agrivoltaico con fotovoltaico a terra del tipo a inseguimento solare da ubicare nei Comuni di Bicinicco e Santa Maria La Longa (Provincia di Udine)</p> <p align="center">Ditta Proponente: ATLAS SOLAR 1 s.r.l.</p>	 <p align="center">Studio di Ingegneria</p>
---	---	---

A.01.D FASI DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Gli interventi di progetto, analizzando le diverse categorie di lavoro, per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, consistono nel:

- Taglio e pulizia dell'intera area oggetto d'intervento dalla vegetazione esistente;
- Predisposizione del cantiere attraverso i rilievi sull'area e picchettamento delle aree di intervento;
- Apprestamento delle aree di cantiere;
- Realizzazione delle piste d'accesso all'area di intervento dei mezzi di cantiere;
- Livellamento e sistemazione del terreno con mezzi meccanici tipo escavatore, terna, ruspa;
- Formazione di percorso carrabile di ispezione lungo il perimetro del fondo e all'interno dell'area con spianamento e livellamento del terreno con misto di cava da eseguirsi con mezzi meccanici tipo escavatore, a sua volta servito da camion per il carico e scarico del materiale;
- Realizzazione delle opere di recinzione lungo il perimetro dell'area d'intervento costituita da montanti metallici disposti ad interasse di ml. 2,00 con rete metallica interposta e rinforzata da controventature, anch'esse in profilati metallici.
- Realizzazione di impianto d'illuminazione, di videosorveglianza e antintrusione dell'intero impianto;
 - Fissaggio delle strutture di supporto attraverso apposita macchina battipalo;
 - Costruzione dell'impianto fotovoltaico costituito da struttura metallica portante (tracker monoassiali dotati di motore per permettere la rotazione dei pannelli bifacciali), previo scavo per l'interramento dei cavi elettrici per media e bassa tensione di collegamento alle cabine di trasformazione ed alla cabina di consegna;
 - Fondazioni delle cabine inverter, container per vano tecnico e della cabina principale d'impianto;
 - Posizionamento delle cabine elettriche (con inverter, trasformatore e apparati elettrici), del vano tecnico in metallo e della cabina di consegna;
 - Montaggio strutture di supporto;
 - Cavidotti interrati interni: opere edili;

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	25	45

	<p align="center">Impianto agrivoltaico con fotovoltaico a terra del tipo a inseguimento solare da ubicare nei Comuni di Bicinicco e Santa Maria La Longa (Provincia di Udine)</p> <p align="center">Ditta Proponente: ATLAS SOLAR 1 s.r.l.</p>	 <p align="center">Studio di Ingegneria</p>
---	---	---

- Cavidotti interrati interni: opere elettriche;
- Realizzazione dei collegamenti elettrici;
- Assemblaggio, sulle predette strutture metalliche portanti preinstallate, di pannelli fotovoltaici, compreso il relativo cablaggio;
- Conferimento inerti provenienti dagli scavi, dai movimenti terra;
- A completamento dell'opera, smobilitazione cantiere e sistemazione finale del terreno con conseguente collaudo delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche.

In relazione alla lunghezza del collegamento la realizzazione dell'opera avverrà per fasi sequenziali di lavoro che permettano di contenere le operazioni in un tratto limitato della linea in progetto, avanzando progressivamente sul territorio.

In linea di principio le operazioni si articoleranno secondo le seguenti fasi:

- realizzazione delle infrastrutture temporanee di cantiere;
- apertura della fascia di lavoro e scavo della trincea;
- posa dei cavi e realizzazione delle giunzioni;
- ricopertura della linea e ripristini.

In casi particolari, in particolare in corrispondenza di attraversamenti, si potrà procedere anche con modalità diverse da quelle su esposte. A titolo di esempio si evidenzia che in alcuni casi specifici, soprattutto nel caso di attraversamenti di canali idrici esistenti, potrebbe essere necessario procedere alla posa del cavo con perforazione teleguidata.

A.01.E OPERE CIVILI

A.01.E.1 Impianto fotovoltaico

L'area di impianto si presenta nella sua configurazione naturale sostanzialmente pianeggiante. Al fine della posa delle strutture di supporto per i moduli fotovoltaici, sarà necessaria una pulizia propedeutica del terreno dalle piante preesistenti e alla sistemazione finale del terreno; l'adozione

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	26	45

	<p align="center">Impianto agrivoltaico con fotovoltaico a terra del tipo a inseguimento solare da ubicare nei Comuni di Bicinicco e Santa Maria La Longa (Provincia di Udine)</p> <p align="center">Ditta Proponente: ATLAS SOLAR 1 s.r.l.</p>	 <p align="center">Studio di Ingegneria</p>
---	---	---

della soluzione a palo infisso senza fondazioni ridurrà praticamente a zero la necessità di livellamenti localizzati.

Il profilo generale del terreno non sarà comunque modificato, lasciando così intatto il profilo orografico preesistente del territorio interessato. Né saranno necessarie opere di contenimento del terreno.

In generale gli interventi di spianamento e di livellamento, dovendo essere ridotti al minimo, saranno ottimizzati in fase di direzione lavori.

Il materiale di risulta dalle predette lavorazioni potrà essere riutilizzato nelle fasi di sistemazione del terreno e della viabilità interna, previo campionamento dei relativi materiali; il materiale non riutilizzabile sarà conferito in pubblica discarica.

A.01.E.2 Viabilità interna e piazzali

L'accesso ai tre sottocampi avverrà tramite appositi cancelli e la pista di accesso e la viabilità interna saranno ottenute, per la maggior parte della superficie, dalla riprofilatura del terreno lungo il perimetro dell'area e nella parte centrale della stessa.

In corrispondenza delle cabine elettriche, vano tecnico e cabina principale di impianto saranno realizzati dei piazzali a servizio delle stesse, sagomati in orizzontale e di dimensioni idonee a garantire la manovra degli automezzi di servizio. Essi saranno realizzate in misto di cava di spessore medio 20 cm posto in opera sopra il terreno precedentemente modellato e compattato.

La viabilità interna, costituita dalle piste perimetrali e da quelle di separazione tra i vari settori del campo (della larghezza di ml 3,00), sarà realizzata anch'essa da misto di cava rullato di spessore medio 20 cm, posto in opera sopra il terreno precedentemente modellato e compattato.


Non si rendono necessarie opere di drenaggio delle acque superficiali in quanto non sono previste aree impermeabilizzate.

A.01.E.3 Cabine elettriche, cabina di impianto (di consegna) e vano tecnico

Si prevede la posa di:

- 4 cabine elettriche di campo "Power Station" contenenti l'inverter, il trasformatore e vano per collegamenti elettrici aventi dimensioni cadauna di 6,06 ml x 2,44 ml per un'altezza fuori terra

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	27	45

	<p align="center">Impianto agrivoltaico con fotovoltaico a terra del tipo a inseguimento solare da ubicare nei Comuni di Bicinicco e Santa Maria La Longa (Provincia di Udine)</p> <p align="center">Ditta Proponente: ATLAS SOLAR 1 s.r.l.</p>	 <p align="center">Studio di Ingegneria</p>
---	---	---

di circa 3,00 ml; tali cabine saranno posati su un basamento in calcestruzzo armato dello spessore di cm. 40 e di dimensioni esterne pari a 3,30 ml x 6,90 ml.;

- 4 container da adibire a vani tecnici, di dimensioni di 11,90 ml x 2,40 ml per un'altezza fuori terra di circa 3,33 ml (di cui 2,83 ml altezza del box e 0,50 altezza dal piano campagna); questa struttura poggerà su plinti di cm 40 x 40 e altezza pari a cm. 50 e sorgerà su una piastra di fondazione dello spessore di cm 40 avente le dimensioni pari a ml 13,60 x ml 2,60;
- 2 cabine principali di impianto in moduli prefabbricati delle dimensioni di ml 9,38 x ml 2,48 posate su un basamento in calcestruzzo armato dello spessore di cm. 40 e di dimensioni esterne pari a 12,65 ml x 3,00 ml.;

A.01.E.4 Recinzioni

Per garantire la sicurezza dell'impianto, l'area di pertinenza sarà delimitata da una recinzione con rete metallica integrata da un impianto di illuminazione su pali, da un impianto di allarme antintrusione e di videosorveglianza.

Tale recinzione sarà costituita da montanti metallici disposti ad interasse di ml. 2,00 con rete metallica interposta e rinforzata da controventature, anch'esse in profilati metallici.

I montanti saranno resi solidali al terreno attraverso l'infissione degli stessi nel terreno; l'altezza totale della recinzione sarà pari a ml. 2,30 fuori terra.

A.01.E.5 Cavidotto in MT

Per quanto riguarda le opere di connessione del campo fotovoltaico alla rete nazionale, queste sono state elencate da e-distribuzione nel relativo "preventivo di connessione".

In particolare le opere necessarie alla realizzazione della connessione riguardano la costruzione di tre linee elettriche di media tensione (20 KV) in cavo interrato elicordato ad elica in un unico scavo, necessarie al collegamento di due nuove cabine principali d'impianto (costituite da un blocco prefabbricato), ubicate ciascuna all'interno dell'area a disposizione del proponente, nel Comune di Bicinicco (UD), alla cabina primaria di e-distribuzione, prevista nel comune di Palamanova(UD).

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	28	45


	<p align="center">Impianto agrivoltaico con fotovoltaico a terra del tipo a inseguimento solare da ubicare nei Comuni di Bicinicco e Santa Maria La Longa (Provincia di Udine)</p> <p align="center">Ditta Proponente: ATLAS SOLAR 1 s.r.l.</p>	 <p align="center">Studio di Ingegneria</p>
---	---	---

La costruzione avverrà in rispetto delle norme CEI 11-17, garantendo l'integrità dei cavi attraverso l'impiego di robuste protezioni meccaniche in grado di assorbire le sollecitazioni statiche e dinamiche provenienti dal peso superiore e da un eventuale traffico veicolare. Il tracciato del cavidotto è rappresentato negli elaborati progettuali appositamente dedicati.

La realizzazione dell'opera avverrà per fasi sequenziali di lavoro che, data la lunghezza del cavidotto, verranno concentrate in circa 3 mesi di lavoro. In generale le operazioni si articoleranno secondo le fasi elencate nel modo seguente:

- Realizzazione delle infrastrutture temporanee di cantiere: non si prevedono piazzole temporanee di deposito delle bobine di cavi, di fatti queste verranno depositate nell'area di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e all'occorrenza trasportate direttamente nel punto di posa;
- Apertura della fascia di lavoro e scavo della trincea: tale fascia costituirà l'area di passaggio del cavidotto, dovrà essere la più continua possibile ed avere una larghezza tale da consentire la buona esecuzione dei lavori ed il transito dei mezzi di servizio.
- Posa dei cavi e realizzazione delle giunzioni: l'elettrodotta interrato sarà realizzato in modo da escludere, o rendere estremamente improbabile, la possibilità che avvenga un danneggiamento dei cavi in tensione provocato dalle opere sovrastanti (ad esempio, per rottura del sistema di protezione dei conduttori). Una volta realizzata la trincea si procederà con la posa dei cavi, che arriveranno nella zona di posa avvolti su bobine all'interno dei cavidotti precedentemente predisposti.
- Ricopertura della linea e ripristini: al termine delle fasi di posa e di rinterro si procederà alla realizzazione degli interventi di ripristino. La fase comprende tutte le operazioni necessarie per riportare il tracciato del cavidotto nelle condizioni ambientali precedenti la realizzazione dell'opera. Si procederà alle sistemazioni generali di linea, che consistono nella riprofilatura dell'area interessata dai lavori e nella riconfigurazione delle pendenze preesistenti, ricostruendo la morfologia originaria del terreno e provvedendo alla riattivazione di fossi e delle linee di deflusso eventualmente preesistenti. Successivamente si passerà al ripristino del manto stradale in quanto il tratto interessato interessa strade

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	29	45

	<p align="center">Impianto agrivoltaico con fotovoltaico a terra del tipo a inseguimento solare da ubicare nei Comuni di Bicinicco e Santa Maria La Longa (Provincia di Udine)</p> <p align="center">Ditta Proponente: ATLAS SOLAR 1 s.r.l.</p>	 <p align="center">Studio di Ingegneria</p>
---	---	---

esistenti con manto stradale superficiale.

- Trivellazione orizzontale controllata (TOC): questa particolare tecnica verrà adottata per la posa in opera del cavidotto in tratti particolari quando le operazioni di scavo non sono consentite o quando, in fase esecutiva, il superamento delle interferenze esistenti non consentono le soluzioni adottate e descritte in precedenza. Questo tipo di perforazione consiste essenzialmente nella realizzazione di un cavidotto sotterraneo mediante il radiocontrollo del suo andamento planoaltimetrico. Il controllo della perforazione è reso possibile dall'utilizzo di una sonda radiomontata in cima alla punta di perforazione che, dialogando con l'unità operativa esterna, permette di controllare e correggere in tempo reale gli eventuali errori. In alternativa a tale soluzione, si potrà prendere in considerazione, in fase esecutiva, la possibilità di attraversamento degli elettrodotti in MT dei canali esistenti attraverso l'ancoraggio dei suddetti cavi alle strutture dei ponti esistenti, previo isolamento degli stessi cavi internamente a strutture di protezione come cavidotti e/o passacavi, debitamente segnalati ed eseguiti in conformità alle normative di riferimento.

A.01.E.6 Modalità di esecuzione degli scavi

Premesso che la sistemazione delle aree avverrà secondo quanto indicato al paragrafo A.01.D.1, la realizzazione del progetto, in accordo con quanto esposto nei precedenti paragrafi, richiede l'esecuzione dei seguenti scavi:

- Scotico di circa 20 cm della superficie del terreno per la realizzazione delle strade interne che saranno utilizzate anche nella fase di cantiere;
- Scavi localizzati per i blocchi di fondazione dei pali d'illuminazione e del cancello d'ingresso;
- Scavi a sezione ampia per la realizzazione delle opere di fondazione delle cabine elettriche e delle cabine/containers;
- Scavi a sezione ristretta per la realizzazione dei collegamenti elettrici (cavidotto MT);

Gli scavi saranno realizzati con l'ausilio di idonei mezzi meccanici evitando scoscendimenti, franamenti, ed in modo tale che le acque scorrenti alla superficie del terreno non abbiano a riversarsi nei cavi. In qualche raro caso le pareti verticali degli scavi potrebbero essere protette. Principalmente

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	30	45

	<p align="center">Impianto agrivoltaico con fotovoltaico a terra del tipo a inseguimento solare da ubicare nei Comuni di Bicinicco e Santa Maria La Longa (Provincia di Udine)</p> <p align="center">Ditta Proponente: ATLAS SOLAR 1 s.r.l.</p>	 <p align="center">Studio di Ingegneria</p>
---	---	---

si prevede l'impiego dei seguenti mezzi:

- Escavatori per gli scavi a sezione obbligata e a sezione ampia;
- Pale meccaniche per scoticamento superficiale;
- Trencher o ancora escavatori per gli scavi a sezione ristretta (trincee);
- Perforatore teleguidato;

Dagli scavi è previsto il rinvenimento delle seguenti materie:

- Terreno vegetale, proveniente dagli strati superiori per uno spessore medio di 50 cm;
- Terreno di sottofondo la cui natura verrà caratterizzata puntualmente in fase di progettazione esecutiva a seguito dell'esecuzione dei sondaggi geologici e indagini specifiche.

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	31	45

	<p align="center">Impianto agrivoltaico con fotovoltaico a terra del tipo a inseguimento solare da ubicare nei Comuni di Bicinicco e Santa Maria La Longa (Provincia di Udine)</p> <p align="center">Ditta Proponente: ATLAS SOLAR 1 s.r.l.</p>	 <p align="center">Studio di Ingegneria</p>
---	---	---

A.01.F SITI A RISCHIO POTENZIALE DI INQUINAMENTO E DETERMINAZIONE NUMERO E CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI INDAGINE

In virtù delle caratteristiche delle aree interessate dal progetto è stata effettuata una ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento.

Il progetto si inserisce in contesti per lo più naturali identificati a livello pianificatorio come ambiti agricoli.

L'Amministrazione regionale ha approvato, con Decreto del Presidente della Regione n. 3 del 11 gennaio 2013 attuativo della DGR 2366 del 28 dicembre 2012, il RFA (Regolamento per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati nelle zone ordinarie e nelle zone vulnerabili da nitrati), strumento previsto dal recepimento nazionale della Direttiva 91/676/CEE (cosiddetta Direttiva Nitrati), ovvero il DM 7 aprile 2006, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152". Dall'analisi del Piano Regionale di Bonifica dei siti contaminati e, in particolar modo, dall'analisi dell'Allegato 1 al suddetto piano, il comune di Bicinicco e di Santa Maria La Longa, non rientrano in contesti di siti contaminati, ma rientrano nella lista dei Comuni in cui sono state individuate le ZVN (Zone Vulnerabili ai Nitrati).

Da quanto sopra detto le aree interessate dall'impianto agrivoltaico ricadono in ambiti utilizzati solo a scopo agricolo, né si ritiene che tali aree siano state assoggettate nel corso della storia a fonti di pressione ambientale o a potenziali impatti in grado di determinare contaminazione del terreno derivanti dall'esercizio di attività diverse. Le aree interessate dal percorso dell'elettrodotto interrato di connessione ha una utilizzazione antropica riferibile solo a fruizione della viabilità comunale di collegamento dei centri abitati.

Pertanto le procedure di caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo seguono i dettami di cui agli allegati 2 e 4 del D.P.R. del 13 giugno 2017, n. 120; i campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo sono privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo)

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	32	45

	<p align="center">Impianto agrivoltaico con fotovoltaico a terra del tipo a inseguimento solare da ubicare nei Comuni di Bicinicco e Santa Maria La Longa (Provincia di Udine)</p> <p align="center">Ditta Proponente: ATLAS SOLAR 1 s.r.l.</p>	 <p align="center">Studio di Ingegneria</p>
---	---	---

e le determinazioni analitiche in laboratorio sono condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione è determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm). Qualora si abbia evidenza di una contaminazione antropica anche del sopravaglio, le determinazioni analitiche sono condotte sull'intero campione, compresa la frazione granulometrica superiore ai 2 cm, e la concentrazione è riferita allo stesso.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, all'interno dell'area del futuro impianto fotovoltaico saranno effettuati dei sondaggi ambientali a carotaggio ed il numero di punti d'indagine sarà stabilito in base alle dimensioni dell'area d'intervento, e quindi sarà pari a 7 per i primi 10.000 mq + 1 ogni 5.000 mq eccedenti.

Quindi saranno effettuati:

- 23 sondaggi per il Sottocampo "Bicinicco1";
- 21 sondaggi per il Sottocampo "Bicinicco 2";

tutti eseguiti in ottemperanza a quanto stabilito dall'Allegato 2 e 4 del DPR 120/2017.

Per quanto concerne il cavidotto, trattandosi di un'infrastruttura lineare, il campionamento sarà effettuato ogni 500 metri con la realizzazione di appositi pozzetti esplorativi ubicati lungo il tracciato previsto. Sono previsti 12 pozzetti esplorativi lungo i circa 5,8 km che compongono l'elettrodotta interrato. In ogni caso è effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.

I campionamenti saranno effettuati secondo quanto previsto nell'allegato 4 al DPR 120/2017. Trattandosi di scavi inferiori a ml 2,00, per ogni sondaggio verranno prelevati due campioni alle seguenti profondità dal piano campagna: un campione da 0 m e 1 m e un campione da 1 m a fondo scavo.

Non sono previsti scavi in corrispondenza di terreni saturi per ciò che attiene all'area d'impianto.

Negli scavi con tecnica "no-dig" con presenza di terreno saturo, per ciascun sondaggio, oltre ai campioni sopra elencati, sarà acquisito un campione delle acque sotterranee con campionamento

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	33	45

	<p align="center">Impianto agrivoltaico con fotovoltaico a terra del tipo a inseguimento solare da ubicare nei Comuni di Biciniccio e Santa Maria La Longa (Provincia di Udine)</p> <p align="center">Ditta Proponente: ATLAS SOLAR 1 s.r.l.</p>	 <p align="center">Studio di Ingegneria</p>
---	--	---

dinamico. In presenza di sostanze volatili si procederà con altre tecniche adeguate a conservare la significatività del prelievo.

Non è prevista una considerevole diversificazione delle terre e rocce da scavo da campionare, date le profondità da raggiungere, ma qualora se ne manifesti la necessità e si renda necessario tenere separati i vari strati al fine del loro riutilizzo, sarà adottata la metodologia di campionamento casuale stratificato, in grado di garantire una rappresentatività della variazione della qualità del suolo sia in senso orizzontale che verticale.

Qualora si riscontri la presenza di materiale di riporto, non essendo nota l'origine dei materiali inerti che lo costituiscono, la caratterizzazione ambientale dovrà prevedere:

- l'ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni porzione di suolo interessata dai materiali di riporto, data la possibile eterogeneità verticale ed orizzontale degli stessi;
- la valutazione della percentuale in peso degli elementi di origine antropica.

La caratterizzazione ambientale sarà eseguita tramite escavatore lungo il cavidotto e tramite la tecnica del carotaggio verticale all'interno dell'area di impianto con la sonda di perforazione attrezzata con testa a rotazione e roto-percussione, utilizzando un carotiere di diametro opportuno. La velocità di rotazione sarà portata al minimo in modo da ridurre l'attrito tra sedimento e campionatore. Non saranno assolutamente utilizzati fluidi o fanghi di circolazione per non contaminare le carote estratte e sarà utilizzato grasso vegetale per lubrificare la filettatura delle aste e del carotiere. I terreni saranno recuperati per l'intera lunghezza prevista, in un'unica operazione, senza soluzione di continuità, utilizzando aste di altezza pari a 1 m con un recupero pari al 100% dello spessore da caratterizzare, quindi, saranno per tutta la sua lunghezza di prelievo, fotografati con una targa identificativa in cui sarà indicata la denominazione del punto di campionamento.

Inoltre, i campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo saranno privati della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio saranno condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione sarà determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm). Qualora si dovesse avere evidenza di una contaminazione antropica anche del sopravaglio le determinazioni analitiche saranno condotte

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	34	45

	<p align="center">Impianto agrivoltaico con fotovoltaico a terra del tipo a inseguimento solare da ubicare nei Comuni di Bicinicco e Santa Maria La Longa (Provincia di Udine)</p> <p align="center">Ditta Proponente: ATLAS SOLAR 1 s.r.l.</p>	 <p align="center">Studio di Ingegneria</p>
---	---	---

sull'intero campione, compresa la frazione granulometrica superiore ai 2 cm, e la concentrazione sarà riferita allo stesso.

In ottemperanza alle prescrizioni dell'Allegato 4 al DPR 120/2017, le sostanze per le quali effettuare le analisi saranno le seguenti:

- Arsenico
- Cadmio
- Cobalto
- Nichel
- Piombo
- Rame
- Zinco
- Mercurio
- Idrocarburi C>12
- Cromo totale
- Cromo VI
- Amianto
- BTEX*
- IPA*

*Da eseguire per le aree di scavo collocate entro 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione o da insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera.

Per quanto riportato all'inizio del predetto paragrafo, nell'area d'impianto, al suddetto set analitico minimale saranno aggiunte le seguenti analisi:

- Carbonio organico
- Azoto totale

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	35	45


- Fosforo assimilabile
- Potassio scambiabile
- Conduttività elettrica 1:2

Di seguito si riporta la rappresentazione su ortofoto dei punti di indagine:



Posizione dei punti di indagine all'interno dell'area di intervento

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	36	45



Posizione dei punti di indagine lungo il percorso di connessione

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	37	45

A.01.G VOLUMETRIE PREVISTE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Nel presente paragrafo si riporta la stima dei volumi previsti delle terre e rocce da scavo proveniente dalla realizzazione delle opere di progetto. Per cui si prevedono:


Totale movimentazione per i campi agrivoltaici "Bicinicco 1" e "Bicinicco 2"

Platea cabine di campo, cabina di consegna e vani tecnici			
Lungh. X Largh. X Profondità (ml)	Volume cad. (mc)	N.	Volume tot. (mc)
6.90 x 3.30 x 0.40	9.11	4	36.44
12.65 x 3.00 x 0.40	15.18	2	30.36
13.60 x 2.60 x 0.40	35.36	4	141.44
Strade interne e perimetrali			
Lungh. X Largh. X Profondità (ml)	Volume cad. (mc)	N.	Volume tot. (mc)
2563.78 x 3.00 x 0.20	1538.27	1	1538.27
Fondazioni cancello d'ingresso			
Lungh. X Largh. X Profondità (ml)	Volume cad. (mc)	N.	Volume tot. (mc)
5.00 x 0.60 x 0.90	2.70	2	5.40
Per blocchi di fondazione dei pali d'illuminazione			
Lungh. X Largh. X Profondità (ml)	Volume cad. (mc)	N.	Volume tot. (mc)
0.60 x 0.60 x 0.60	0.22	53	11.66
Somma			1763.57
Per stesura linee elettriche e di terra interne al campo			
Lungh. X Largh. X Profondità (ml)	Volume cad. (mc)	N.	Volume tot. (mc)
(550.00 + 2100.00 + 1500.00) x 0.50 x 1.00	2075.00	1	2075.00

VOLUME TOTALE MC

3838.57

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	38	45

	<p align="center">Impianto agrivoltaico con fotovoltaico a terra del tipo a inseguimento solare da ubicare nei Comuni di Bicinicco e Santa Maria La Longa (Provincia di Udine)</p> <p align="center">Ditta Proponente: ATLAS SOLAR 1 s.r.l.</p>	 <p align="center">Studio di Ingegneria</p>
---	---	---

Opere di connessione – stesura linee elettriche MT interrato			
Lungh. X Largh. X Profondità (ml)	Volume cad. (mc)	N.	Volume tot. (mc)
5680.00 x 0.60 x 1.20	4089.60	1	4089.60
A detrarre attraversamenti "no-dig": 960.00 x 0.60 x 1.20	-691.20	1	-691.20
Perforazioni con tecnica "no-dig": 960.00 x 3.14 x 0.20 x 0.20	120.58	120.58	120.58
Totale mc			3518.98

Per quanto attiene ai volumi eccedenti e riferiti alla realizzazione dei campi fotovoltaici, si può tranquillamente affermare che tali quantità saranno riutilizzati in loco per il livellamento e sistemazione superficiale di tutta l'area d'intervento.

Per quanto riguarda le opere di connessione, considerando che la terra movimentata per gli scavi necessari per la posa delle linee elettriche viene riutilizzata per ricoprire gli stessi scavi per una percentuale di circa l'80% (considerando anche che alcuni tratti saranno eseguiti con la tecnica del no-dig), se ne deduce la quantità di terra in eccesso risultante dagli interventi di scavo e sbancamento del terreno necessari per la realizzazione delle opere di connessione è pari a circa 704,00 mc (20% di 3518,98 mc).

Per smaltire la terra in eccesso risultante dalle attività di scavo e sbancamento si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

1. spargimento sul terreno in modo omogeneo del volume accumulato (realizzabile a seconda dell'andamento dell'organizzazione di cantiere realizzabile a seconda dell'andamento dell'organizzazione di cantiere e fatta salva la verifica del materiale scavato per poter essere idoneo al successivo riutilizzo); in questo caso, considerando l'intera superficie a disposizione (pari a circa 252971.00 mq), lo strato superficiale aggiunto avrebbe un'altezza media inferiore a 0.003 ml (pari a 3 mm). Oppure:

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	39	45

	<p align="center">Impianto agrivoltaico con fotovoltaico a terra del tipo a inseguimento solare da ubicare nei Comuni di Bicinicco e Santa Maria La Longa (Provincia di Udine)</p> <p align="center">Ditta Proponente: ATLAS SOLAR 1 s.r.l.</p>	 <p align="center">Studio di Ingegneria</p>
---	---	---

2. smaltimento del terreno mediante autocarri (tramite ditta specializzata in riciclaggio materiali edili e/ pubblica scarica).

Nella seconda ipotesi, considerando una densità di riferimento media per il terreno vegetale di 1,8 t/mc e una quantità orientativa di terreno da smaltire di 704,00 mc, si ottiene una prima stima in peso di circa 1300 tonnellate da smaltire.

Supponendo l'utilizzo di autocarri della portata di 30 t ciascuno, si può calcolare in prima approssimazione un numero di viaggi intorno a 44 (ogni viaggio si intende come "andata" e "ritorno"). In fase di cantiere si può tuttavia optare per una soluzione ibrida tra le due sopra esposte oppure, visto i valori contenuti del materiale scavato, si può tranquillamente optare per la prima soluzione.

Al fine di evitare miscele e contaminazioni durante le fasi di scavo e stoccaggio, il cantiere e l'area di stoccaggio verranno opportunamente confinate per impedire eventuali scarichi di materiale potenzialmente inquinato sul materiale stoccato. I materiali da scavo saranno disposti in cumuli in quantità comprese tra 500 e 1.500 m³ in funzione dell'eterogeneità del materiale e dei risultati della caratterizzazione in fase progettuale. Intorno ai cumuli verrà realizzato un canale di scolo opportunamente convogliato per evitare la dispersione del materiale per effetto delle piogge. Le fasi di scavo verranno adeguatamente monitorate al fine di evitare riversamenti accidentali da parte dei mezzi d'opera impiegati. Il materiale sarà movimentato all'interno dell'area di cantiere e temporaneamente accantonato sempre al suo interno in zone apposite, per essere in seguito riutilizzato all'interno dello stesso ciclo produttivo. I tempi di stoccaggio e sistemazione non saranno superiori ad 1 anno e comunque secondo i tempi previsti da D.P.R. 12-11-06 n. 816.

Ai sensi della normativa vigente, prima dell'inizio dei lavori si procederà alla caratterizzazione dei terreni, prelevando dei campioni di suolo fino alla profondità di 1 m, che verranno successivamente analizzati da un laboratorio accreditato. Sui campioni di suolo prelevati saranno eseguite le analisi chimiche al fine di verificare il rispetto dei limiti di Concentrazione soglia di Contaminazione del Suolo per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, definiti dal D.Lgs. 152/06 (Tabella 1, Allegato 5, Titolo V).

Prima dell'effettivo inizio dei lavori sarà presentato il piano di utilizzo dei materiali non riutilizzati in

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	40	45

	<p align="center">Impianto agrivoltaico con fotovoltaico a terra del tipo a inseguimento solare da ubicare nei Comuni di Bicinicco e Santa Maria La Longa (Provincia di Udine)</p> <p align="center">Ditta Proponente: ATLAS SOLAR 1 s.r.l.</p>	 <p align="center">Studio di Ingegneria</p>
---	---	---

cantiere.

Le terre e le rocce da scavo qualificate come rifiuti saranno gestite ai sensi dell'art. 23 del DPR 120/2017.

A.01.H VOLUMETRIE E MODALITA' DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO DA RIUTILIZZARE IN SITO

Dei volumi di scavo stimati al paragrafo precedente, per quanto non riutilizzato totalmente in sito, circa l'80% del volume totale verrà reimpiegato o per opere di rinterro oppure per opere di sistemazione superficiale.

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 24 del D.P.R. n. 120/2017, le condizioni per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo sono rispettate in quanto, in fase esecutiva, si sarà accertato che trattasi:

- Di suolo non contaminato;
- Di materiale escavato nel corso di attività di costruzione;
- Di materiale riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato.

La verifica dell'assenza di contaminazione del suolo, obbligatoria anche per il materiale allo stato naturale, sarà valutata prima dell'inizio dei lavori in conformità a quanto stabilito dall'allegato 5, tabella 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Qualora venga confermata l'assenza di contaminazione, l'impiego potrà avvenire senza alcun trattamento nel sito. Nel caso in cui non si appurerà l'assenza di contaminazione, il materiale scavato sarà trasportato in discarica autorizzata.

Le operazioni di scotico non sono previste in quanto trattasi di terreni già sistemati superficialmente; comunque quelle piccole quantità di terreno vegetale provenienti dalla sistemazione superficiale delle aree prossime alle cabine, saranno conservati in cumuli non più alti di 2 m al fine di non perdere le caratteristiche e successivamente impiegato per la piantumazione delle opere di mitigazione

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	41	45

	<p align="center">Impianto agrivoltaico con fotovoltaico a terra del tipo a inseguimento solare da ubicare nei Comuni di Bicinicco e Santa Maria La Longa (Provincia di Udine)</p> <p align="center">Ditta Proponente: ATLAS SOLAR 1 s.r.l.</p>	 <p align="center">Studio di Ingegneria</p>
---	---	---

perimetrale, anche per favorire una rapida ripresa agricola, in conformità con quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

A.01.I CONCLUSIONI

In conformità con i volumi presentati nel presente elaborato, il terreno proveniente dagli scavi necessari alla realizzazione delle opere di progetto verrà utilizzato in gran parte per contribuire alla costruzione dell'impianto fotovoltaico in esame e per l'esecuzione dei ripristini ambientali.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 24 del D.P.R. n. 120/2017 prima dell'inizio dei lavori, il proponente o l'esecutore dell'opera:

- Effettuerà il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale;
- Redigerà, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un apposito progetto in cui saranno definite:
 - o Volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;
 - o La quantità delle terre e rocce da riutilizzare;
 - o La collocazione e la durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;
 - o La collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo

Il suddetto progetto contenente le indicazioni suddette è il Piano di Utilizzo e sarà redatto ai sensi dell'allegato 5 al D.P.R. n. 120/2017, e conterrà le seguenti informazioni:

- L'ubicazione dei siti di produzione delle terre e rocce da scavo con l'indicazione dei relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie;
- L'ubicazione dei siti di destinazione e l'individuazione dei cicli produttivi di destinazione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, con l'indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione. I siti e i cicli produttivi di destinazione possono essere alternativi tra loro;

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	42	45

	<p align="center">Impianto agrivoltaico con fotovoltaico a terra del tipo a inseguimento solare da ubicare nei Comuni di Bicinicco e Santa Maria La Longa (Provincia di Udine)</p> <p align="center">Ditta Proponente: ATLAS SOLAR 1 s.r.l.</p>	 <p align="center">Studio di Ingegneria</p>
---	---	---

- Le operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali delle terre e rocce da scavo per il loro utilizzo, con riferimento a quanto indicato all'allegato 3;
- Le modalità di esecuzione e le risultanze della caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo eseguita in fase progettuale in conformità alle previsioni degli allegati 1, 2 e 4, precisando in particolare:
 - I risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (ad esempio, fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche) con particolare attenzione alle attività antropiche svolte nel sito o di caratteristiche geologiche-idrogeologiche naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche;
 - Le modalità di campionamento, preparazione dei campioni e analisi con indicazione del set dei parametri analitici considerati che tenga conto della composizione naturale delle terre e rocce da scavo, delle attività antropiche pregresse svolte nel sito di produzione e delle tecniche di scavo che si prevede di adottare, esplicitando quanto indicato agli allegati 2 e 4;
 - La necessità o meno di ulteriori approfondimenti in corso d'opera e i relativi criteri generali da seguire, secondo quanto indicato nell'allegato 9, parte A;
- L'ubicazione degli eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, anche alternativi tra loro, con l'indicazione della classe di destinazione d'uso urbanistica e i tempi del deposito per ciascun sito;
- I percorsi previsti per il trasporto delle terre e rocce da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, siti di deposito intermedio, siti di destinazione e processi industriali di impiego), nonché delle modalità di trasporto previste (ad esempio, a mezzo strada, ferrovia, nastro trasportatore).

Il piano in questione sarà corredato dai seguenti documenti:

- Inquadramento territoriale e topo-cartografico;
- Inquadramento urbanistico;

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	43	45

	<p align="center">Impianto agrivoltaico con fotovoltaico a terra del tipo a inseguimento solare da ubicare nei Comuni di Bicinicco e Santa Maria La Longa (Provincia di Udine)</p> <p align="center">Ditta Proponente: ATLAS SOLAR 1 s.r.l.</p>	 <p align="center">Studio di Ingegneria</p>
---	---	---

- Inquadramento geologico e idrogeologico;
- Descrizione delle attività svolte sul sito;
- Piano di campionamento e analisi.

A.01.L NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **DM 161/2012** "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato recentemente sostituito dal DPR n° 120 del 13.06.2017 - "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", che ha migliorato le indicazioni contenute nel precedente DM.
- **DPR 120/2017** al Titolo IV, art. 24, comma 3 prevede: nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un «PIANO PRELIMINARE DI UTILIZZO IN SITO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI».

Detto PIANO PRELIMINARE dovrà contenere almeno i seguenti argomenti:

- a) Descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;
- b) Inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);
- c) Proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:
 1. Numero e caratteristiche dei punti di indagine
 2. Numero e modalità dei campionamenti da effettuare

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	44	45

	<p>Impianto agrivoltaico con fotovoltaico a terra del tipo a inseguimento solare da ubicare nei Comuni di Bicinicco e Santa Maria La Longa (Provincia di Udine)</p> <p>Ditta Proponente: ATLAS SOLAR 1 s.r.l.</p>	 <p>Studio di Ingegneria</p>
---	---	--

3. Parametri da determinare
- d) Volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;
 - e) Modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.

SIGLA	REV	DESCRIZIONE	Data	Pag.	TOT.
R05	0	PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20/10/2021	45	45
