
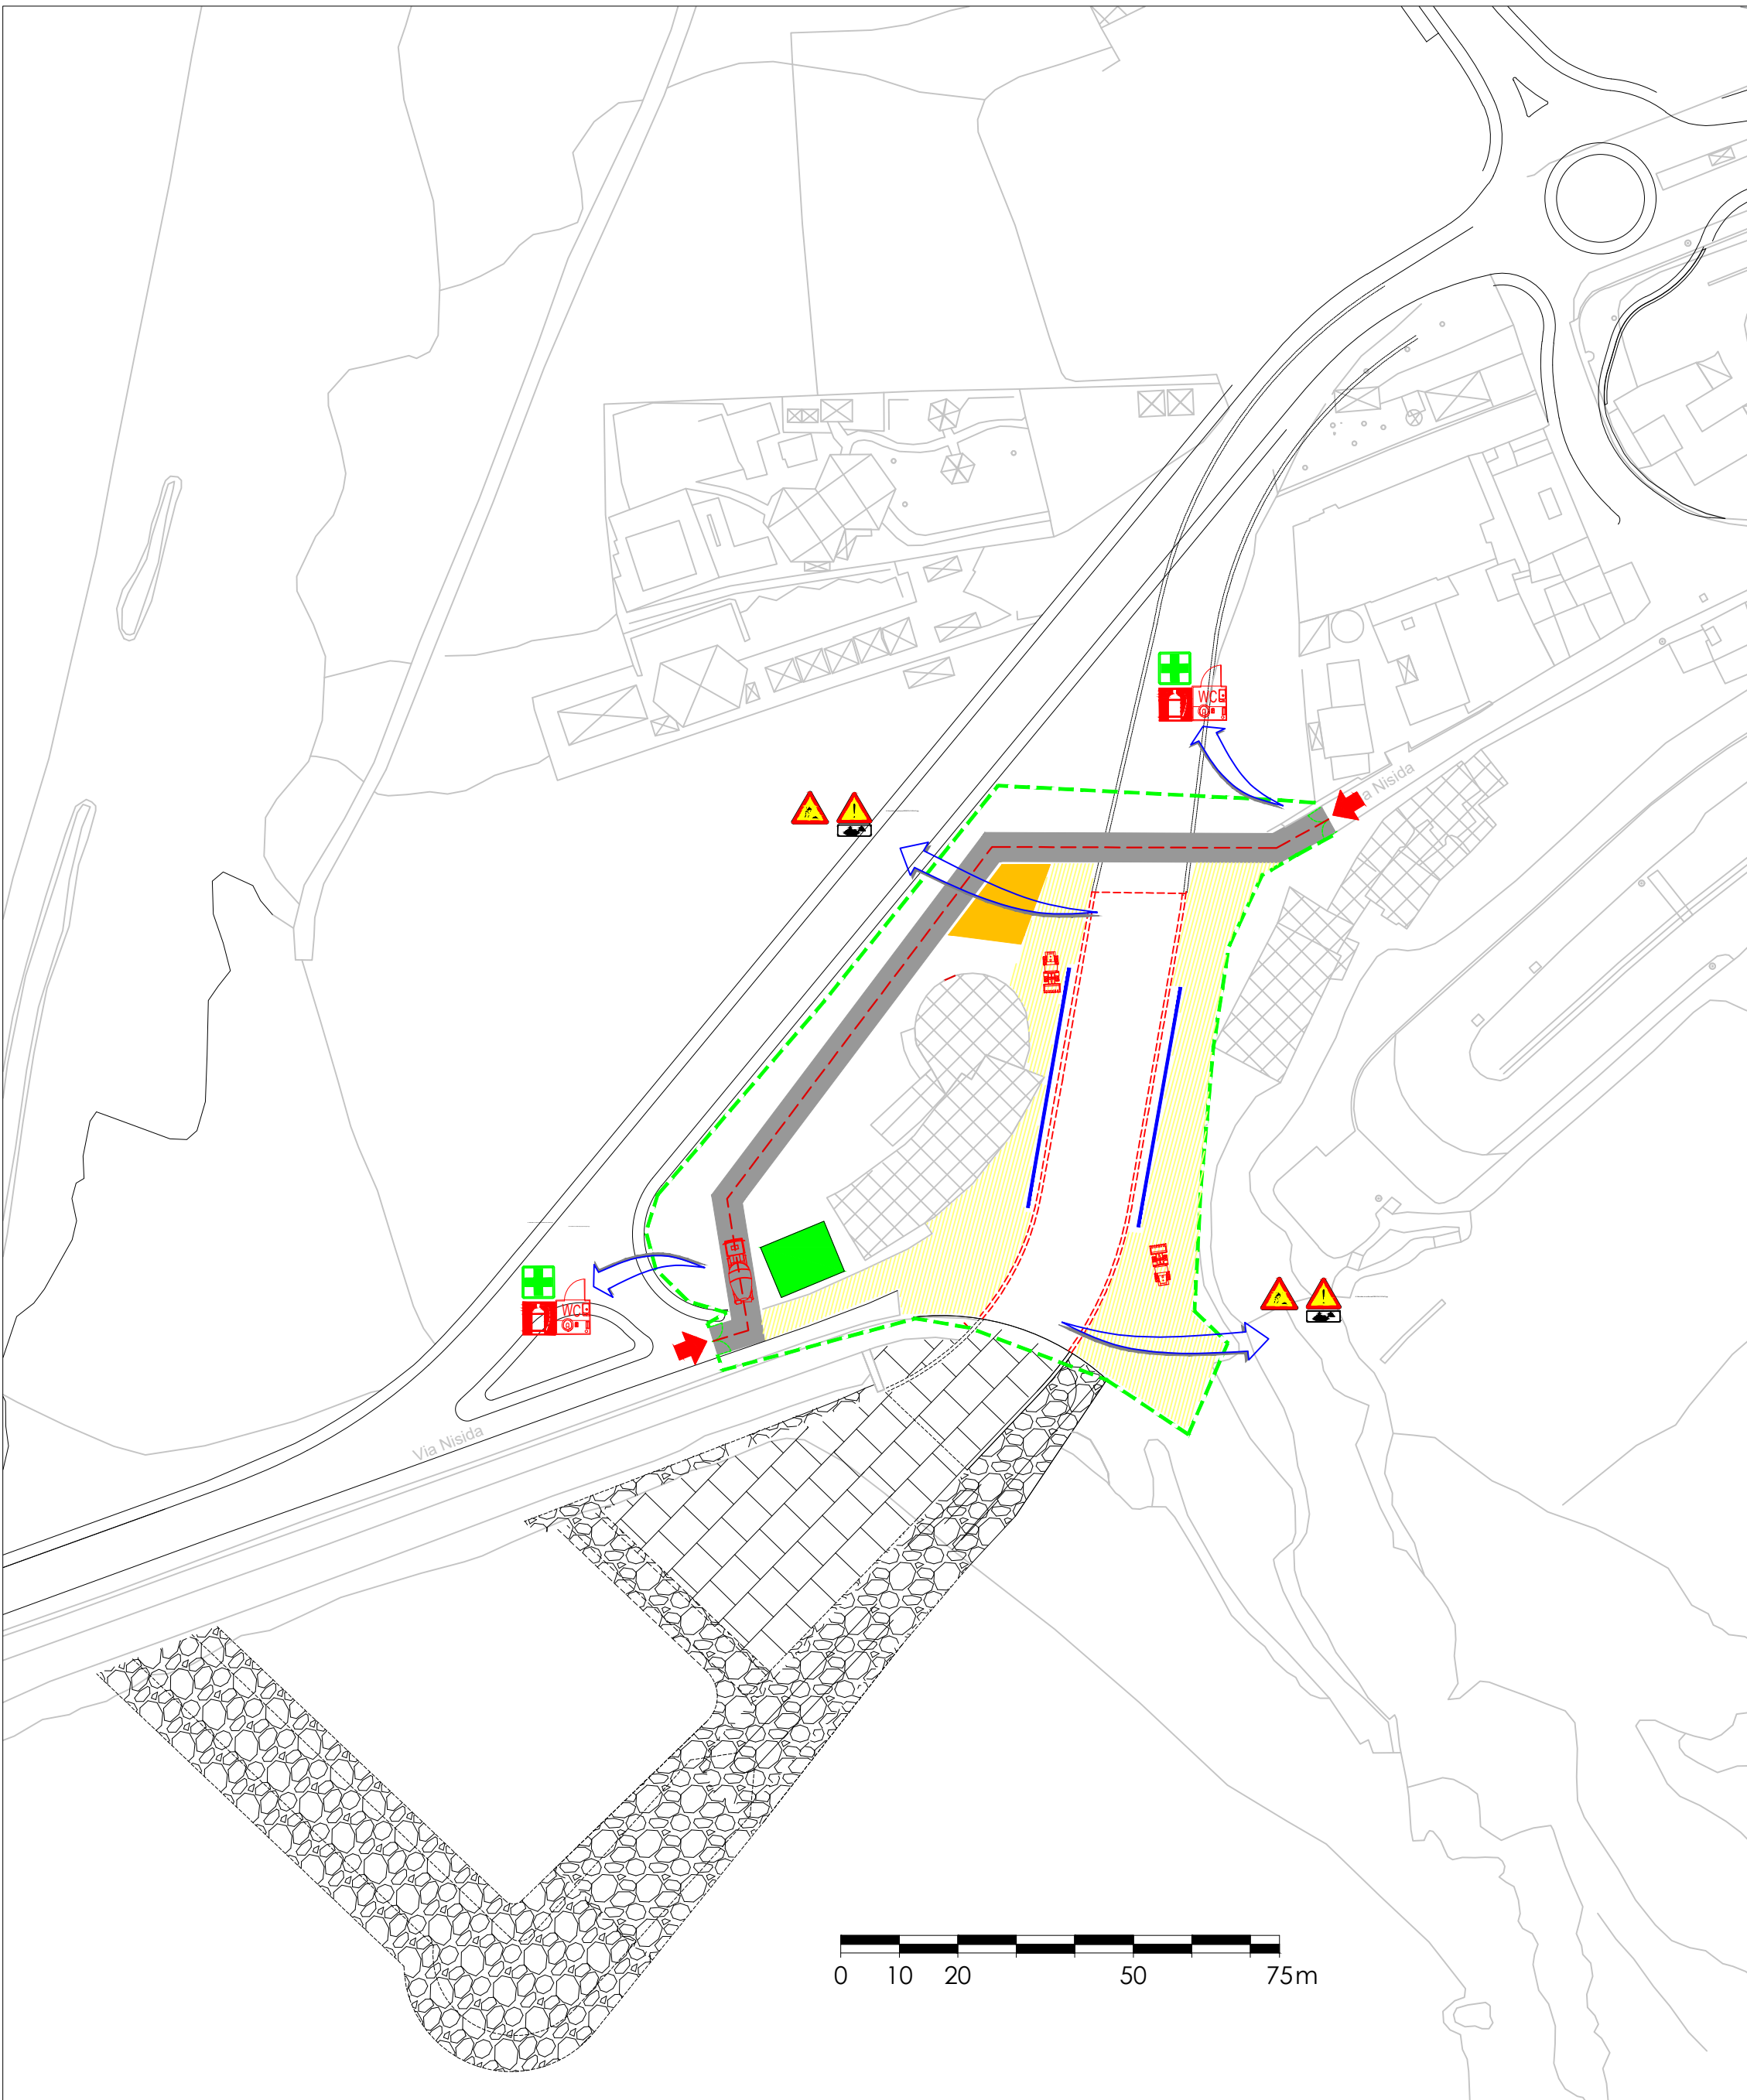


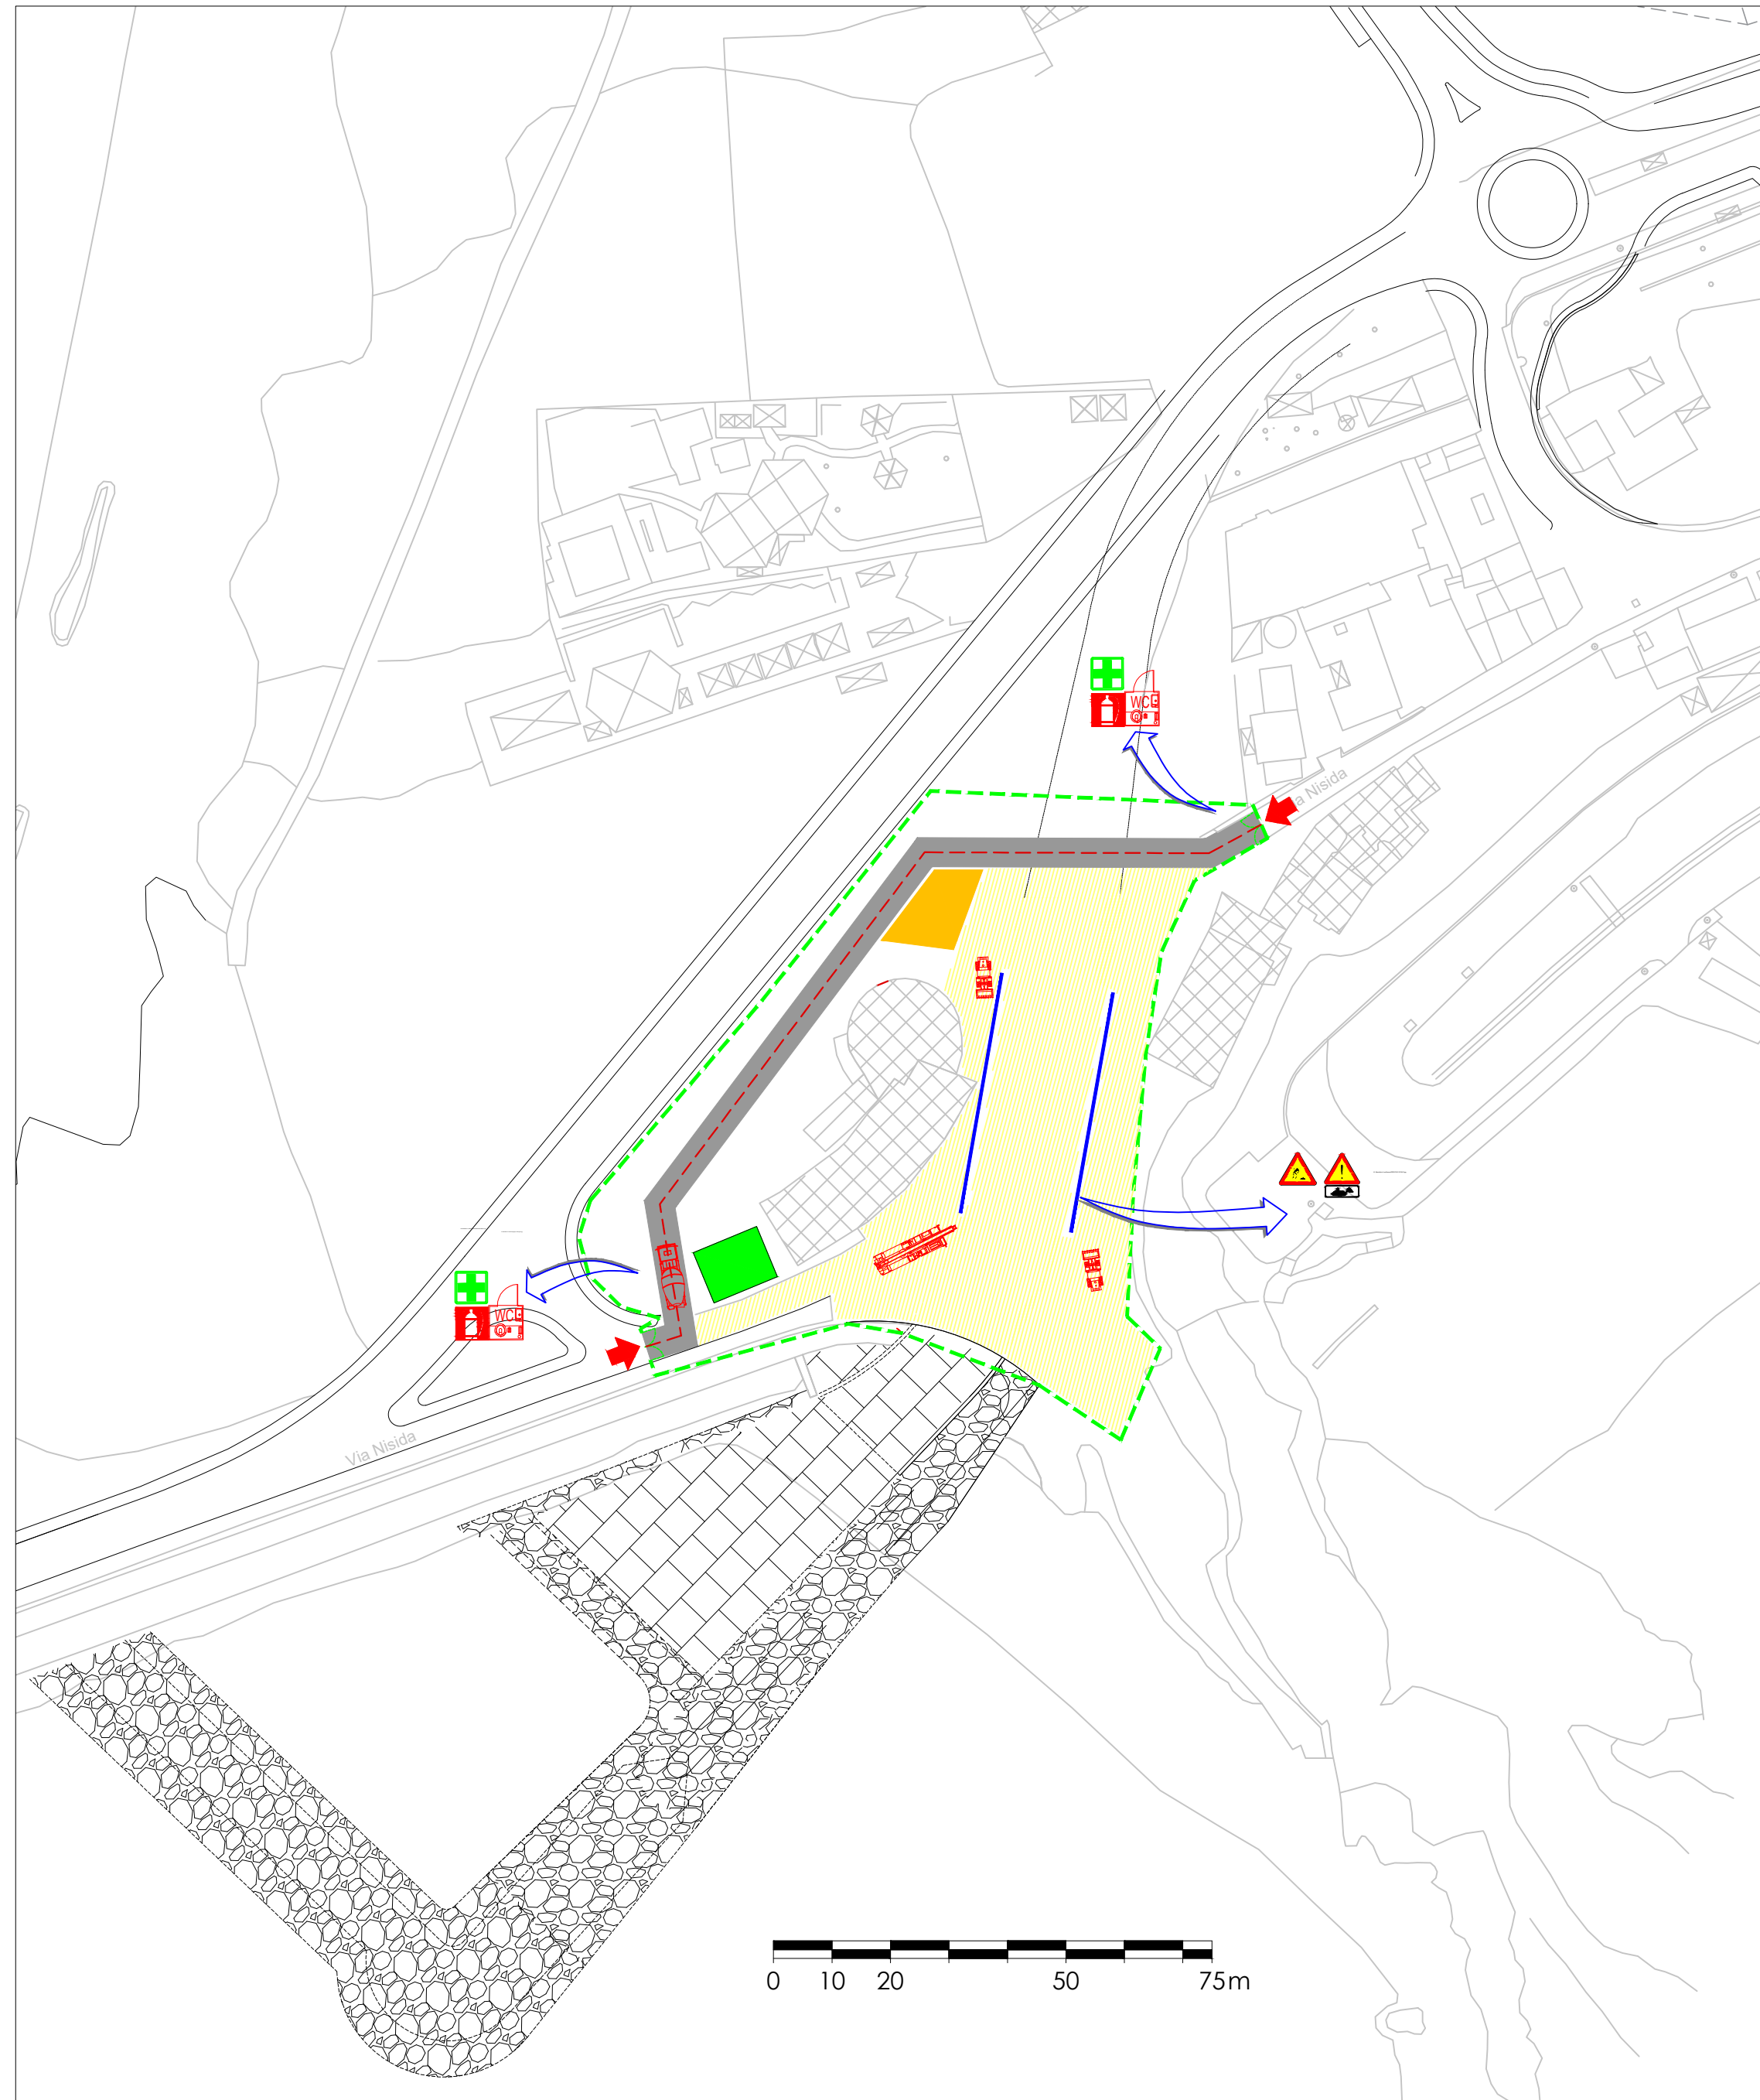

 Area di movimentazione uomini e mezzi

FASE 3 - Definizione della viabilità di accesso alle aree di lavoro e installazione segnaletica.

- Non sostare nel raggio di azione della macchina
- Verificare l'efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza delle macchine operatrici.
- Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.
- Segnalare la zona interessata all'operazione.
- Non effettuare rifornimenti con motore in moto.
- Deviare il traffico a distanza di sicurezza dalla zona dell'intervento al fine di evitare ogni possibile interferenza e posizionare la segnaletica di sicurezza.

- Utilizzare dispositivi che riducono al minimo i rischi dovuti alle vibrazioni.
- Tenere idonei mezzi di estinzione a portata di mano.
- Rispettare le istruzioni d'uso e manutenzione riportate nel libretto dei mezzi.
- Rispettare le disposizioni locali per il carico degli automezzi per lo smaltimento dei rifiuti.
- Per quanto riguarda le misure di prevenzione dei mezzi, fare riferimento alle relative schede nei mezzi d'opera.

Nel caso di posizionamento lungo la viabilità esistente in esercizio si integra la recinzione delimitando il confine con new-jersey in plastica

Basi in calcestruzzo rinforzato



I tessuti non tessuti, grazie al ridotto peso ed al materiale impiegato sono longevi, hanno un rapido montaggio e sono facilmente smaltibili. Inoltre grazie alla struttura a fibre aperte, hanno un potere di protezione antipolvere contro l'infiltrazione di particelle minerali fini e polvere creata dal passaggio dei mezzi al cantiere e dalle fasi di esecuzione. La struttura ne garantisce anche una fonoassorbente per proteggere i recettori esterni al cantiere dai rumori prodotti durante le ore lavorative.

Usare la rete di color arancio per migliorare il segnalamento della recinzione nelle aree puntuali in cui possono sorgere interferenze temporanee con i recettori esterni

La recinzione delle zone di lavoro dovrà essere munita di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa

Direzione Area Tecnica
Opere civili:
Arch. Giulia LEONI

REVISIONE	DATA	AGGIORNAMENTI
-----------	------	---------------

0	GIU. 2023	Emissione	CODICE FILE	PS.PL.10.01.14.02
