

1_FASE: Allestimento area di lavoro

1. Riconoscimento visiva
2. Delimitazione area di lavoro

Recinzione vedi particolare Recinzione tipo B

Prima di iniziare l'intervento verificare la presenza di: SOTTOSERVIZI

- CAY ELETTRICI INVERTITI
- Cassetta di pronto soccorso
- Estintore efficiente a DISPOSIZIONE
- INDOSSARE INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ

2_FASE: Bonifica ordigni esplosivi superficiale

1. Posizionamento della segnaletica di sicurezza
2. Eventuale taglio della vegetazione
3. Indagine per bonifica superficiale (Active Metal Detector o Passive Metal Detector)

Cassetta di pronto soccorso

Estintore efficiente a DISPOSIZIONE

INDOSSARE INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ

3_FASE: Bonifica ordigni esplosivi profonda

1. Trivellazione fino alla profondità prevista
2. Indagine con metal detector all'interno dei fori

ATTENZIONE! PERICOLO ESPLOSIONI

SHEMA PLANIMETRICO

Cassetta di pronto soccorso




Estintore efficiente a DISPOSIZIONE

INDOSSARE INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ

NOTA BENE:
Pur le fasi 2 e 3 DOVRA' ESSERE IMPIEGATO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE SPECIALIZZATO.
TUTTI dovranno essere in possesso di brevetti di specializzazione rilasciati dal Ministero della Difesa - Esercito - Direzione generale del Genio Militare

- Verificare la stabilità del mezzo, anche in funzione del tipo di terreno.
- Si prescrive verifica costante dell'integrità della recinzione.
- I risultati delle verifiche devono essere registrati sui libretti degli apparecchi stessi.

RECINZIONE TIPO B: CON RETE IN PLASTICA ROSSA

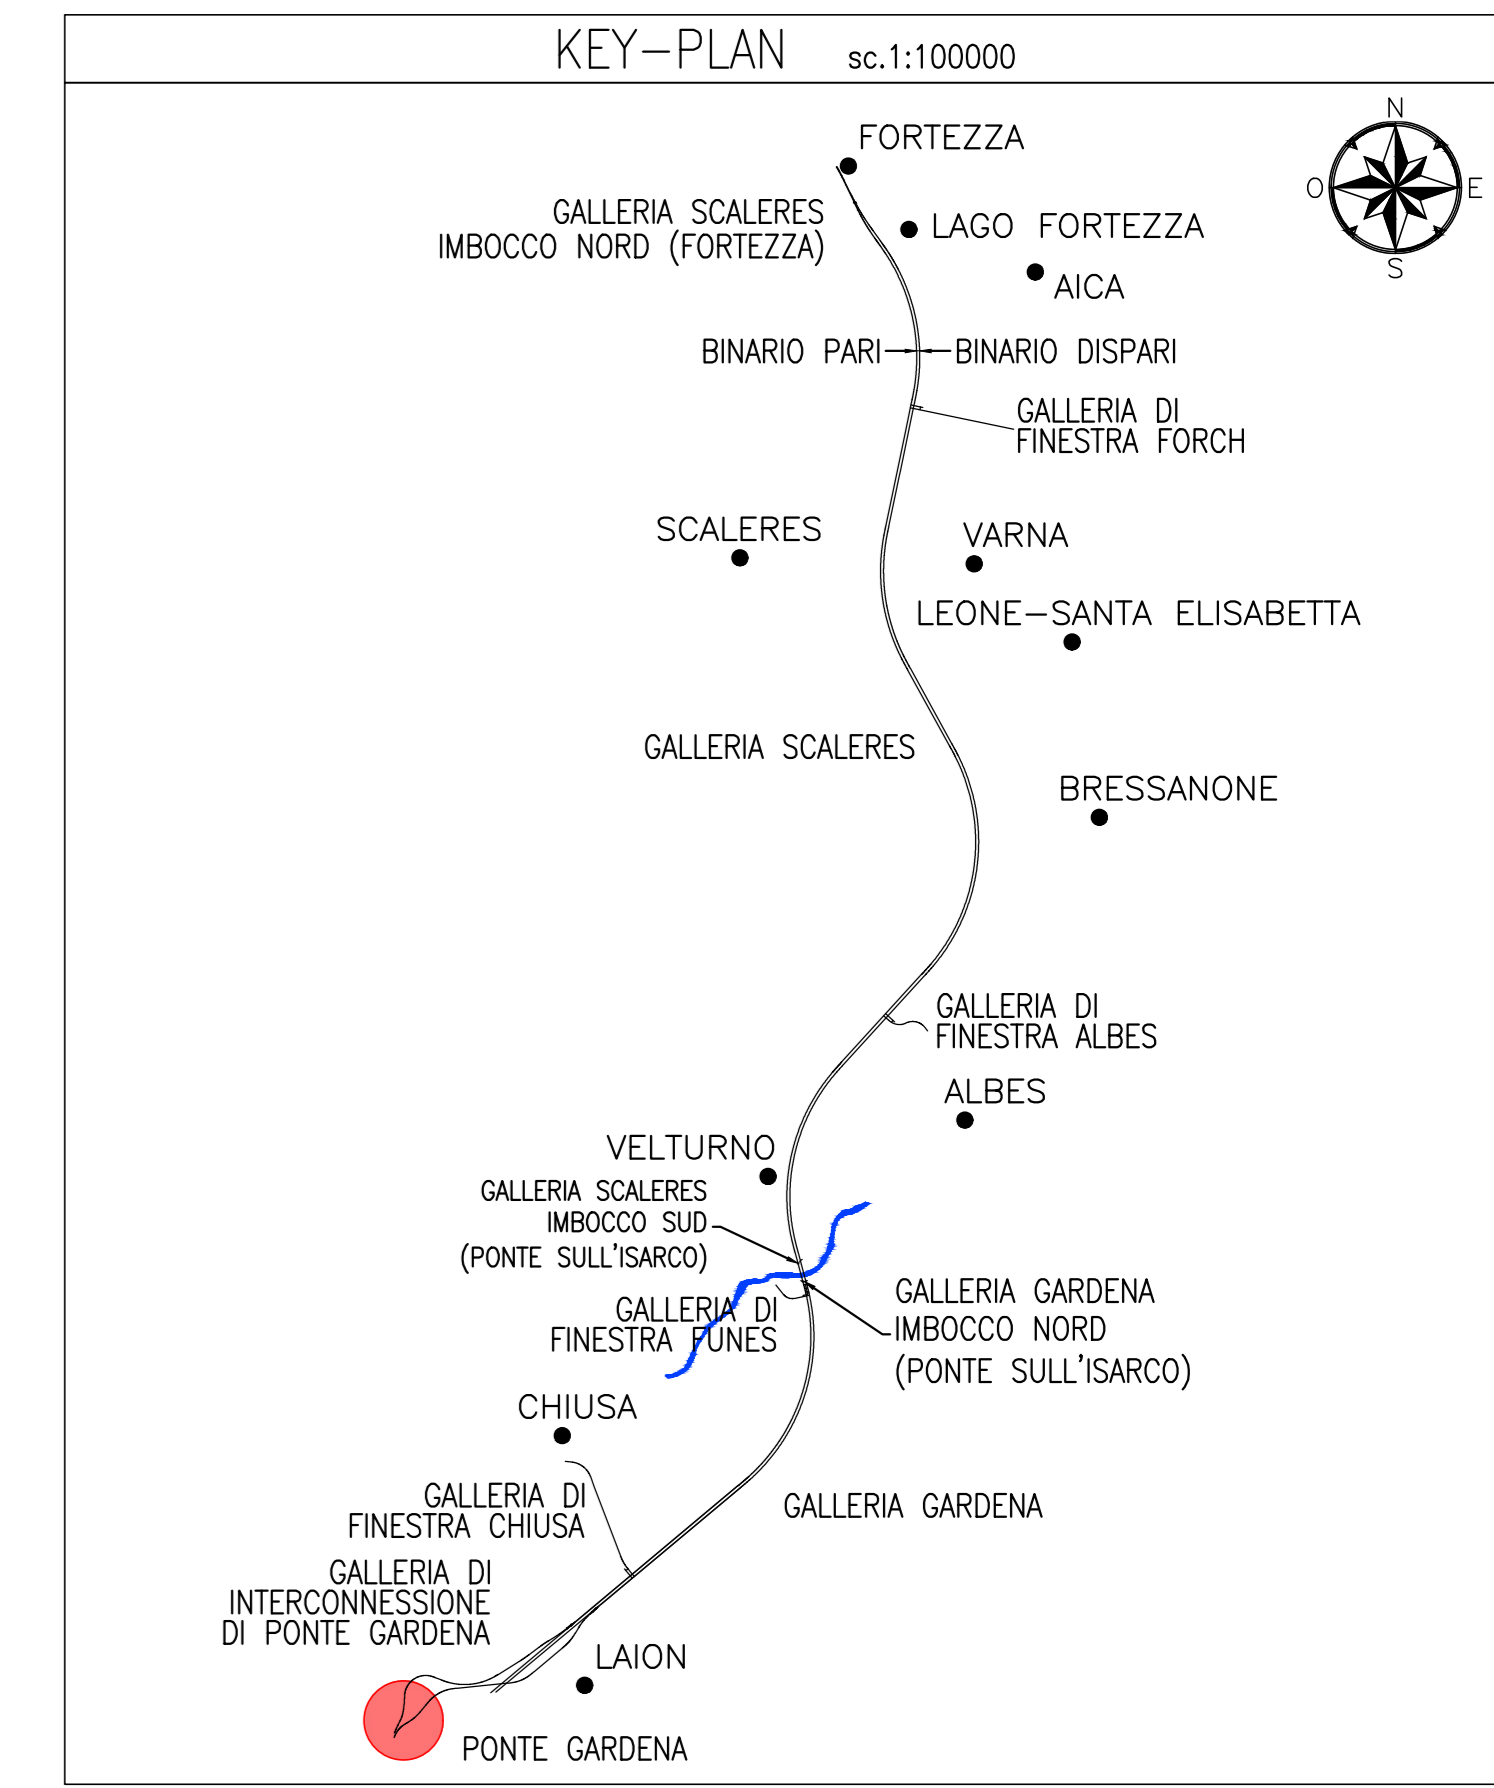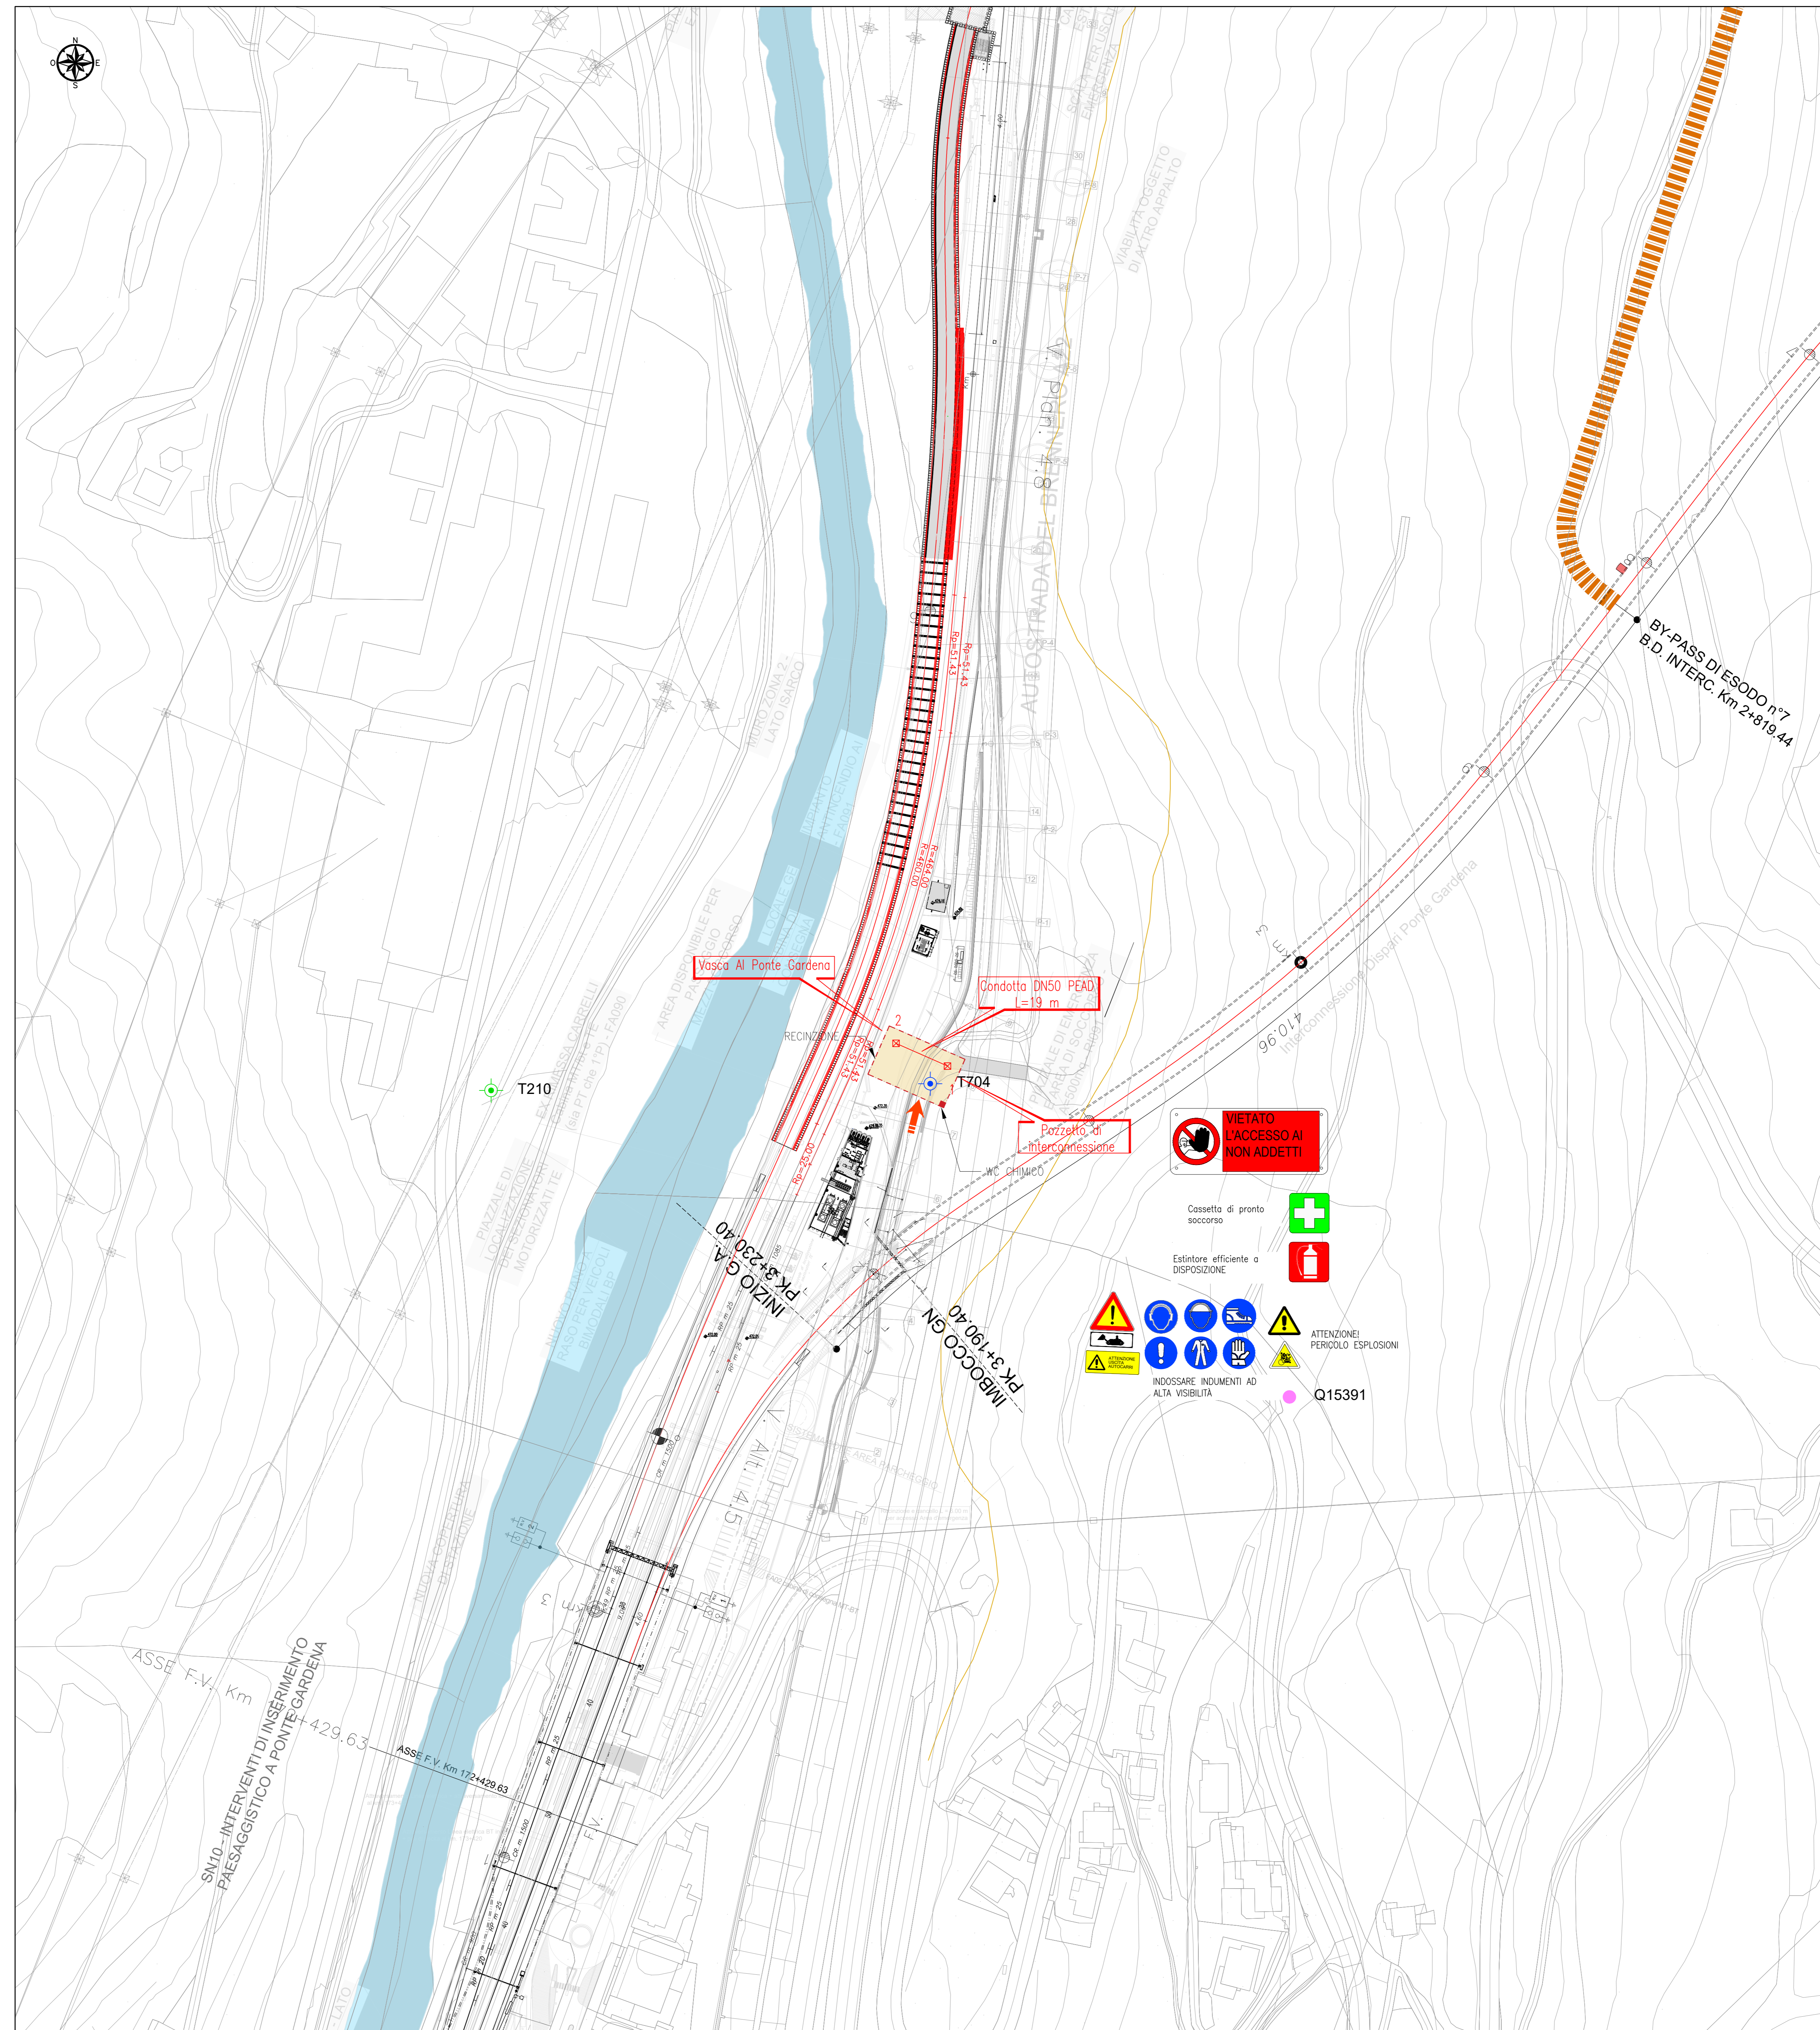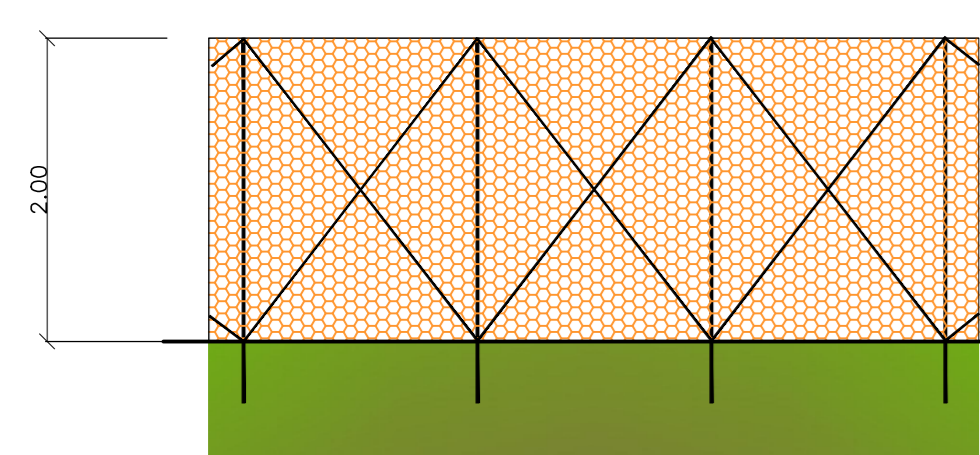

LEGENDA

- AREA SOGGETTA A BONIFICA CON RECINZIONE IN PLASTICA PERMETRALE
- DA POSIZIONARE IN PROSSIMITA' DELL'ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE
- DA POSIZIONARE IN PROSSIMITA' DELL'ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE
- DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DEL CANTIERE
- DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DEL CANTIERE

COMMITTENTE: **RFI** - GRUPPO FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **WORLD** / **IMPRESA** / **CONSORZIO DOLOMITI**

PROGETTAZIONE: **SWS** / **PINI** / **GDP GEOMINI** / **SISI** / **GRUPPO COOPERATIVE S. GIUSEPPE** / **GRUPPO COOPERATIVE S. GIUSEPPE**

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: **GRUPPO COOPERATIVE S. GIUSEPPE**

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA "FORTEZZA - PONTE GARDENA"

DISEGNO: 22 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Area di cantiere - BOE Opere parte B - Alimentazione vasche antincendio - Ponte Gardena (AI)

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------|
| APPALTATORE | COMMITTENTE | SCALA: |
| Ing. Rosa Maria Del Maschio | Ing. Rosa Maria Del Maschio | 1:1000 |

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERAZIONE | DISCIPLINA | PROGR. | REV. |
|----------|-------|------|------|-----------|-------------|------------|--------|------|
| I B O U | 1 B | E | Z | P U | S Z O 0 0 0 | 0 4 6 | 0 | D |

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autore/Revizore |
|------|---|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
| A | Emissione | A. Dall' | 16/09/2021 | C. Anselmo | 17/09/2021 | D. Buttaro | 20/09/2021 | IL PROGETTISTA P. CIGRO |
| B | Revisione a seguito di valutazione Coordinatore | R. Luzzi | 05/01/2022 | L. Rambaldi | 04/01/2022 | D. Buttaro | | GRUPPO COOPERATIVE S. GIUSEPPE |
| C | Revisione a seguito di valutazione Coordinatore | R. Luzzi | 14/06/2022 | C. Anselmo | 15/04/2022 | D. Buttaro | | GRUPPO COOPERATIVE S. GIUSEPPE |
| D | Revisione a seguito di valutazione Coordinatore | R. Luzzi | 26/09/2022 | C. Anselmo | 26/09/2022 | D. Buttaro | | GRUPPO COOPERATIVE S. GIUSEPPE |

File: IBOU1BEZZPUSZ0000048D.dwg n. Elab.:
