


NOTE GENERALI

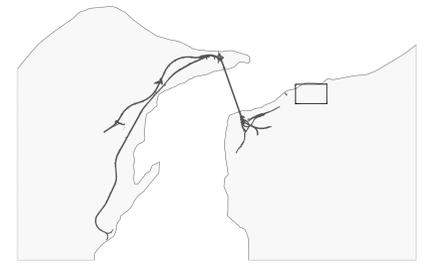

LEGENDA PREFABBRICATI

- 1 Mensa
- 2 Magazzino manutenzione campo
- 3 Guardiania
- 4 Club e formazione professionale
- 5 Cabina Elettrica e gruppo elettrogeno
- 6 Dormitori 40 POSTI
- 6A Dormitori 40 POSTI - Ampliamento
- 7 Uffici
- 8 Parcheggi
- 9 Lavanderia
- 10 Raccolta differenziata rifiuti
- 11 Serbatoio acqua potabilizzata (400 mc)

LEGENDA SISTEMAZIONI ESTERNE

- PAVIMENTAZIONE VALETTI PEDONALI
 - SISTEMAZIONE A VERDE
 - PAVIMENTAZIONE IN CONCRETO BITUMINOSO (STRADE E PARCHEGGI)
- AREA OCCUPATA DAL CANTIERE: tot mq 26.900

TABELLA MATERIALI

SCAVI
 -Scavo spessore minimo di 30 cm con accantonamento provvisorio e rifilatura dei piani di posa.

RILEVATO
 -Materiale di risulta degli scavi, spianato e compattato con rulli vibranti fino ad ottenere una densità non inferiore al 95% del Proctor Standard.
 -Lo spessore finito degli strati compattati sono di 30 cm per i materiali fini e di 50 - 60 cm per quelli grossolani.

INERIMENTO
 -Inerimento, previa messa in opera di 40 cm di terreno vegetale, mediante semina di un miscuglio di semi di 60% di gramigna ed al 40% di leguminose.

Ampliamento campo base in riferimento alla specifica contrattuale COCE01 01 rev.1 "requisiti di coordinamento e logistica per il Committente".

Stretto di Messina
 Concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stabile tra lo Stretto e il Cardine
 Organismo di Diritto pubblico
 (Legge n° 1158 del 17 dicembre 1971, modificata dal D.Lgs. n° 114 del 24 aprile 2003)

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA

PROGETTO DEFINITIVO

EUROLINK S.C.p.A.
 IMPREGILO S.p.A. (Mandataria)
 SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandatario)
 COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandatario)
 SACVY S.A.U. (Mandatario)
 ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandatario)
 A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandatario)

IL PROGETTISTA Dott. Ing. M. Luciani Ordine Ingegneri Roma n° 10435	IL CONTRAENTE GENERALE Project Manager (Ing. P.P. Marcheselli)	STRETTO DI MESSINA Direttore Generale e RUP Validazione (Ing. G. Fiammenghi)	STRETTO DI MESSINA Amministratore Delegato (Dott. P. Gucci)
--	--	---	---

COLLEGAMENTI VERSANTE CALABRIA [CZ0101_F0]
 CANTIERI
 OPERATIVI - LOGISTICI
 CANTIERI LOGISTICI - CB.11. - Santa Trada
 CB1 - Planimetria di progetto - Area "A", Area "B"

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
FO	20-06-2011	EMISSIONE FINALE	LAMURA	FARINA	PAGANI

CODICE: CG2600PZDCZC3CB1100001FO
 SCALE: 1:500/1:200
