

CANTIERE BASE
L.4/5.B.1
 pk 110+900,00
 Comune di Lonato (BS)
 Superficie tot. 37.000 mq
PLANIMETRIA 1:500

DESCRIZIONE	CODICE
Piano particolareggiato della cantierizzazione con GN02 a doppia canna e scavo con metodo meccanizzato - Aree e viabilità di cantiere da km 108+630 a km 112+200	A202-00-D-E2-P5-CA00 0 0 008
Piano particolareggiato della cantierizzazione Cantieri base, logistici, operativi: Tipologici pavimentazioni, recinzione, duna perimetrale	A202-00-D-E2-PZ-CA00 0 0 001
Piano particolareggiato della cantierizzazione Tipologici baraccamenti: - Prefabbricati uso ufficio	A202-00-D-E2-PA-CA00 0 0 021
- Prefabbricati uso ricreazione/formazione/infermeria, magazzino manutenz. e lavand.	A202-00-D-E2-PA-CA00 0 0 022
- Prefabbricati uso dormitorio monopiano	A202-00-D-E2-PA-CA00 0 0 023
- Prefabbricati uso dormitorio bi-piano	A202-00-D-E2-PA-CA00 0 0 002
- Prefabbricati uso mensa e cucina	A202-00-D-E2-PA-CA00 0 0 024
- Prefabbricati uso spogliatoi e servizi igien.	A202-00-D-E2-PA-CA00 0 0 027


IL CODICE COMMESSA "A202" E' STATO SOSTITUITO CON "IN05"

NOTE GENERALI

LEGENDA:

1	GUARDIOLA	21	AREA LAVAGGIO BETONIERE
2	DORMITORI	22	DEPOSITO RIFIUTI SPECIALI (container per oli)
3	LABORATORIO	23	DEPOSITO RIFIUTI URB. ed ASS.
4	MAGAZZINO	24	IMPIANTI DI DEPURAZIONE E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
5	MENSA	25	TETTOIA RICOVERO MEZZI E MATERIALI
6	REFETTORIO	26	IMPIANTO LAVAGGIO RUOTE
7	SALA DI RITROVO	27	VASCA DI ACCUMULO ACQUA IMPIANTO DI BETONAGGIO CON RISCALDATORE
8	SERVIZI	28	AREA STOCCAGGIO MATERIALE DI RISULTA DEMOLIZIONE CLS
9	UFFICI	29	AREA PREFABBRICAZIONE PICCOLI MANUFATTI
10	INFERMERIA	30	AREA DI PREASSEMBLAGGIO FERRO + GRU A TORRE
11	SPOGLIATOIO	31	TETTOIA DI PROTEZIONE SABBIA
12	LAVANDERIA	32	CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE
13	IMPIANTO DI BETONAGGIO	33	PESA AUTOMEZZI
14	AREA STOCCAGGIO INERTI PER CLS	34	DUNA DI PROTEZIONE PERIMETRALE
15	OFFICINA	35	RECINZIONE PERIMETRALE
16	DISTRIBUTORE GASOLIO	36	CENTRALE TERMICA
17	PARCHEGGIO COPERTO	37	AREE PER SUBAPPALTATORI E APPALTATORI
18	PARCHEGGI	38	AREA PER STOCCAGGIO REPERTI ARCHEOLOGICI
19	AREA DI STOCCAGGIO	39	CAMPO DA CALCETTO 20x30
20	AREA LAVAGGIO AUTOMEZZI	40	CAPANNONE PREFABBRICAZIONE

Per quanto riguarda le informazioni progettuali della linea si faccia riferimento agli elaborati specialistici

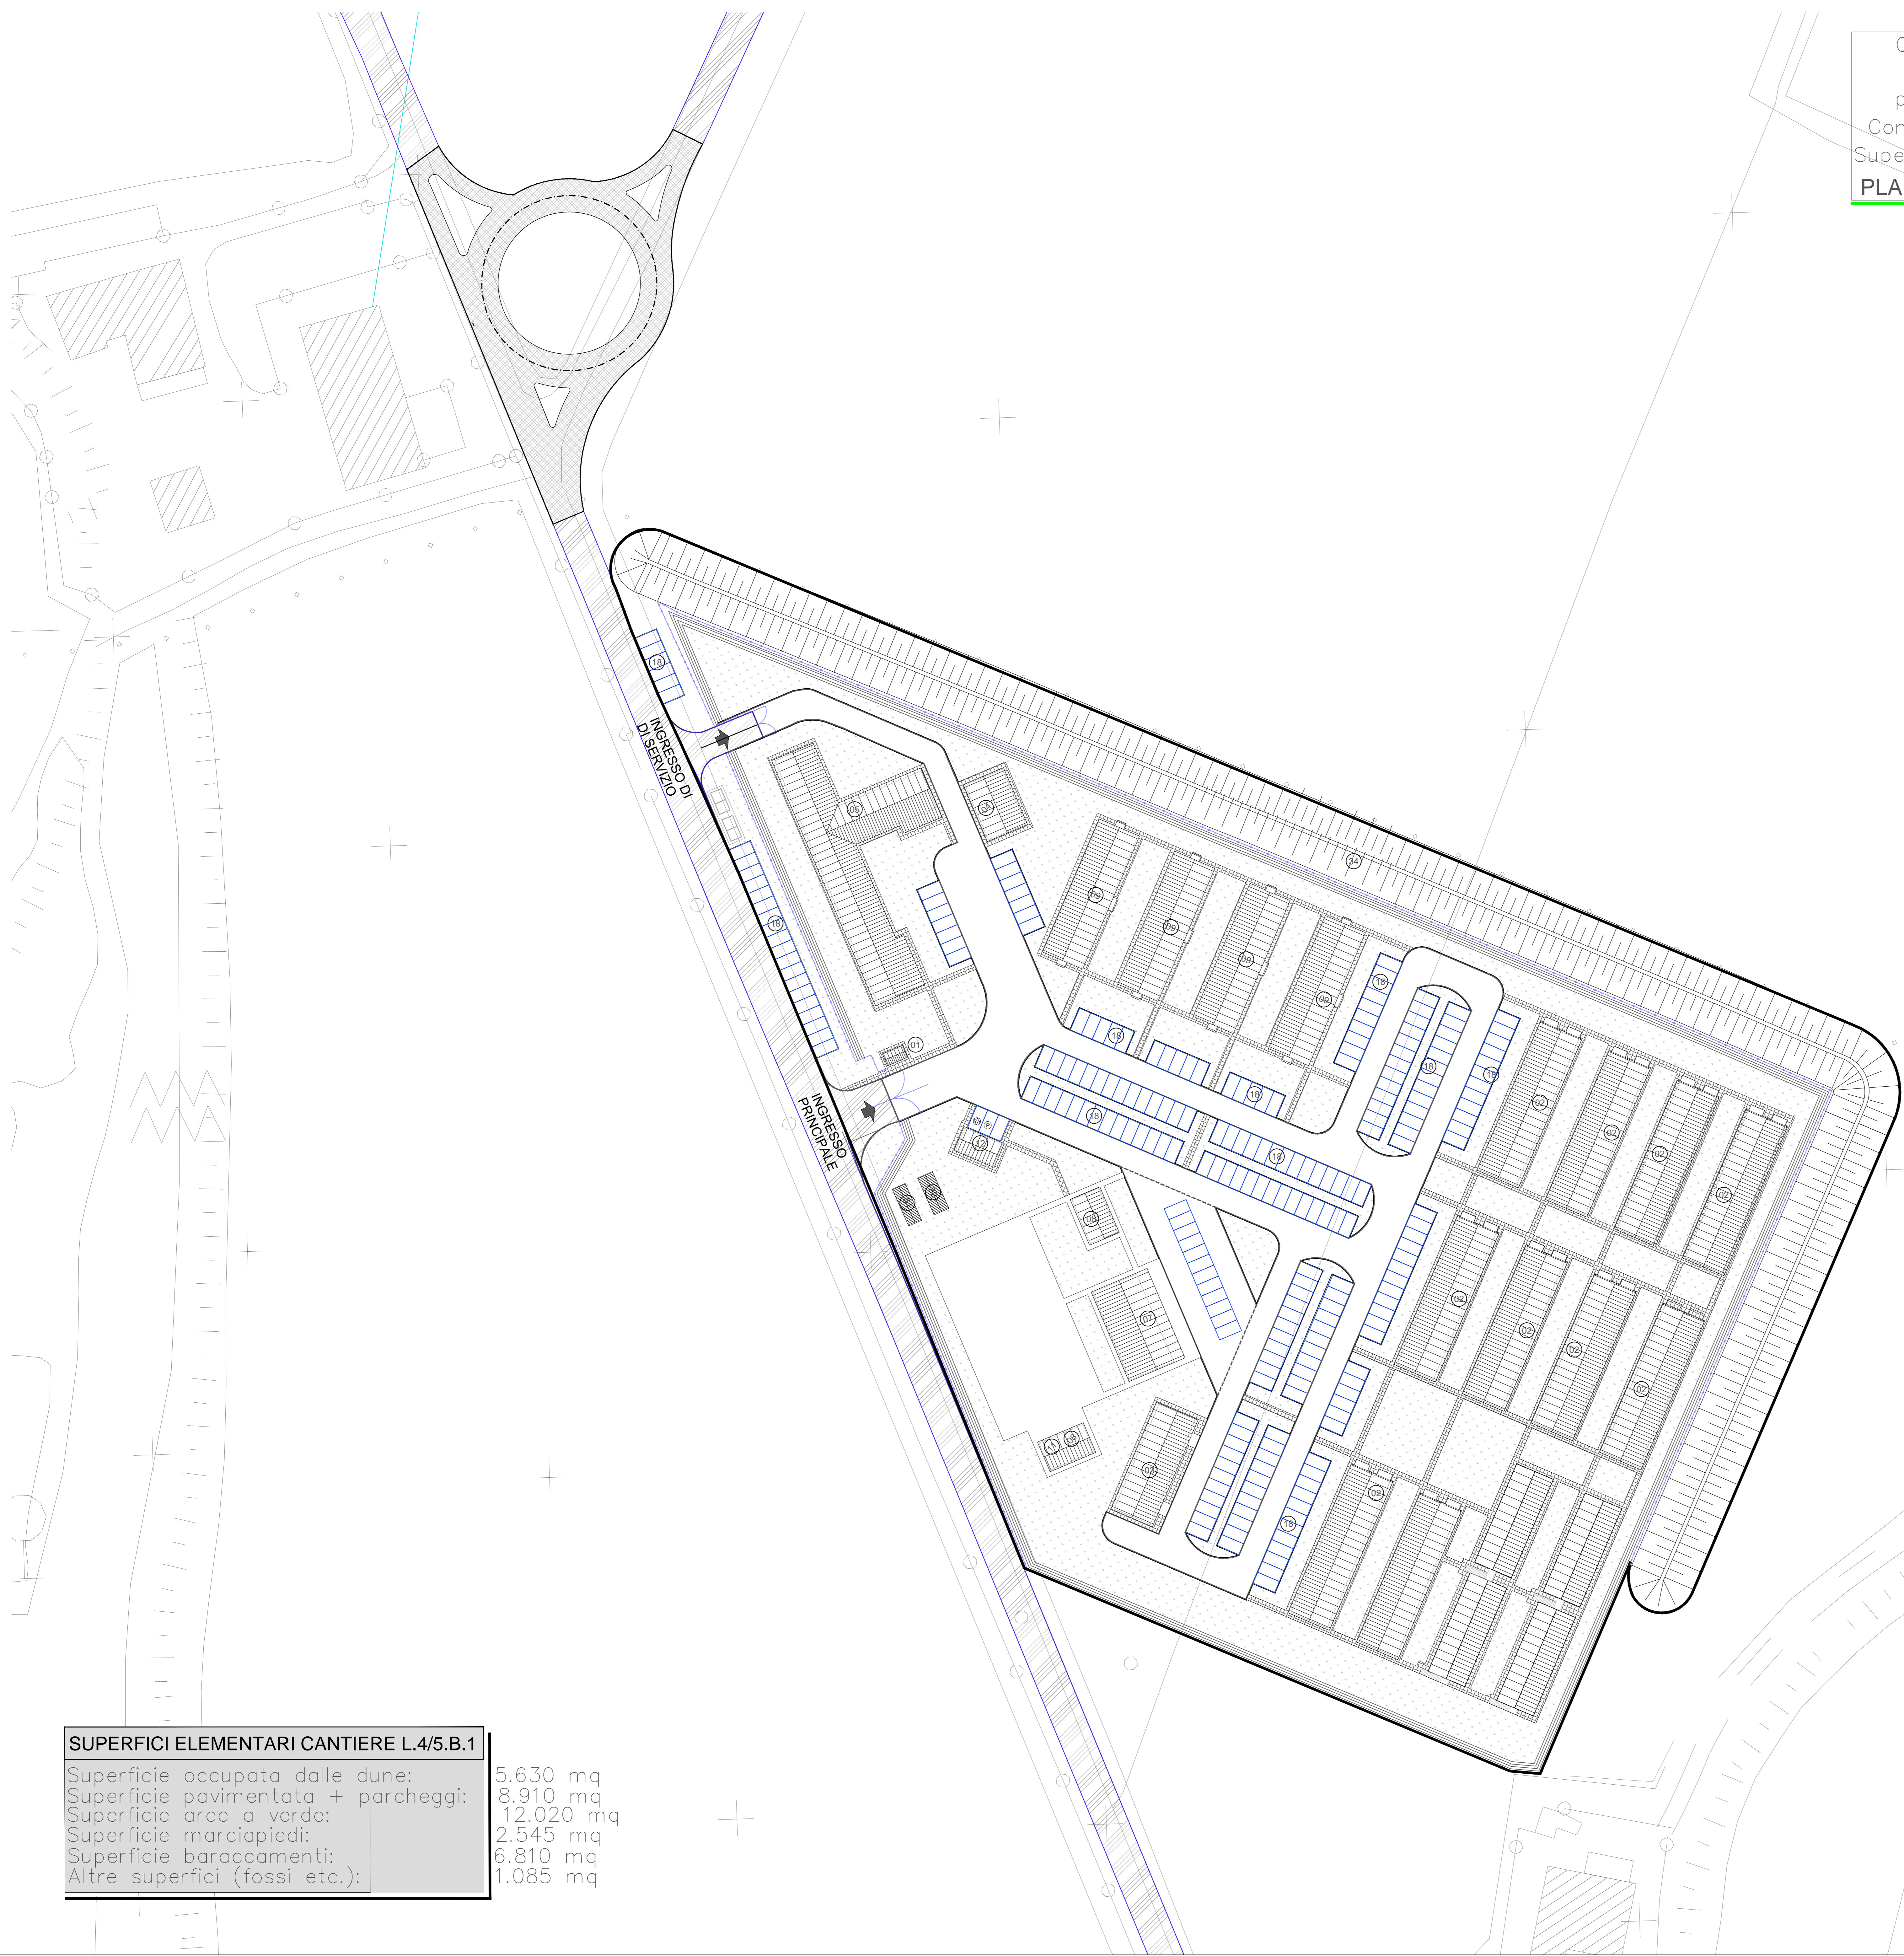

SUPERFICI ELEMENTARI CANTIERE L.4/5.B.1

Superficie occupata dalle dune:	5.630 mq
Superficie pavimentata + parcheggi:	8.910 mq
Superficie aree a verde:	12.020 mq
Superficie marciapiedi:	2.545 mq
Superficie baraccamenti:	6.810 mq
Altre superfici (fossi etc.):	1.085 mq

COMMITTENTE: 

ALTA SORVEGLIANZA: 

GENERAL CONTRACTOR: 

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA A.V. /A.C. TORINO - VENEZIA Tratta MILANO - VERONA
 Lotto funzionale Brescia-Verona
 PROGETTO DEFINITIVO

PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA CANTIERIZZAZIONE CON GN02 A DOPPIA CANNA E SCAVO CON METODO MECCANIZZATO
 Cantiere L.4/5.B.1 - Planimetria generale con sistemazioni esterne

ALTA SORVEGLIANZA  Verificato: _____ Data: _____ Approvato: _____ Data: _____

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV. SCALA
 IN05 00 D E2 P8 CA0000 010 0 1:500

Rev.	Data	Descrizione	Registato	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato/Consortio
0	31/03/14	EMISSIONE PER CDS		31/03/14		31/03/14		31/03/14	
1									
2									
3									

Sapem S.p.a. COMM. 032121 [Data: 31/03/14] [Doc: 31543_04.dwg]

Progetto cofinanziato dalla Unione Europea CUP: F81H9100000008
