


BOE SU AREE DI CANTIERE E PISTE DI CANTIERE  
(a carico dell'Appaltatore)

Caso 1:		Bonifica superficiale - 197396,90 MQ
Caso 2:		Bonifica superficiale + bonifica profonda fino a 3m dal P.C. (perforazione fino a -3m dal P.C. - garanzia fino a 4m) - 197396,90 MQ


WBS	BONIFICA SU TERRENO (mq)				
	SUP.	acq. +4	acq. -7	-7	
1	RI01	1788	1757	31	0
2	TR01	10422	7199	3223	0
3	IN01	0	0	0	0
4	RI02	25095	25095	0	0
5	TR02	23725	13625	10100	0
6	RI03	49595	46483	3112	0
7	RI04	34550	22896	222	11432
8	VI01	59543	30696	13501	15346
9	RI05	21138	20171	967	0
10	NOV01	25285	23345	1940	0
11	RI06	27317,5	24971,5	2346	0
12	TR03	14532	4300	10232	0
13	RI07	4912	4474	438	0
14	RI08	28911	28425	297	189
15	RI09	13533	13533	0	0
16	TR04	24426	13439	10987	0
17	RI10	4444	4336	108	0
<b>TOTALI</b>		<b>369216,5</b>	<b>284745,5</b>	<b>57504</b>	<b>26967</b>

BONIFICA IN PRESENZA D'ACQUA (mq)		
SUP.	acq. +4	acq. -7
2248	1370	800
<b>2248</b>	<b>1370</b>	<b>800</b>

Come previsto dalla direttiva GEN-BST001/2020 all'annesso III- punto 2.3.1.2:  
La zona da bonificare sarà divisa in "campi" numerati delle dimensioni di m. 50 x 50, a sua volta suddivisi in "strisce" della larghezza massima di m. 0,80 (identificate da lettere).  
Nel caso di aree da bonificare in cui una dimensione prevale nettamente sull'altra, i "campi" potranno avere anche lati di dimensione diversa, con un massimo di 50 m.

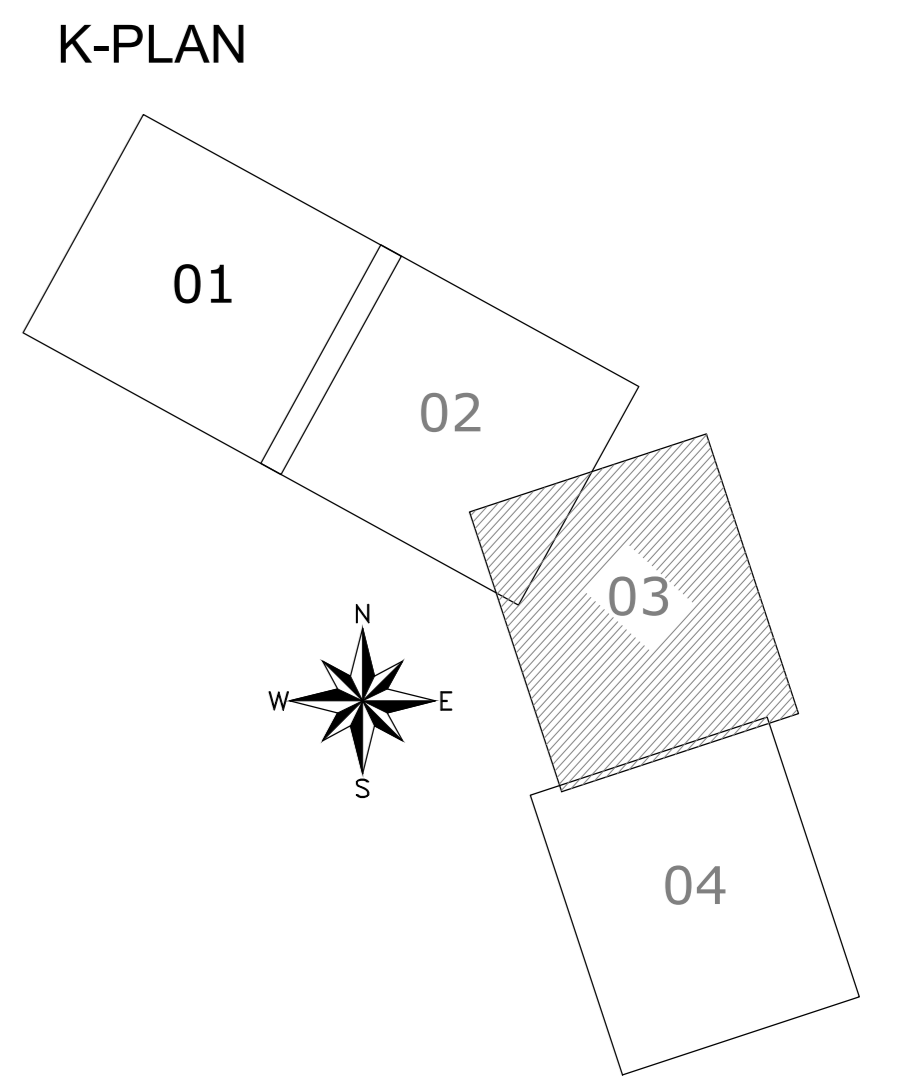


Schema bonifica da ordigni bellici profonda

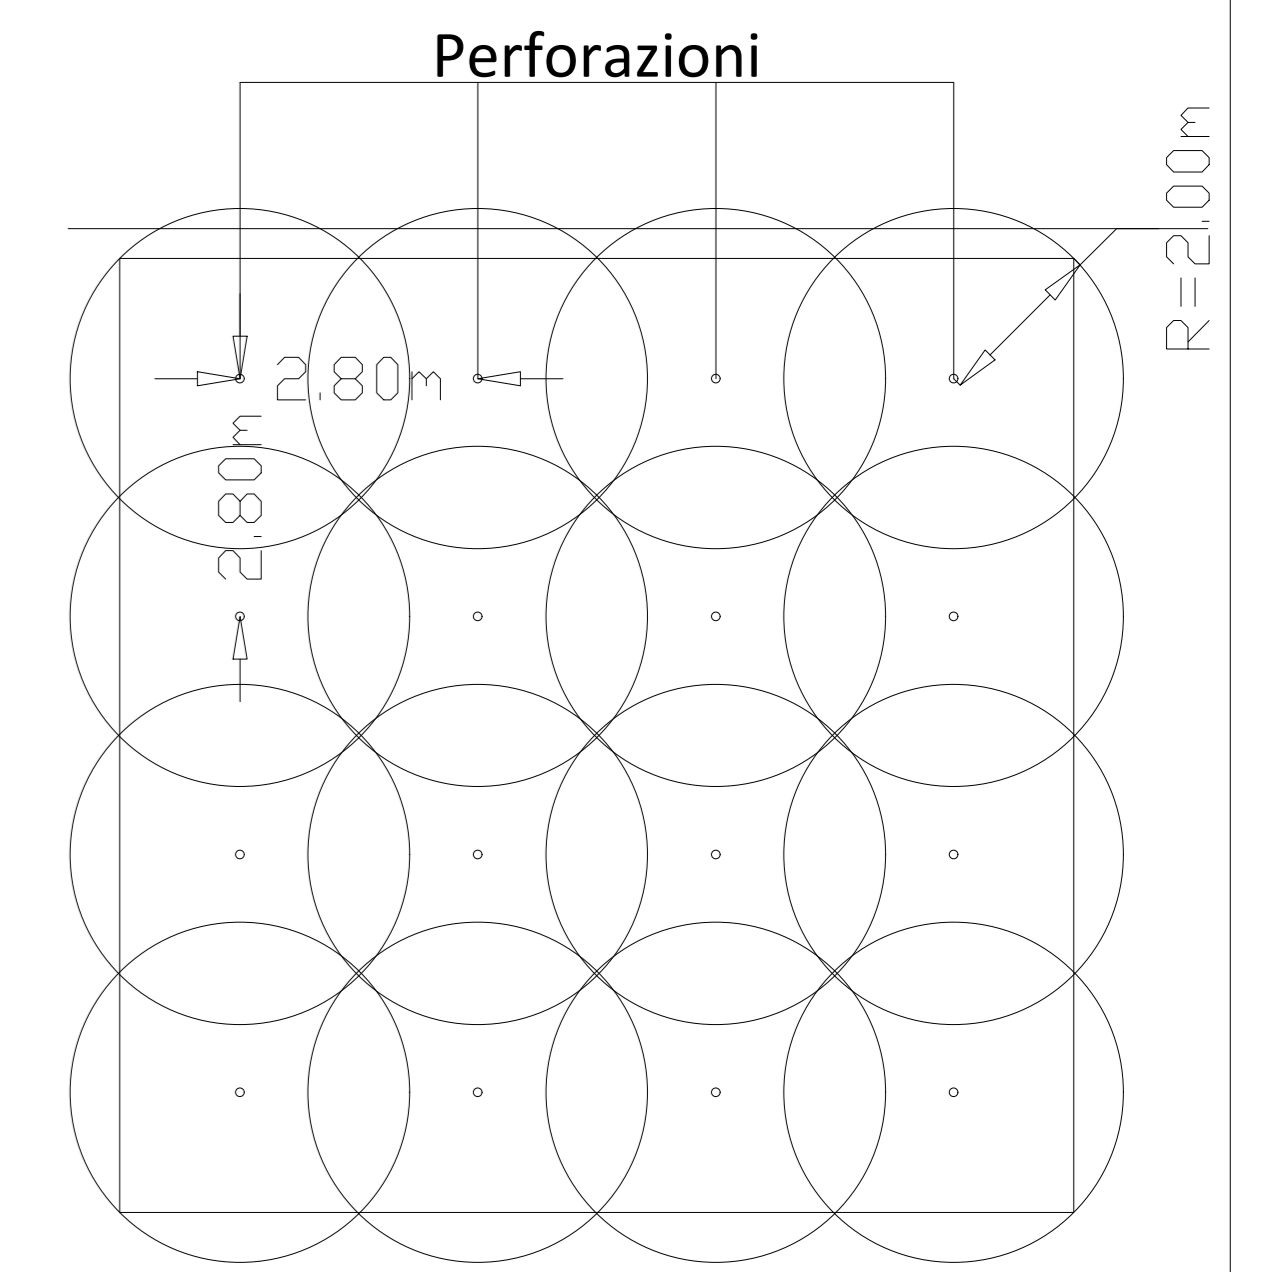

Bonifica profonda verticale con perforazione

LEGGENDA

Caso 1:		Bonifica superficiale - 433.042 MQ
Caso 2:		Bonifica superficiale + bonifica profonda fino a 3m dal P.C. (perforazione fino a -3m dal P.C. - garanzia fino a 6m) - 348.571,00 MQ
Caso 3:		Bonifica superficiale + bonifica profonda fino a 5m dal P.C. (perforazione fino a -5m dal P.C. - garanzia fino a 8m) - 57.504,00 MQ
Caso 4:		Bonifica superficiale + bonifica profonda fino a 7m dal P.C. (perforazione fino a -7m dal P.C. - garanzia fino a 8m) - 26.967,00 MQ
Caso 5:		Bonifica superficiale in acqua - 2.248,00 MQ
Caso 6:		Bonifica superficiale in acqua + bonifica profonda in acqua fino a 3m dal P.C. (perforazione fino a -3m dal P.C. - garanzia fino a 4m) - 1.370,00 MQ
Caso 7:		Bonifica superficiale in acqua + bonifica profonda in acqua fino a 7m dal P.C. (perforazione fino a -7m dal P.C. - garanzia fino a 8m) - 800,00 MQ

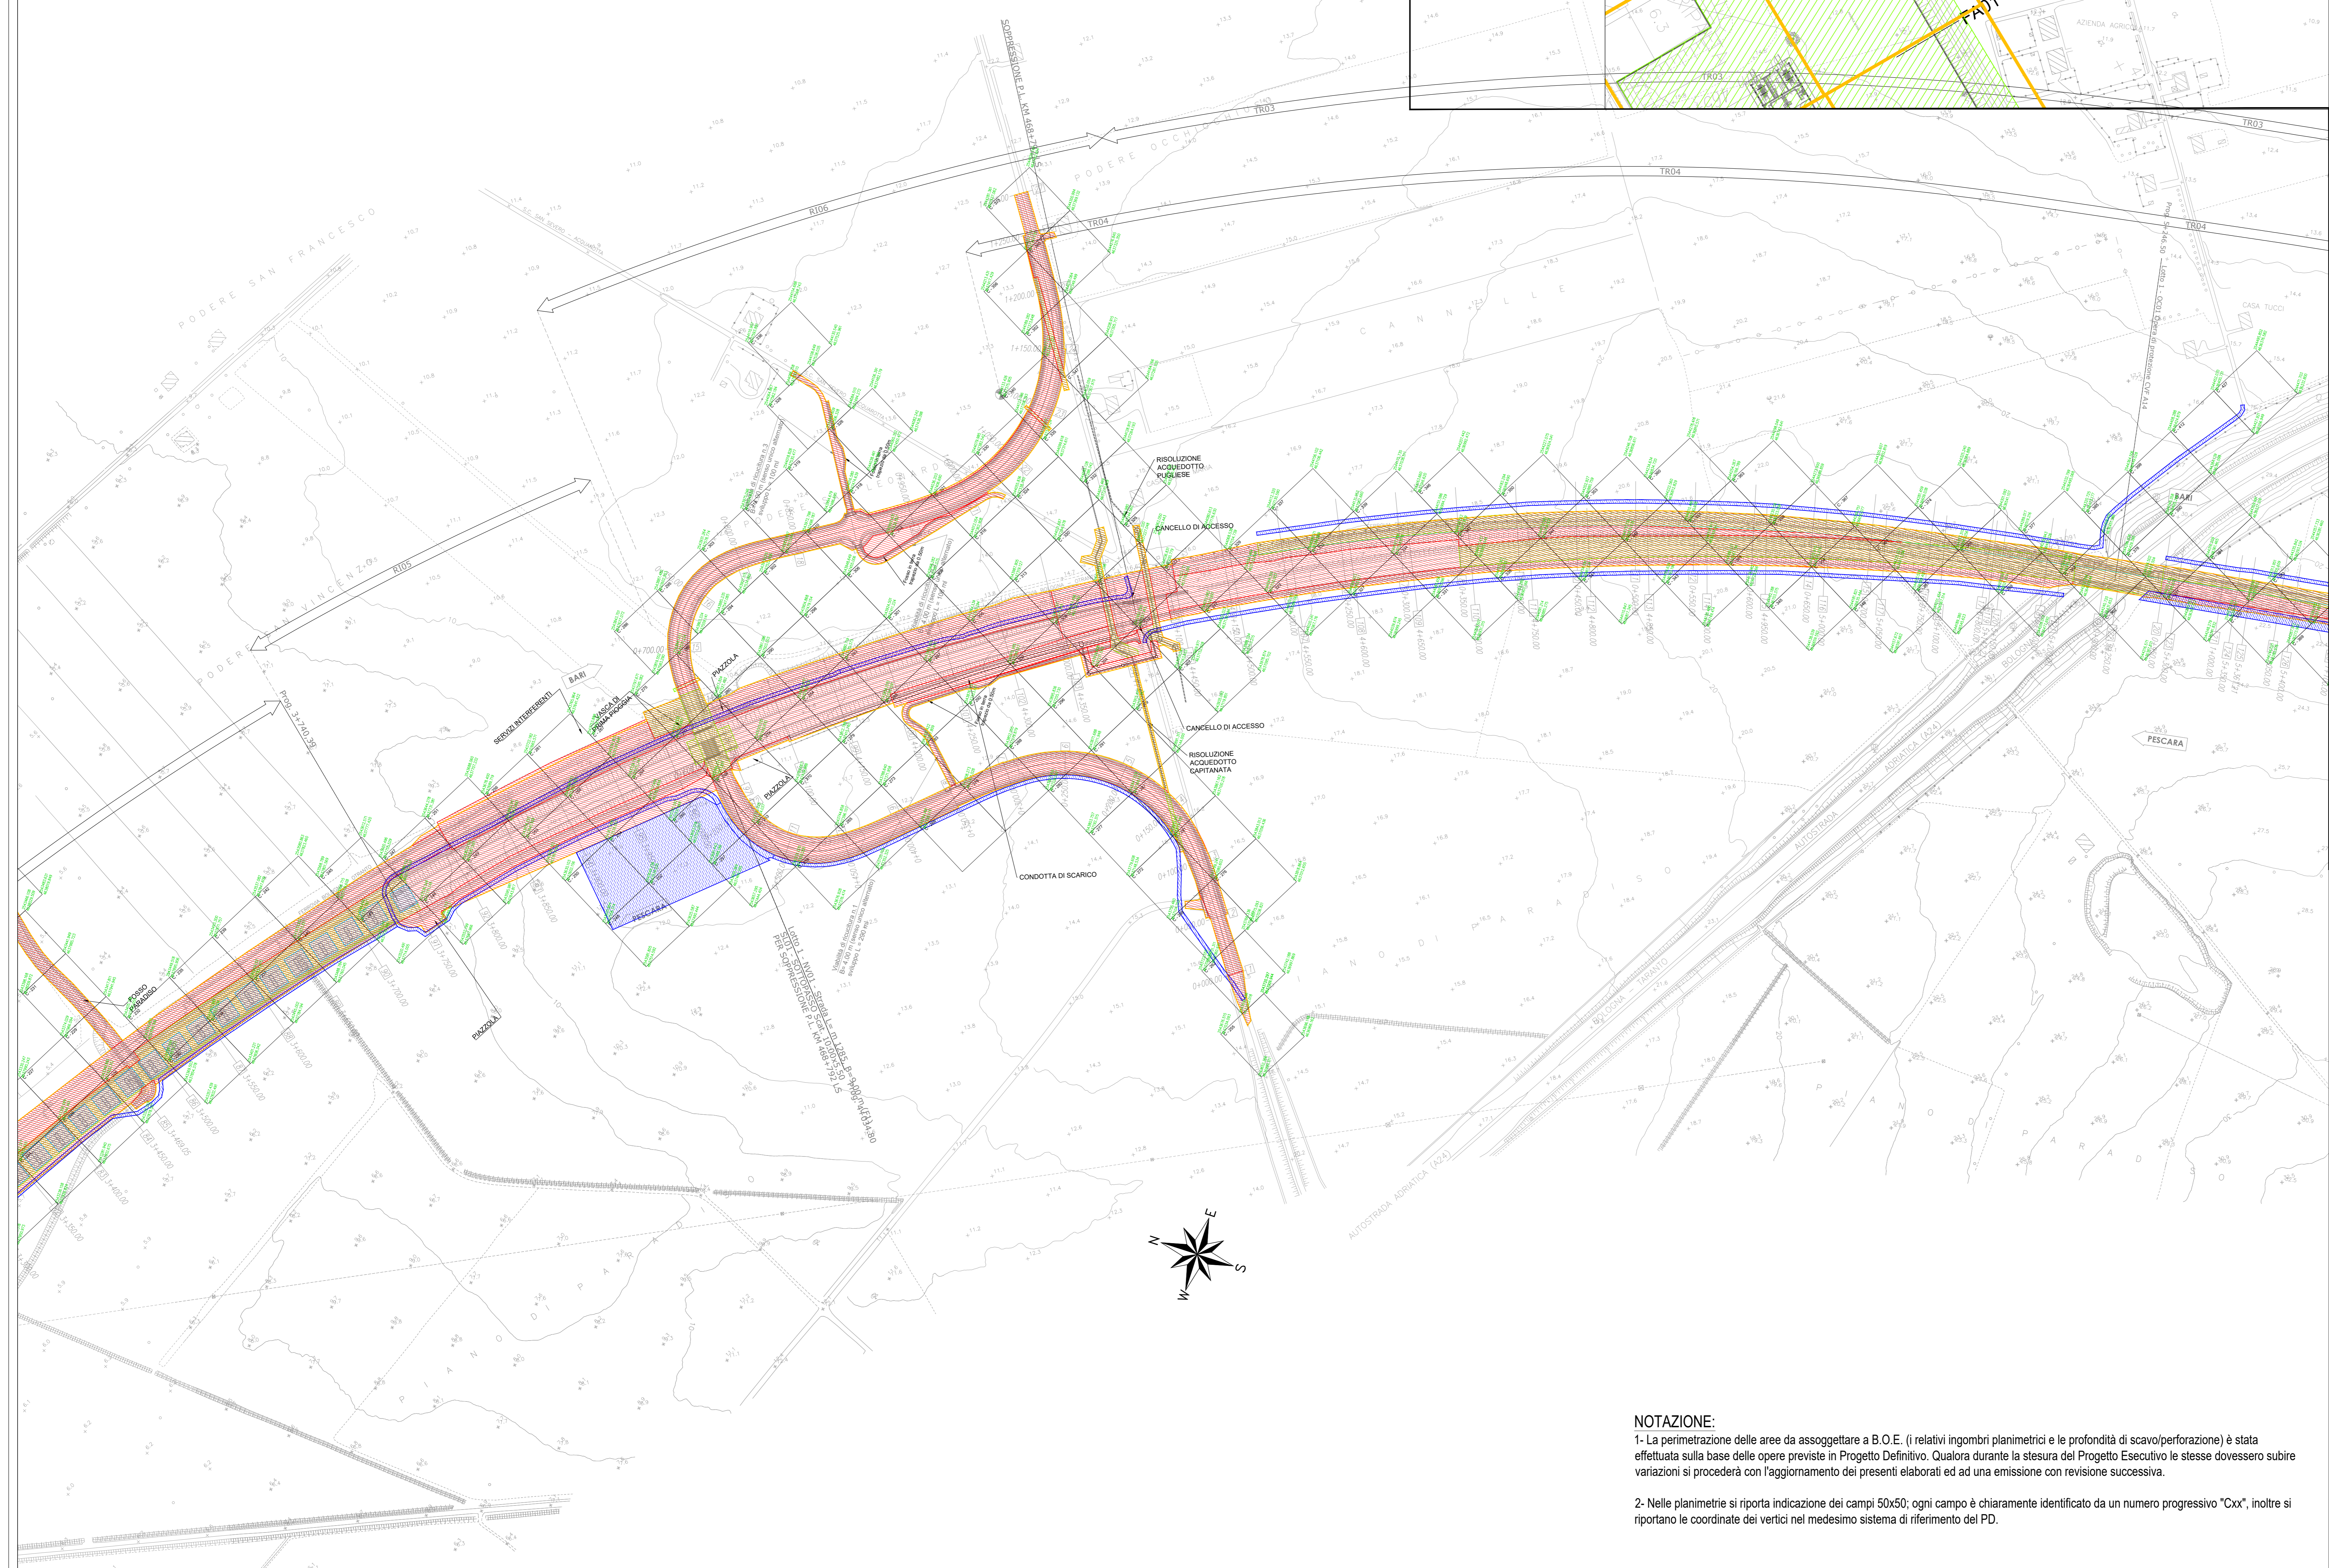

NOTAZIONE:

- La perimetrazione delle aree da assoggettare a B.O.E. (i relativi ingombri planimetrici e le profondità di scavo/perforazione) è stata effettuata sulla base delle opere previste in Progetto Definitivo. Qualora durante la stesura del Progetto Esecutivo le stesse dovessero subire variazioni si procederà con l'aggiornamento dei presenti elaborati ed ad una emissione con revisione successiva.
- Nelle planimetrie si riporta indicazione dei campi 50x50; ogni campo è chiaramente identificato da un numero progressivo "Cxx", inoltre si riportano le coordinate dei vertici nel medesimo sistema di riferimento del PD.

COMMITTENTE:  
**RFI**  
RETE FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO  
DIREZIONE INVESTIMENTI  
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI  
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:  
**ITALFER**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

APPALTATORE:  
**CONPAT**  
**AGOSTINO COSTELLINI**

PROGETTAZIONE: MANDATARIA **VIA** MANDANTI **HYPRO HUB** **MIOTOP**

PROGETTO ESECUTIVO  
**LINEA PESCARA - BARI**  
**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLE - LESINA**  
**LOTTO 1: RIPALTA - LESINA**

B.O.E. - BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI  
PLANIMETRIA DI PROGETTO B.O.E.  
Tav. 3 di 4

APPALTATORE <b>CONPAT S.p.A.</b> Il Direttore Tecnico (Ing. Gianguido Babini)	PROGETTAZIONE <b>AGOSTINO COSTELLINI</b> PROFESSIONISTA REG. N. 13276	SCALA: 1:2000					
COMMESSA/LOTTO	FASE	ENTRATA IN SERVIZIO	DISCIPLINA	PROGR.	REV.		
L107	01	22	E6	B0000	003		
Revis.	Descrizione	Redatto	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Rev. Data
A	Emissione Emissioni	V. Babini	V. Babini	Lug. 2021	G. Costellini	Lug. 2021	M. Di Giuseppe
B	Revisione Emissioni	V. Babini	V. Babini	Set. 2021	G. Costellini	Set. 2021	M. Di Giuseppe
C	Modifica inquadro di B.O.E. al 15.121	V. Babini	V. Babini	Ott. 2021	G. Costellini	Ott. 2021	M. Di Giuseppe
