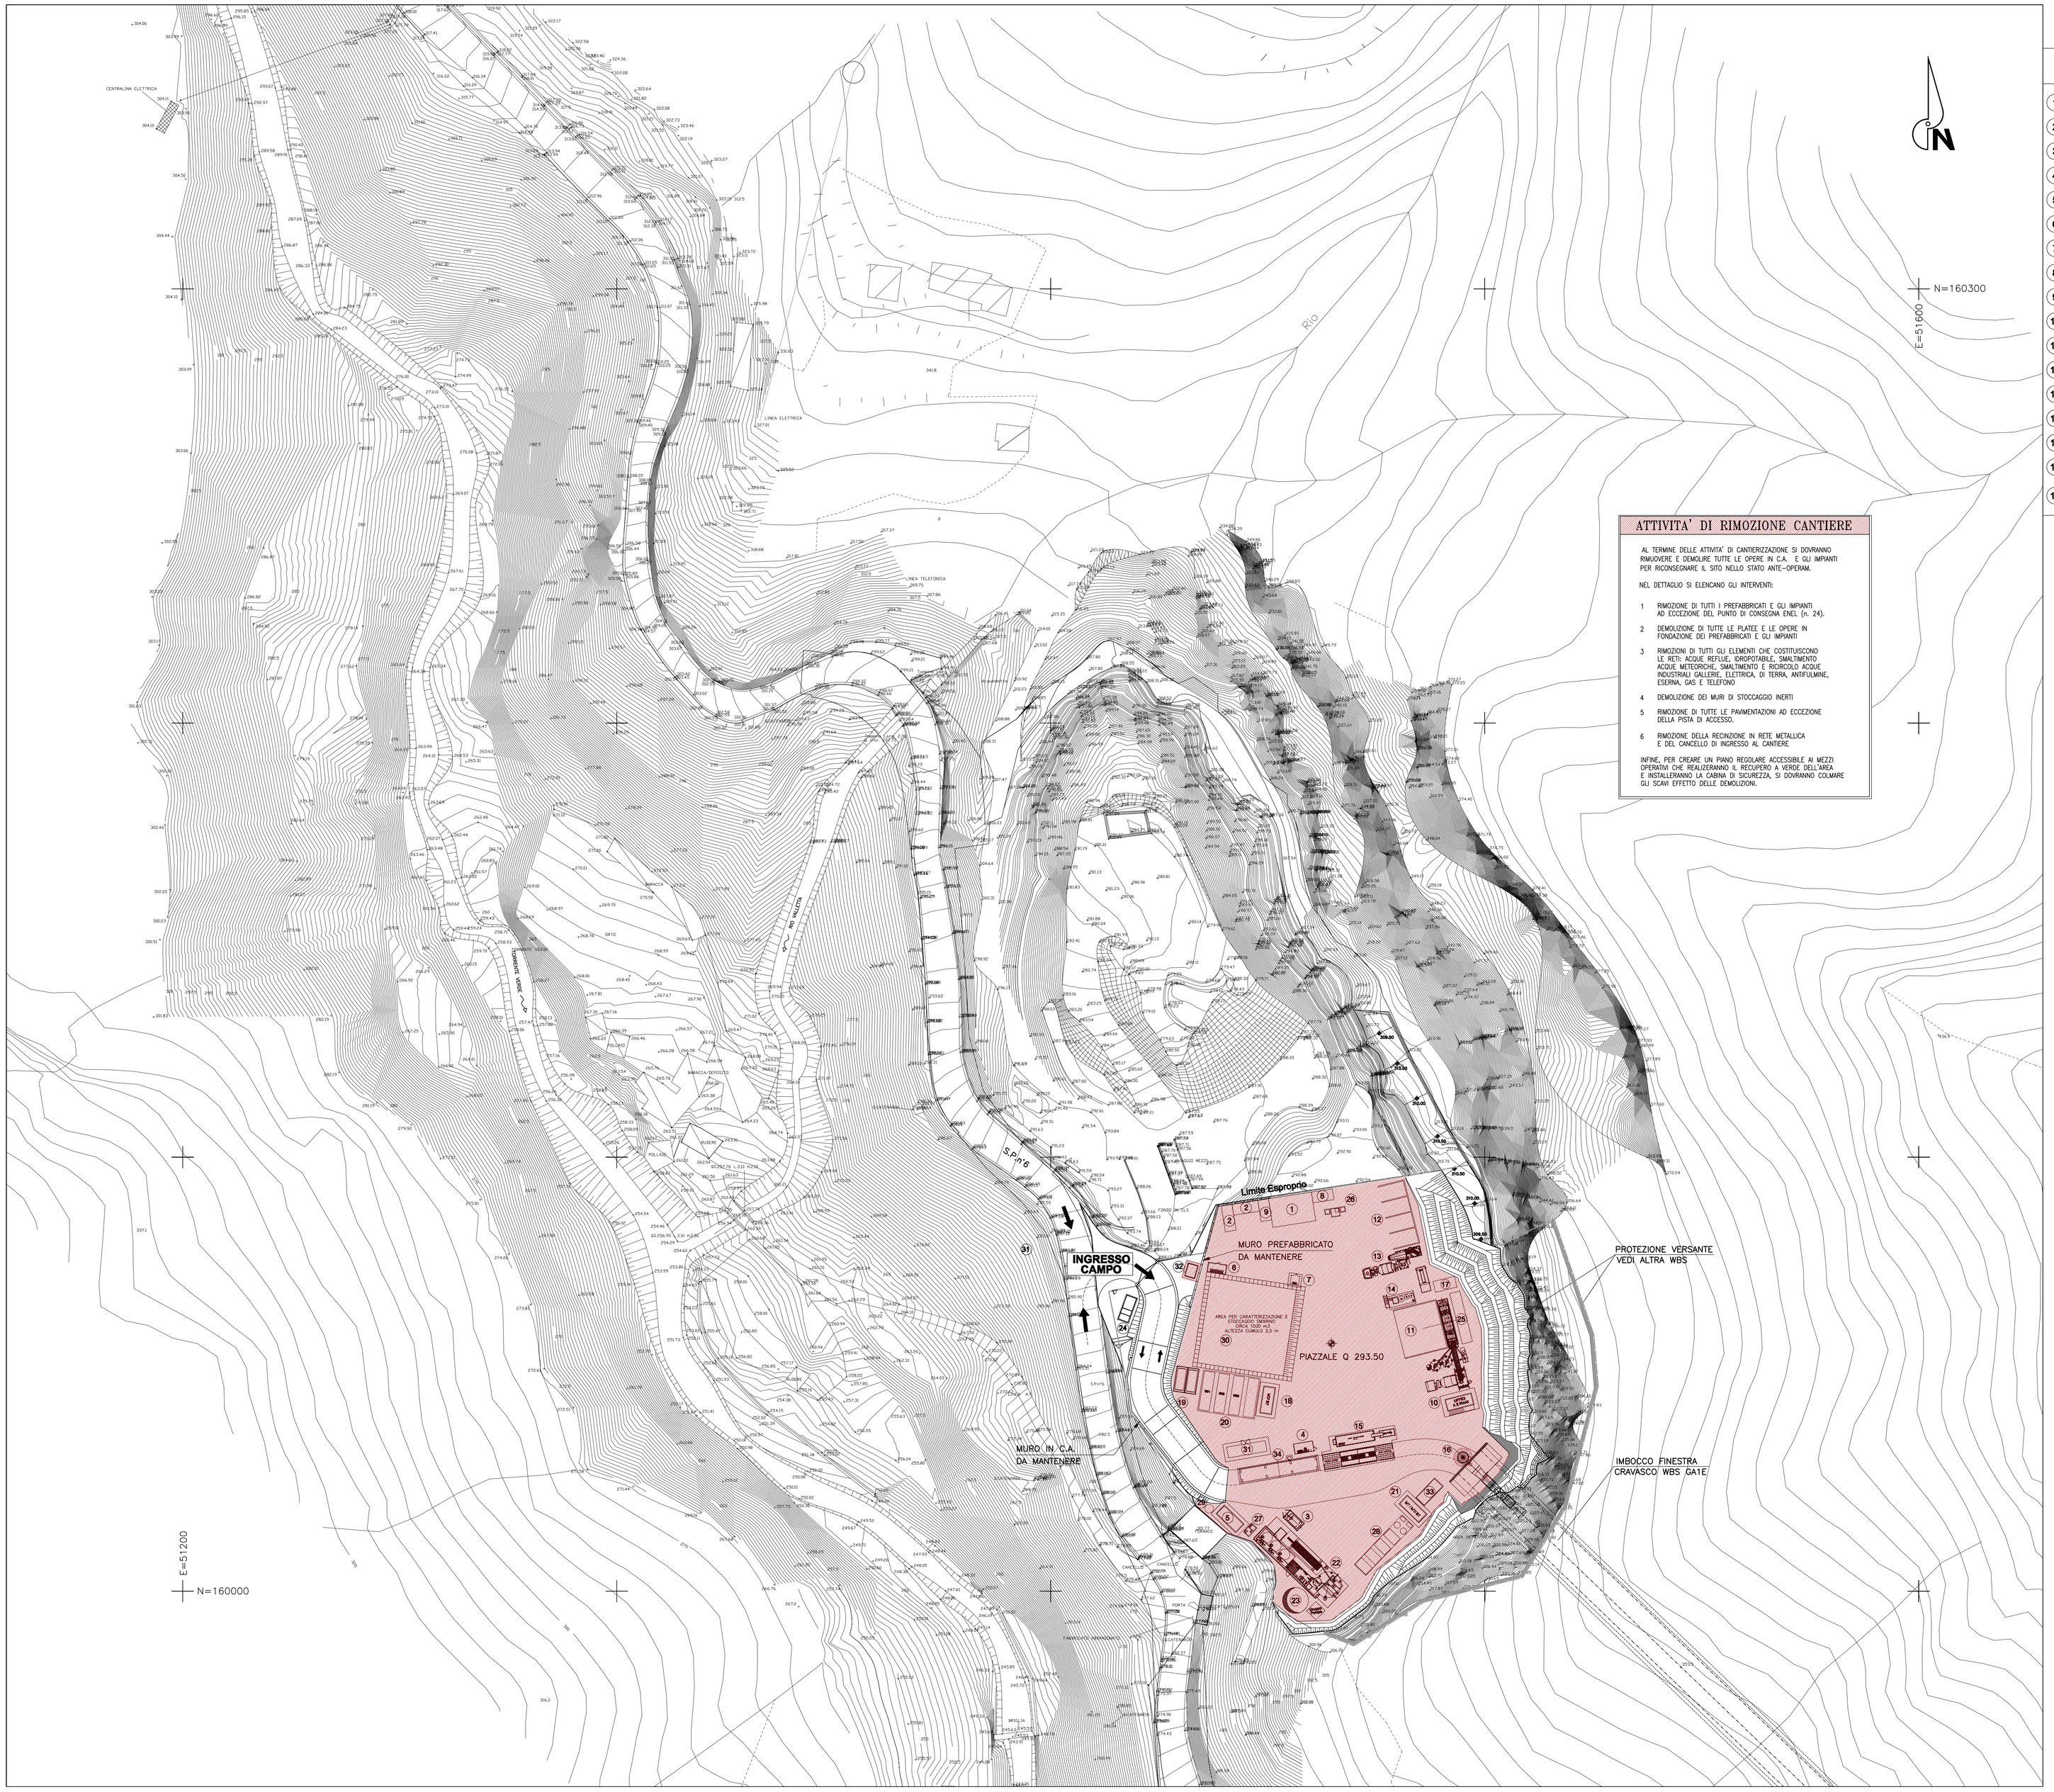

ATTIVITA' DI RIMOZIONE CANTIERE

AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DI CANTIERIZZAZIONE SI DOVRANNO RIMUOVERE E DEMOLIRE TUTTE LE OPERE IN C.A. E GLI IMPIANTI PER RICONSEGNARE IL SITO NELLO STATO ANTE-OPERAM.

NEL DETTAGLIO SI ELENCANO GLI INTERVENTI:

1 RIMOZIONE DI TUTTI I PREFABBRICATI E GLI IMPIANTI AD ECCEZIONE DEL PUNTO DI CONSEGNA ENEL (n. 24).

2 DEMOLIZIONE DI TUTTE LE PILATEE E LE OPERE IN FONDAZIONE DEI PREFABBRICATI E GLI IMPIANTI

3 RIMOZIONI DI TUTTI GLI ELEMENTI CHE COSTITUISCONO LE RETI: ACQUE REFLUE, IDROPOTABILE, SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE, SMALTIMENTO E RICIRCOLO ACQUE INDUSTRIALI GALLERIE, ELETTRICA, DI TERRA, ANTIFULMINE, ESERNA, GAS E TELEFONO

4 DEMOLIZIONE DEI MURI DI STOCCAGGIO INERTI

5 RIMOZIONE DI TUTTE LE PAVIMENTAZIONI AD ECCEZIONE DELLA PISTA DI ACCESSO.

6 RIMOZIONE DELLA RECINZIONE IN RETE METALLICA E DEL CANCELLO DI INGRESSO AL CANTIERE

INFINE, PER CREARE UN PIANO REGOLARE ACCESSIBILE AI MEZZI OPERATIVI CHE REALIZZERANNO IL RECUPERO A VERDE DELL'AREA E INSTALLERANNO LA CABINA DI SICUREZZA, SI DOVRANNO COLMARE GLI SCAVI EFFETTI DELLE DEMOLIZIONI.

LEGENDA

1	Officina	18	Cabina elettrica di trasformazione MT / BT
2	Box attrezzature	19	Serbatoi gasolio per gruppi elettrogeni
3	Distributore carburante	20	Gruppi elettrogeni
4	Uffici	21	Cabina elettrica MT / MT / BT
5	Servizi igienici	22	Impianto trattamento acque di galleria
6	Deposito bombole ossigeno	23	Serbatoio antincendio + acqua industriale completo di gruppo di pompaggio
7	Deposito bombole acetilene	24	Punto di consegna Enel
8	Deposito olii nuovi	25	Impianto riscaldamento inerti
9	Deposito olii usati	26	Vasca di disoleazione acque di lavaggio officina
10	Ufficio a 2 piani	27	Vasca di prima pioggia
11	Impianto di betonaggio	28	Gruppo elettrocompressori con serbatoi A.C. (Pmax. 12bar)
12	Stoccaggio inerti	29	Fossa biologica Imhoff
13	Impianto lavaggio autobetoniere	30	Area stoccaggio smarino + caratterizzazione
14	Trattamento acque impianto di betonaggio	31	Infermeria
15	Impianto lavaruote	32	Guardiania
16	Impianto ventilazione (per scavo finestra e cameroni)	33	Container per inverter ventilazione
17	Serbatoio additivo	34	Pesa a ponte

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

COCIV
Consorzio Collegamenti Integrati Veloci

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO

Cantiere di servizio Cravasco CSL2 - FASE 1
PLANIMETRIA GENERALE DELLE ATTIVITA' DI RIMOZ. CANTIERE

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA:
Consorzio **Cociv** Ing. P.P. Marcheselli		1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I G 5 1	0 0	E	C V	P 8	C A 2 8 0 1	0 0 6	A

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima Emissione	COCIV	29/01/2014	COCIV	29/01/2014	A. Palomba	31/01/2014	Dott. Ing. Paolo Marcheselli Ordine Ingegneri Prov. TO n. 6271 R

n. Elab.

Nome File: GB-BCO-RO-B4-0848

CUP: F81H92000000008

Scala di plot: 1: 1
