Area di lavoro per le attività di consolidamento del terreno necessarie alla riduzione dei cedimenti in corrispondenza delle interferenze IN23-24



DT03
DEPOSITO TEMPORANEO CON AREA PARI A 36.000,00 mq

PLANIMETRIA DEPOSITO TEMPORANEO
Scala 1:200

UTILIZZO DELL'AREA
Area per depositi terra per la gestione dei materiali prodotti dagli scavi nella eventuale indisponibilità dei siti di conferimento definitivo. L'area fungerà da polmone di accumulo per tutte le opere alle gallerie artificial GA02, GA03, GA04, GA05 e la galleria naturale GN03 lato Ripalta.

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE
FASE 1: rimozione della vegetazione ;
FASE 2: scotico, livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato 36.000 mq;
FASE 3: installazione della recinzione Tipo B 838 ml;
FASE 4: approntamento del cantiere e realizzazione degli impianti di cantiere.

ALLESTIMENTI DI CANTIERE	
quantità allestimento	tipo di allestimento
1	Prefabbricato modulare ad uso uffici; dim. 7x2.4m
6	Bagni chimici con lavabo
1	Pesa
10	Stalli auto
7	Stalli mezzi d'opera

APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO/IDRICO
La fornitura di energia elettrica del cantiere avviene mediante l'utilizzo di un gruppo elettrogeno da 20 kW. I lampioni per l'illuminazione delle aree di cantiere saranno alimentati da pannelli fotovoltaici.
L'alimentazione idrica dei baraccamenti avviene mediante una vasca di riserva idrica di 2.000 lt

IMPIANTI DI CANTIERE
Impianto idrico sanitario
impianto di smaltimento acque
Impianto elettrico
Impianto Illuminazione con pannelli fotovoltaici
Impianto di terra

LEGENDA

CANTIERI Simbolo	Descrizione	VIABILITÀ Simbolo	Descrizione
	CB – CANTIERE BASE		LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO
	CO – CANTIERE OPERATIVO		LINEA FERROVIARIA ESISTENTE
	CA – CANTIERE DI ARMAMENTO		AUTOSTRADA A1-4
	AT – AREA TECNICA		VABILITÀ PRINCIPALE
	AS – AREA STOCCAGGIO		VABILITÀ SECONDARIA
	AL – AREA DI LAVORO		VABILITÀ DA ADEGUARE
	ASD – AREA DISMISSIONE		PISTA DI CANTIERE
	DT – DEPOSITO TEMPORANEO		LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO A CURA DI ALTRO APPALTO
	AREA DI CANTIERE A CURA DI ALTRO APPALTO		PROSPETTIVA FOTOGRAFICA
	ACCESSO AI CANTIERI		VARCO DI ACCESSO
			SENSI DI MARCIA

TABELLA DEI CANTIERI

Codice	Descrizione	Comune	Superficie
CB01	CANTIERE BASE PER LAVORI DA INIZIO INTERVENTO A FINE VARIANTE	CAMPOMARINO (CB)	8.500 mq
CB02	CANTIERE BASE PER LAVORI DA FINE VARIANTE A FINE INTERVENTO	LIVERA (CB)	20.000 mq
CO01	CANTIERE OPERATIVO	TORMALI (UD)	11.000 mq
CO02	CANTIERE OPERATIVO	CAMPOMARINO (CB)	10.000 mq
CO03	CANTIERE OPERATIVO	LIVERA (CB)	30.000 mq
AT02	AREA TECNICA	TORMALI (UD)	3.000 mq
AT03	AREA TECNICA	TORMALI (UD)	9.000 mq
AT04	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	15.000 mq
AT05	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	4.000 mq
AT06	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	6.700 mq
AT07	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	9.000 mq
AT08	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	4.000 mq
AT09	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	2.600 mq
AT10	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	5.600 mq
AT11	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	9.100 mq
AT12	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	900 mq
AS01	AREA DI STOCCAGGIO	TORMALI (UD)	3.900 mq
AS02	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	8.400 mq
AS03	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	10.000 mq
AS04	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	15.000 mq
AS05	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	11.500 mq
AS06	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	11.500 mq
AS07	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	900 mq
AS08	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	5.000 mq
AS09	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	7.500 mq
AS10	AREA DI STOCCAGGIO	SERRACAPRIOLA (FG)	10.000 mq
CA01	CANTIERE DI ARMAMENTO ALL'INTERNO DELLA STAZIONE FS DI TERMOLI	TORMALI (UD)	13.000 mq
CA02	CANTIERE PER DISMISSIONE L.S. ALL'INTERNO DELLA STAZ.- FS DI CAMPOMARINO	CAMPOMARINO (CB)	2.500 mq
CA03	CANTIERE DI ARMAMENTO DA ALLESTIRE IN MANOVRA AL SCEME IN PROGETTO	SERRACAPRIOLA (FG)	14.400 mq
ASD01	CANTIERE PER LA DISMISSIONE DELLA L.S. ALL'INTERNO DELLA STAZIONE FS DI NUOVA CLISTRIA (ATTUALMENTE FUORI USO)	CAMPOMARINO (CB)	5.000 mq
ASD02	CANTIERE PER DISMISSIONE L.S. ALL'INTERNO DELLA STAZ.- FS DI CHIEUTI	CAMPOMARINO (CB)	3.300 mq
DT01	DEPOSITO TEMPORANEO	TORMALI (UD)	21.500 mq
DT02	DEPOSITO TEMPORANEO	TORMALI (UD)	14.500 mq
DT02bis	DEPOSITO TEMPORANEO	TORMALI (UD)	12.300 mq
DT02bis	DEPOSITO TEMPORANEO	TORMALI (UD)	30.000 mq
DT03	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	36.000 mq
DT04	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	28.800 mq
DT05	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	16.000 mq
DT06	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	20.000 mq
DT07	DEPOSITO TEMPORANEO	LIVERA (CB)	15.000 mq
DT08	DEPOSITO TEMPORANEO	SERRACAPRIOLA (FG)	21.000 mq

PUNTO DI RACCOLTA
DEFIBRILLATORE
ESTINTORE
BARELLA
CASSETTA DI SOCCORSO

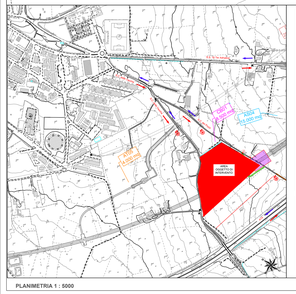

LEGENDA

MODULI PREFABBRICATI Simbolo	Descrizione	AREE ED ELEMENTI INTERNI AL CANTIERE Simbolo	Descrizione	Simbolo	VIABILITÀ Descrizione
01	Prefabbricato punto di consegna MT	12	Tendostruttura		Percorsi viabilità mista
02	Prefabbricato Cabina di trasformazione MT/BT	13	Area deposito carburanti		Percorsi viabilità pesante
03	Prefabbricato Guardiana	14	Impianto di betonaggio		Percorsi viabilità leggera
04	Magazzino	15	Impianto lavaruote		
05	Prefabbricato Spogliatoi e wc	16	Vasca di recupero acque		
06	Prefabbricato officina	17	Vasca di stoccaggio acque		
07	Dormitori	18	Impianto vegetale/arborizzazione mobile		
08	Mensa	19	Vasca di sedimentazione		
09	Uffici	20	Assemblaggio armature e casseri		
10	Blocco per sistema di recupero delle acque durante lo scavo in galleria	21	Isola ecologica		
11	Infermeria		Zone stoccaggio terre		
			Recinzione Tipo A - Rete estrusa in polietilene ad alta densità (HDPE) 1m x 20m		
			Recinzione Tipo B - Rete estrusa in polietilene ad alta densità (HDPE) 1m(h)		
			Recinzione Tipo C - Rete estrusa in polietilene ad alta densità (HDPE) HH1m		
			Pannello informativo in materiale plastico riciclato e fibre Jersey Poliestere per segnalare e delimitare il percorso pedonale		
			Pannello cieco da recinzione		

NOTE

1 Il layout di cantiere DT03 rappresentato fa riferimento alla fase di realizzazione degli interventi di consolidamento per la riduzione dei cedimenti in corrispondenza delle interferenze INT23-24.

2 Per il layout di cantiere DT03 necessario alle attività di realizzazione della Galleria Campomarino si faccia riferimento all'elaborato LI0B.0.2.E.ZZ.P9.SZ00.0.2.038.C

PLANIMETRIA 1 : 5000

COMMITTENTE:
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIREZIONE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE: ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
MANDATARIA: CONSORZIO STABILE ARGE ING. GIUSEPPE NICOLA SAGGESTRINO
MANDANTI: ATLANTE

PROGETTAZIONE: MANDATARIA: HUB ENGINEERING
MANDANTI: STUDIO PRO

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTO 2 e 3: RAPPIO TERMOLI - RIPALTA

Firmato digitalmente da:
Facchini Massimo
Firmato il 12/03/2024 09:58
Serial#: Certificato: 2702585
Valido dal 01/08/2023 al 01/08/2024
ITALFERR - ENGINEERING & TECHNOLOGY SPA

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Planimetria di dettaglio area di deposito DT03 - Fase di consolidamento per riduzione cedimenti INT23-24

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	RESPONSABILE DEI LAVORI	SCALA:
Il Direttore Tecnico (Ing. G. Bianco) Data: 01/03/2024	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE (Ing. M. Facchini) Data: 01/03/2024	Responsabile Unico del Procedimento (Ing. Vincenzo Fiorello) Data: 01/03/2024	1 : 200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
LI0B	02	E	ZZ	P9	SZ0002	038	D

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Prima emissione	G. De Cesare	29/10/22	L. Scali	29/10/22	M. Mangini	29/10/22	
B	Revisione a seguito RdV	M. Andreone	27/04/2023	V. De Chiara	27/04/2023	M. Mangini	27/04/2023	
C	Revisione a seguito RdV	M. Mangini	23/10/2023	G. Lotito	23/10/2023	M. Mangini	23/10/2023	M. Facchini 29/03/2024
D	Revisione a seguito progetto per riduzione cedimenti INT23-24	M. Mangini	29/03/2024	G. Lotito	29/03/2024	M. Mangini	29/03/2024	

File: LI0B.0.2.E.ZZ.P9.SZ00.0.2.038.D.DWG

n. Elab.:
