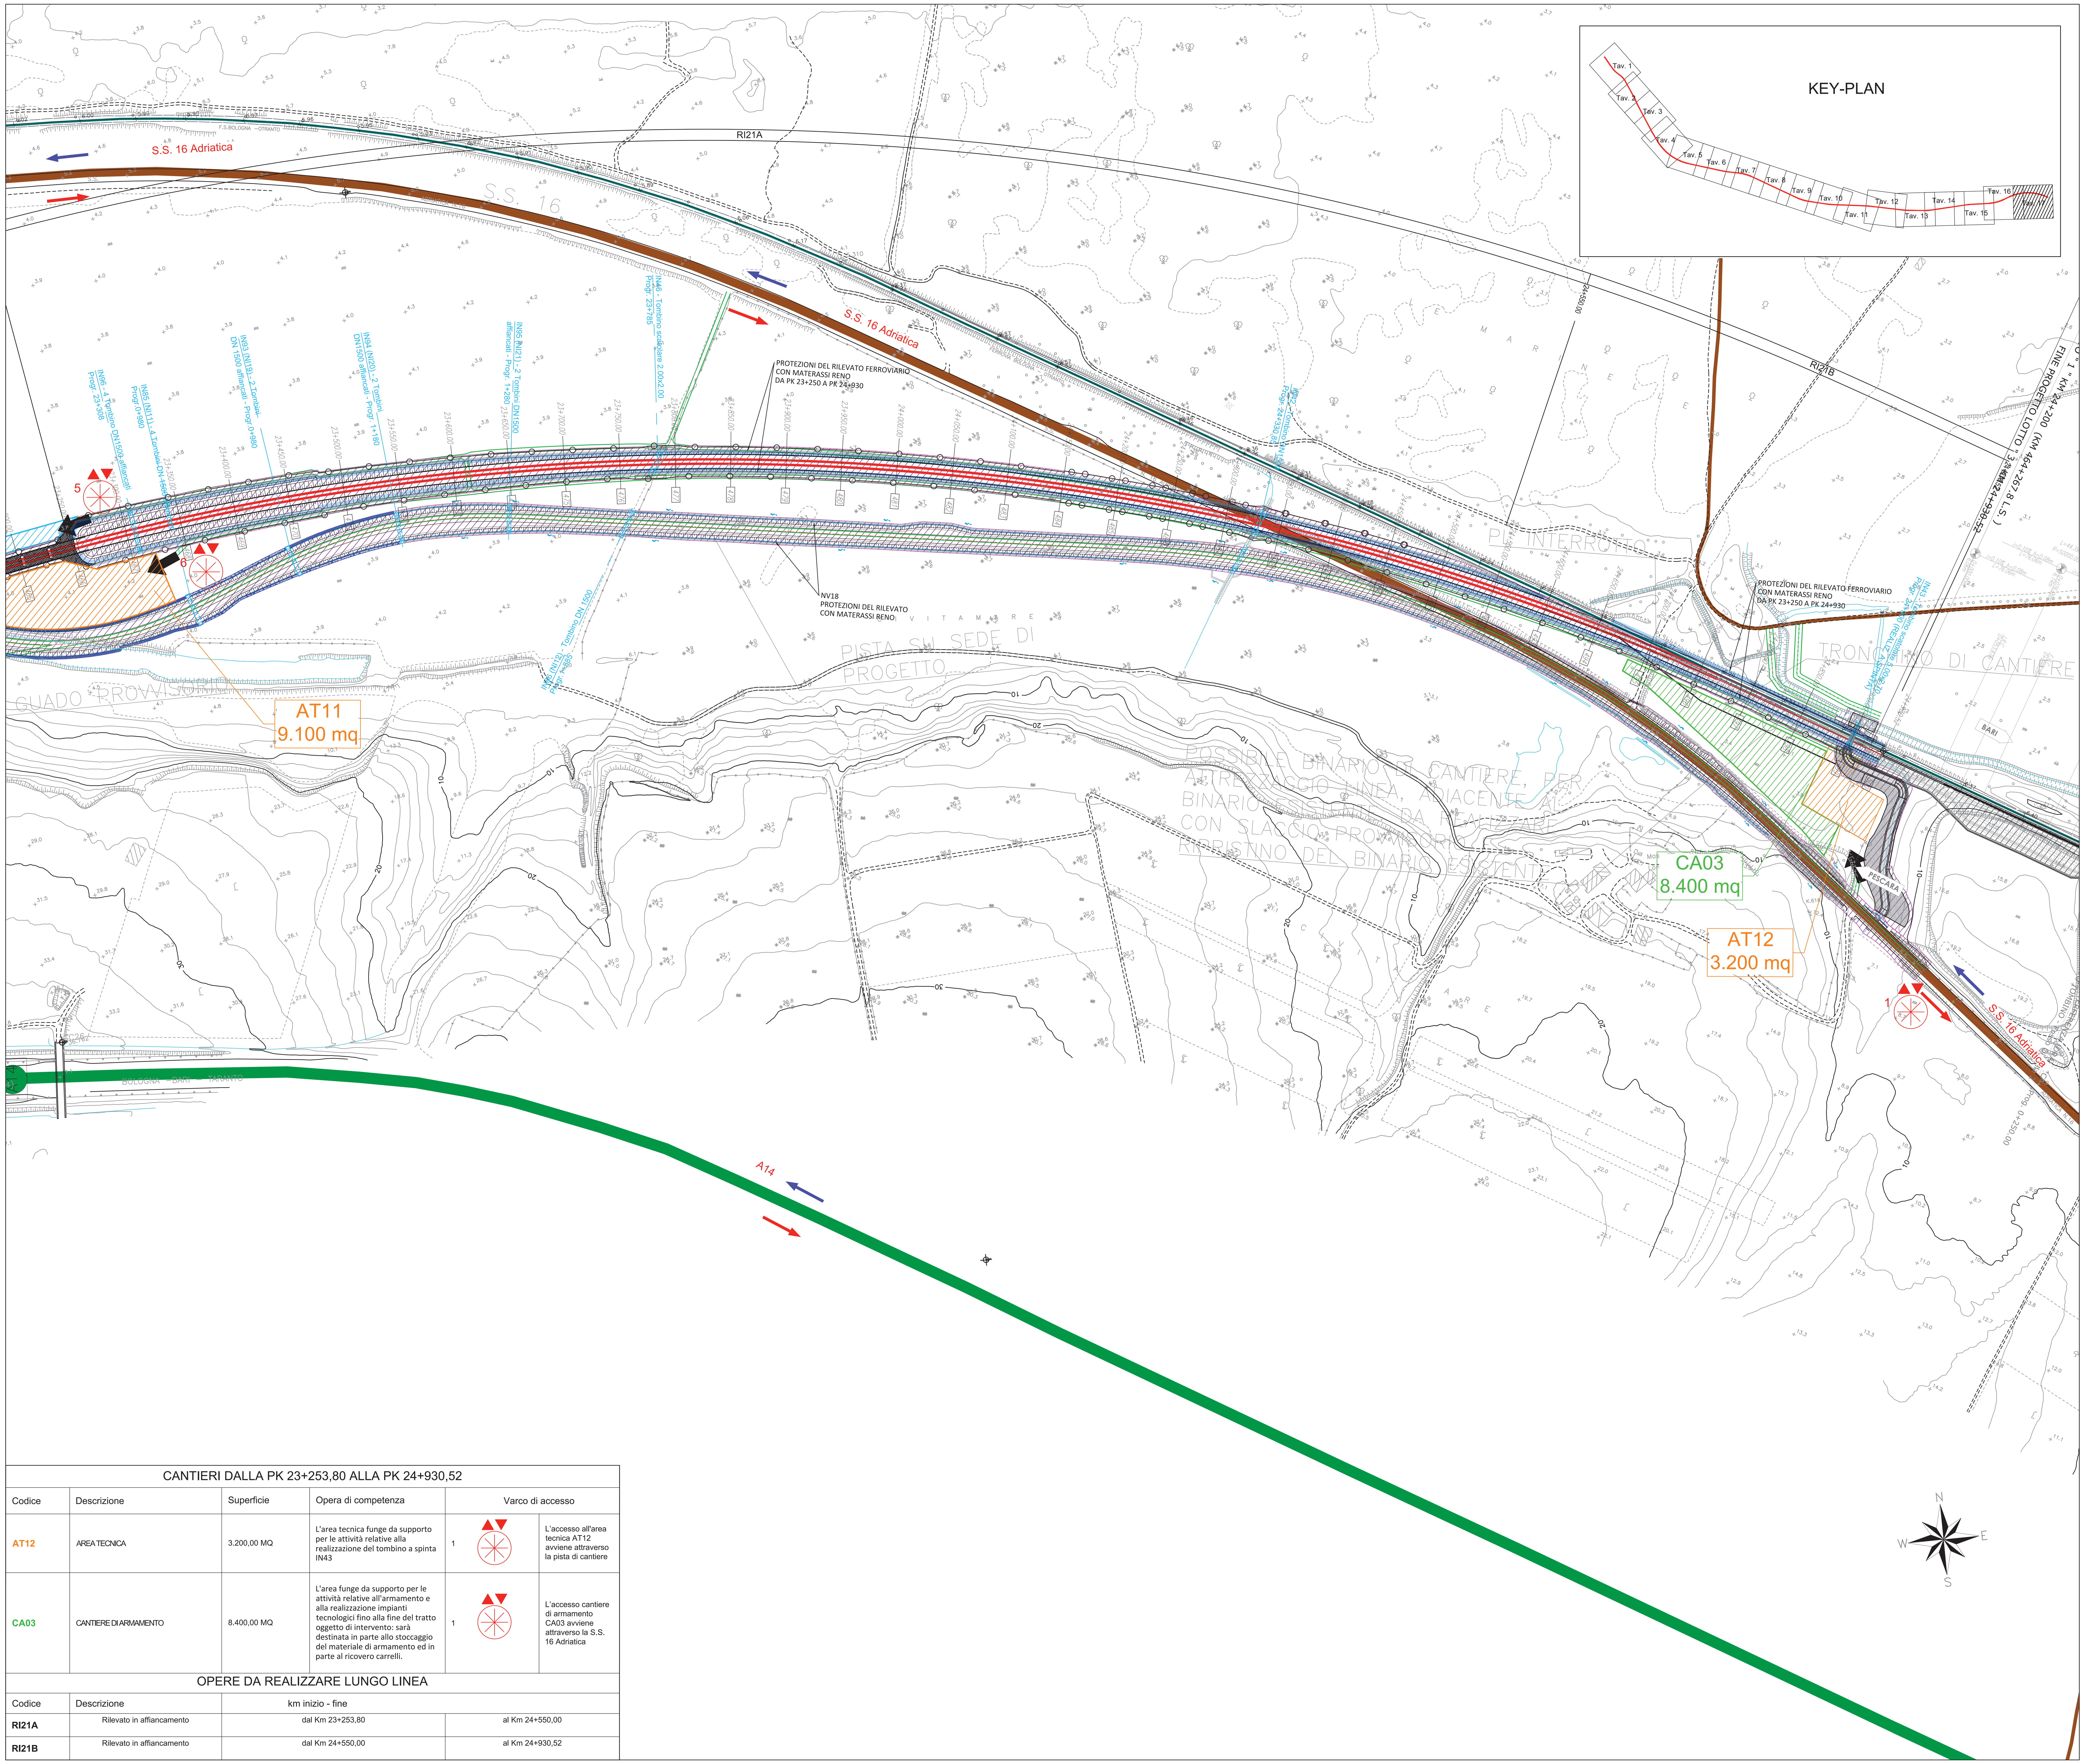

CANTIERI DALLA PK 23+253,80 ALLA PK 24+930,52

Codice	Descrizione	Superficie	Opera di competenza	Varco di accesso	
AT12	AREA TECNICA	3.200,00 MQ	L'area tecnica funge da supporto per le attività relative alla realizzazione del tombino a spinta IN43	1	L'accesso all'area tecnica AT12 avviene attraverso la pista di cantiere
CA03	CANTIERE DI ARMAMENTO	8.400,00 MQ	L'area funge da supporto per le attività relative all'armamento e alla realizzazione impianti tecnologici fino alla fine del tratto oggetto di intervento: sarà destinata in parte allo stoccaggio del materiale di armamento ed in parte al ricovero carrelli.	1	L'accesso cantiere di armamento CA03 avviene attraverso la S.S. 16 Adriatica

OPERE DA REALIZZARE LUNGO LINEA

Codice	Descrizione	km inizio - fine	
RI21A	Rilevato in affiancamento	dal Km 23+253,80	al Km 24+550,00
RI21B	Rilevato in affiancamento	dal Km 24+550,00	al Km 24+930,52

LEGENDA

CANTIERI		VIABILITÀ	
Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	CB – CANTIERE BASE		LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO
	CO – CANTIERE OPERATIVO		LINEA FERROVIARIA ESISTENTE
	CA – CANTIERE DI ARMAMENTO		AUTOSTRADA A14
	AT – AREA TECNICA		VIABILITÀ PRINCIPALE
	AS – AREA STOCCAGGIO		VIABILITÀ SECONDARIA
	AL – AREA DI LAVORO		VIABILITÀ DA ADEGUARE
	ASD – AREA DISMISSIONE		PISTA DI CANTIERE
	DT – DEPOSITO TEMPORANEO		LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO A CURA DI ALTRO APPALTO
	AREA DI CANTIERE A CURA DI ALTRO APPALTO		PROSPETTIVA FOTOGRAFICA
	ACCESSO AI CANTIERI		VARCO DI ACCESSO
			SENSI DI MARCIA

TABELLA DEI CANTIERI

Codice	Descrizione	Comune	Superficie
CB01	CANTIERE BASE PER LAVORI DA INIZIO INTERVENTO A FINE VARIANTE	CAMPOMARINO (CB)	8.500 mq
CB02	CANTIERE BASE PER LAVORI DA FINE VARIANTE A FINE INTERVENTO	CHIEUTI (FG)	20.000 mq
CO01	CANTIERE OPERATIVO	TERMOLI (CB)	11.000 mq
CO02	CANTIERE OPERATIVO	CAMPOMARINO (CB)	10.000 mq
CO03	CANTIERE OPERATIVO	CHIEUTI (FG)	30.000 mq
AT02	AREA TECNICA	TERMOLI (CB)	3.000 mq
AT03	AREA TECNICA	TERMOLI (CB)	9.000 mq
AT04	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	15.000 mq
AT05	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	4.000 mq
AT06	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	6.700 mq
AT07	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	9.000 mq
AT08	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	4.000 mq
AT09	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	2.600 mq
AT10	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	5.600 mq
AT11	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	9.100 mq
AT12	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	3.200 mq
AS01	AREA DI STOCCAGGIO	TERMOLI (CB)	3.900 mq
AS02	AREA DI STOCCAGGIO	TERMOLI (CB)	8.400 mq
AS03	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	10.000 mq
AS04	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	15.000 mq
AS05	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	11.500 mq
AS06	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	11.500 mq
AS07	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	900 mq
AS08	AREA DI STOCCAGGIO	CHIEUTI (FG)	5.000 mq
AS09	AREA DI STOCCAGGIO	CHIEUTI (FG)	7.500 mq
AS10	AREA DI STOCCAGGIO	SERRACAPRIOLA (FG)	10.000 mq
CA01	CANTIERE DI ARMAMENTO ALL'INTERNO DELLA STAZIONE FS DI TERMOLI	TERMOLI (CB)	13.000 mq
CA02	CANTIERE PER DISMISSIONE L.S. ALL'INTERNO DELLA STAZ– FS DI CAMPOMARINO	CAMPOMARINO (CB)	2.500 mq
CA03	CANTIERE DI ARMAMENTO DA ALLESTIRE IN ADIACENZA AL SEDIME IN PROGETTO	SERRACAPRIOLA (FG)	8.400 mq
ASD01	CANTIERE PER LA DISMISSIONE DELLA L.S. ADIACENTE ALLA FERMATA FS DI NUOVA CLITERNIA (ATTUALMENTE FUORI USO)	CAMPOMARINO (CB)	5.000 mq
ASD02	CANTIERE PER DISMISSIONE L.S. ALL'INTERNO DELLA STAZ– FS DI CHIEUTI	CAMPOMARINO (CB)	3.300 mq
DT01	DEPOSITO TEMPORANEO	TERMOLI (CB)	21.500 mq
DT02	DEPOSITO TEMPORANEO	TERMOLI (CB)	14.500 mq
DT02bis	DEPOSITO TEPORANEO	TERMOLI (CB)	12.300 mq
DT03bis	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	30.000 mq
DT03	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	36.000 mq
DT04	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	28.800 mq
DT05	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	16.000 mq
DT06	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	20.000 mq
DT07	DEPOSITO TEMPORANEO	CHIEUTI (FG)	15.000 mq
DT08	DEPOSITO TEMPORANEO	SERRACAPRIOLA (FG)	21.000 mq

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:

D'AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI — ReseArch CONSORZIO STABILE — ATLANTE

MANDATARIA — MANDANTI

PROGETTAZIONE: MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. — MANDANTI HYpro

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Planimetria di dettaglio viabilità e aree di cantiere tav. 17 di 17

DAL KM 23+253,80 AL KM 24+930,52

Firmato digitalmente da: FACCHINI MASSIMO
Firmato il 14/03/2024 10:09
Seriale Certificato: 1254467
Valido dal 11/03/2022 al 11/03/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

APPALTATORE	PROGETTAZIONE		SCALA:
DIRETTORE TECNICO Ing. G.Babini A.A.D'AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. Il Direttore Tecnico (Ing. Gianguido Babini)	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. M. Facchini		1 : 2 000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
LI0B	02	E	ZZ	P6	CA0000	017	B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Prima emissione	S.Materazzo	24/10/22	S.Carozza	24/10/22	T.Pelella	25/10/22	
B	Revisione aggiornamento grafici	S.Materazzo	13/12/22	S.Carozza	16/12/22	T.Pelella	16/12/22	M.Facchini 16/12/22

File: LI0B02EZZP6CA0000017B.DWG

n. Elab.:
