KEY-PLAN



AT08
AREA TECNICA CON AREA PARI A 4.000,00 mq

PLANIMETRIA AREA TECNICA
Scala 1:200

UTILIZZO DELL'AREA
L'area tecnica funge da supporto per le attività di costruzione del viadotto VI05.

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE
FASE 1: rimozione della vegetazione ;
FASE 2: scotico, livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato 3.500 mq;
FASE 3: installazione della recinzione Tipo B 280 ml;
FASE 4: approntamento del cantiere e realizzazione degli impianti di cantiere.

ALLESTIMENTI DI CANTIERE	
quantità allestimento	tipo di allestimento
1	Prefabbricato Spogliatoio+wc; dim. 6,08x4.80m
1	Prefabbricato Guardiola; dim.2,40x6,08
2	Stalli mezzi pesanti
4	Stalli auto

APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO/IDRICO
La fornitura di energia elettrica del cantiere avviene mediante l'utilizzo di un gruppo elettrogeno da 20 kW. I lampioni per l'illuminazione delle aree di cantiere saranno alimentati da pannelli fotovoltaici.
L'alimentazione idrica dei baraccamenti avviene mediante una vasca di riserva idrica di 2.000 lt

IMPIANTI DI CANTIERE
Impianto idrico sanitario
Impianto di smaltimento acque
Impianto elettrico
Impianto Illuminazione con pannelli fotovoltaici
Impianto di terra
Impianto solare termico
Impianto fotovoltaico

LEGENDA

MODULI PREFABBRICATI		AREE ED ELEMENTI INTERNI AL CANTIERE		VIABILITÀ	
Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
01	Prefabbricato punto di consegna MT	12	Tendostruttura		Percorsi viabilità mista
02	Prefabbricato Cabina di trasformazione MT/BT	13	Area deposito carburanti		Percorsi viabilità pesante
03	Prefabbricato Guardiola	14	Impianto di betonaggio		Percorsi viabilità leggera
04	Magazzino	15	Impianto lavaruote		
05	Prefabbricato Spogliatoi e wc	16	Vasca di recupero acque		
06	Prefabbricato officina	17	Vasca di stoccaggio acque		
07	Dormitori	18	Impianto vagliatura/frantumazione mobile		
08	Mensa	19	Vasca di sedimentazione		
09	Uffici	20	Assemblaggio armature e casseri		
10	Blocco per sistema di recupero delle acque durante lo scavo in galleria	21	Isola ecologica		
11	Infermeria		Zona stoccaggio terre		
			Recinzione Tipo A		
			Recinzione Tipo B		
			Recinzione Tipo C		
			Pannello cieco da recinzione		

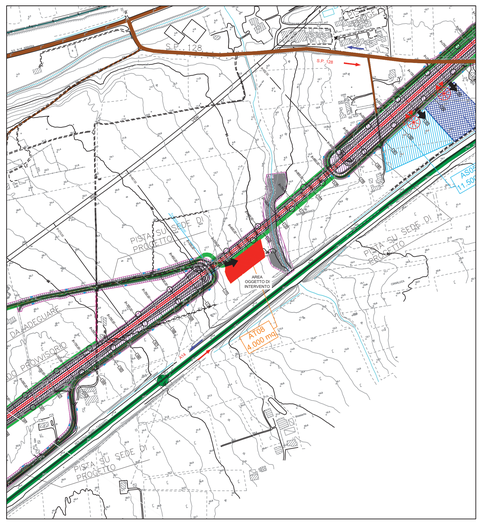
AREA DEMANIALE
AREA DEMANIALE
AREA DEMANIALE
AREA DEMANIALE
PISTA SU SEDE DI PROGETTO
AREA DEMANIALE
AREA DEMANIALE
AREA DEMANIALE
