


**AS02**
**AREA STOCCAGGIO CON AREA PARI A 8.400 mq**

**PLANIMETRIA AREA STOCCAGGIO**
Scala 1:200

**UTILIZZO DELL'AREA**
L'area di stoccaggio verrà impiegata per lo stoccaggio dei materiali da costruzione e delle terre di scavo proveniente dalla realizzazione del Viadotto VI02. Inoltre tale area verrà utilizzata successivamente per la dismissione della linea storica a seguito dell'attivazione del raddoppio della linea

**PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE**
**FASE 1:** rimozione della vegetazione ;
**FASE 2**: scotico, livellamento e realizzazione di una pavimentazione drenante 8.400 mq;
**FASE 3**: installazione della recinzione Tipo B 368 ml;
**FASE 4**: approntamento del cantiere e realizzazione degli impianti di cantiere.

| ALLESTIMENTI DI CANTIERE | |
|---|---|
| quantità allestimento | tipo di allestimento |
| 1 | Pesa |
| 3 | Prefabbricato spogliatoio e wc |
| 4 | stalli mezzi pesanti |
| 6 | stalli auto |

| APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO/IDRICO |
|---|
| La fornitura di energia elettrica del cantiere avviene mediante l'utilizzo di un gruppo elettrogeno da 20kW. I lampioni per le illuminazione delle aree di cantiere saranno alimentati da pannelli fotovoltaici. |
| L'alimentazione idrica dei baraccamenti avviene mediante una vasca di riserva idrica di 2.000 lt. L'acqua calda sarà prodotta dall'impianto solare termico. |

| IMPIANTI DI CANTIERE |
|---|
| Impianto idrico sanitario |
| Impianto solare termico |
| Impianto elettrico |
| Impianto Illuminazione con pannelli fotovoltaici |
| Impianto di terra |
| Impianto fotovoltaico |

LEGENDA

| MODULI PREFABBRICATI | | AREE ED ELEMENTI INTERNI AL CANTIERE | | VIABILITÀ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | Descrizione | Simbolo | Descrizione | Simbolo | Descrizione |
| 01 | Prefabbricato punto di consegna MT | 12 | Tendostruttura | | Percorsi viabilità mista |
| 02 | Prefabbricato Cabina di trasformazione MT/BT | 13 | Area deposito carburanti | | Percorsi viabilità pesante |
| 03 | Prefabbricato Guardiola | 14 | Impianto di betonaggio | | Percorsi viabilità leggera |
| 04 | Magazzino | 15 | Impianto lavaruote | | |
| 05 | Prefabbricato Spogliatoi e wc | 16 | Vasca di recupero acque | | |
| 06 | Prefabbricato officina | 17 | Vasca di stoccaggio acque | | |
| 07 | Dormitori | 18 | Impianto vagliatura/frantumazione mobile | | |
| 08 | Mensa | 19 | Vasca di sedimentazione | | |
| 09 | Uffici | | Zona stoccaggio terre | | |
| 11 | Infermeria | | Recinzione Tipo A | | |
| | | | Recinzione Tipo B | | |
| | | | Recinzione Tipo C | | |
| | | | Pannello cieco da recinzione | | |




**PLANIMETRIA 1 : 5000**

LEGENDA

| CANTIERI | | VIABILITÀ | |
|---|---|---|---|
| Simbolo | Descrizione | Simbolo | Descrizione |
| | CB – CANTIERE BASE | | LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO |
| | CO – CANTIERE OPERATIVO | | LINEA FERROVIARIA ESISTENTE |
| | CA – CANTIERE DI ARMAMENTO | | AUTOSTRADA A14 |
| | AT – AREA TECNICA | | VIABILITÀ PRINCIPALE |
| | AS – AREA STOCCAGGIO | | VIABILITÀ SECONDARIA |
| | AL – AREA DI LAVORO | | VIABILITÀ DA ADEGUARE |
| | ASD – AREA DISMISSIONE | | PISTA DI CANTIERE |
| | DT – DEPOSITO TEMPORANEO | | LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO A CURA DI ALTRO APPALTO |
| | AREA DI CANTIERE A CURA DI ALTRO APPALTO | | PROSPETTIVA FOTOGRAFICA |
| | ACCESSO AI CANTIERI | | VARCO DI ACCESSO |
| | | | SENSI DI MARCIA |

TABELLA DEI CANTIERI
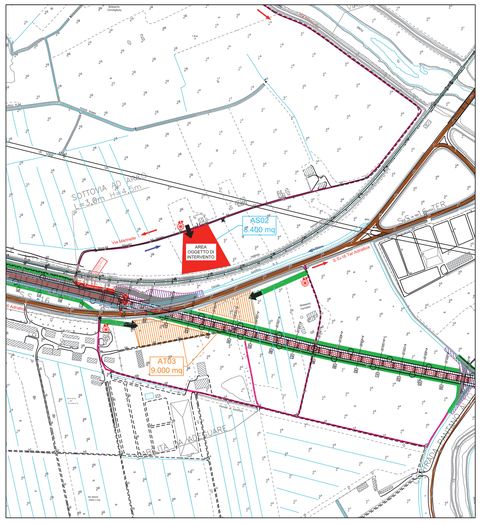
| Codice | Descrizione | Comune | Superficie |
|---|---|---|---|
| CB01 | CANTIERE BASE PER LAVORI DA INIZIO INTERVENTO A FINE VARIANTE | CAMPOMARINO (CB) | 8.500 mq |
| CB02 | CANTIERE BASE PER LAVORI DA FINE VARIANTE A FINE INTERVENTO | CHIEUTI (FG) | 20.000 mq |
| CO01 | CANTIERE OPERATIVO | TERMOLI (CB) | 11.000 mq |
| CO02 | CANTIERE OPERATIVO | CAMPOMARINO (CB) | 10.000 mq |
| CO03 | CANTIERE OPERATIVO | CHIEUTI (FG) | 30.000 mq |
| AT02 | AREA TECNICA | TERMOLI (CB) | 3.000 mq |
| AT03 | AREA TECNICA | TERMOLI (CB) | 9.000 mq |
| AT04 | AREA TECNICA | CAMPOMARINO (CB) | 15.000 mq |
| AT05 | AREA TECNICA | CAMPOMARINO (CB) | 4.000 mq |
| AT06 | AREA TECNICA | CAMPOMARINO (CB) | 6.700 mq |
| AT07 | AREA TECNICA | CAMPOMARINO (CB) | 9.000 mq |
| AT08 | AREA TECNICA | CAMPOMARINO (CB) | 4.000 mq |
| AT09 | AREA TECNICA | CAMPOMARINO (CB) | 2.600 mq |
| AT10 | AREA TECNICA | CAMPOMARINO (CB) | 5.600 mq |
| AT11 | AREA TECNICA | CAMPOMARINO (CB) | 9.100 mq |
| AT12 | AREA TECNICA | CAMPOMARINO (CB) | 900 mq |
| AS01 | AREA DI STOCCAGGIO | TERMOLI (CB) | 3.900 mq |
| AS02 | AREA DI STOCCAGGIO | TERMOLI (CB) | 8.400 mq |
| AS03 | AREA DI STOCCAGGIO | CAMPOMARINO (CB) | 10.000 mq |
| AS04 | AREA DI STOCCAGGIO | CAMPOMARINO (CB) | 15.000 mq |
| AS05 | AREA DI STOCCAGGIO | CAMPOMARINO (CB) | 11.500 mq |
| AS06 | AREA DI STOCCAGGIO | CAMPOMARINO (CB) | 11.500 mq |
| AS07 | AREA DI STOCCAGGIO | CAMPOMARINO (CB) | 900 mq |
| AS08 | AREA DI STOCCAGGIO | CHIEUTI (FG) | 5.000 mq |
| AS09 | AREA DI STOCCAGGIO | CHIEUTI (FG) | 7.500 mq |
| AS10 | AREA DI STOCCAGGIO | SERRACAPRIOLA (FG) | 10.000 mq |
| CA01 | CANTIERE DI ARMAMENTO ALL'INTERNO DELLA STAZIONE FS DI TERMOLI | TERMOLI (CB) | 13.000 mq |
| CA02 | CANTIERE PER DISMISSIONE L.S. ALL'INTERNO DELLA STAZ– FS DI CAMPOMARINO | CAMPOMARINO (CB) | 2.500 mq |
| CA03 | CANTIERE DI ARMAMENTO DA ALLESTIRE IN ADIACENZA AL SEDIME IN PROGETTO | SERRACAPRIOLA (FG) | 14.400 mq |
| ASD01 | CANTIERE PER LA DISMISSIONE DELLA L.S. ADIACENTE ALLA FERMATA FS DI NUOVA CLITERNIA (ATTUALMENTE FUORI USO) | CAMPOMARINO (CB) | 5.000 mq |
| ASD02 | CANTIERE PER DISMISSIONE L.S. ALL'INTERNO DELLA STAZ– FS DI CHIEUTI | CAMPOMARINO (CB) | 3.300 mq |
| DT01 | DEPOSITO TEMPORANEO | TERMOLI (CB) | 21.500 mq |
| DT02 | DEPOSITO TEMPORANEO | TERMOLI (CB) | 14.500 mq |
| DT02bis | DEPOSITO TEPORANEO | TERMOLI (CB) | 12.300 mq |
| DT03bis | DEPOSITO TEMPORANEO | CAMPOMARINO (CB) | 30.000 mq |
| DT03 | DEPOSITO TEMPORANEO | CAMPOMARINO (CB) | 36.000 mq |
| DT04 | DEPOSITO TEMPORANEO | CAMPOMARINO (CB) | 28.800 mq |
| DT05 | DEPOSITO TEMPORANEO | CAMPOMARINO (CB) | 16.000 mq |
| DT06 | DEPOSITO TEMPORANEO | CAMPOMARINO (CB) | 20.000 mq |
| DT07 | DEPOSITO TEMPORANEO | CHIEUTI (FG) | 15.000 mq |
| DT08 | DEPOSITO TEMPORANEO | SERRACAPRIOLA (FG) | 21.000 mq |

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:

D'AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. — MANDATARIA
Consorzio Stabile Research — MANDANTI
ATLANTE

PROGETTAZIONE: MANDATARIA HUB — MANDANTI HYpro

**PROGETTO ESECUTIVO**

**LINEA PESCARA - BARI**
**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA**
**LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**Planimetria di dettaglio area di cantiere AS02 - Area stoccaggio**

| APPALTATORE | PROGETTAZIONE | | SCALA: |
|---|---|---|---|
| A.A.D'AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. Il Direttore Tecnico (Ing. Giangiacomo Bulzini) | DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE (Ing. G. Fiorino) | Firmato digitalmente da: FACCHINI MASSIMO Data: 16/05/2024 11:03 Serial#: Certificato: 1264467 Issuer: Ca= IT-SSL2048 O= INFOCERT SPA OU= Certificato Qualificato Firma Automatica CA | 1 : 2 00 |

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI0B | 02 | E | ZZ | P9 | CA0000 | 018 | A |

| Revis. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Prima emissione | S.Matteracciu | 13/12/22 | S.Carrozza | 16/12/22 | T.Pelella | 16/12/22 | |

File: LI0B02EZZP9CA0000018A.DWG — n. Elab.:
