

DT03
DEPOSITO TEMPORANEO CON AREA PARI A 30.000,00 mq

PLANIMETRIA DEPOSITO TEMPORANEO
Scala 1:200

UTILIZZO DELL'AREA
Area per depositi terra per la gestione dei materiali prodotti dagli scavi nella eventuale indisponibilità dei siti di conferimento definitivo. L'area fungerà da polmone di accumulo per tutte le opere alle gallerie artificiali GA02, GA03, GA04, GA05 e la galleria naturale GN01 lato Ripalta.

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE
FASE 1: rimozione della vegetazione ;
FASE 2: scotico, livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato 30.000 mq;
FASE 3: installazione della recinzione Tipo B 741 m;
FASE 4: approntamento del cantiere e realizzazione degli impianti di cantiere.

ALLESTIMENTI DI CANTIERE	
quantità allestimento	tipo di allestimento
1	Prefabbricato modulare ad uso uffici; dim. 7x2.4m
6	Bagni chimici con lavabo
1	Pesa
5	Stalli auto
5	Stalli mezzi d'opera

APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO/IDRICO
La fornitura di energia elettrica del cantiere avviene mediante l'utilizzo di un gruppo elettrogeno da 20 kW. I lampioni per l'illuminazione delle aree di cantiere saranno alimentati da pannelli fotovoltaici.
L'alimentazione idrica dei baraccamenti avviene mediante una vasca di riserva idrica di 2.000 lt

IMPIANTI DI CANTIERE
Impianto idrico sanitario
impianto di smaltimento acque
Impianto elettrico
Impianto illuminazione con pannelli fotovoltaici
Impianto di terra

LEGENDA

MODULI PREFABBRICATI		AREE ED ELEMENTI INTERNI AL CANTIERE		VIABILITÀ	
Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
01	Prefabbricato punto di consegna MT	12	Tettoia/tettoia		Percorso viabilità mista
02	Prefabbricato Cabina di trasformazione MT/BT	13	Area deposito carburanti		Percorso viabilità pesante
03	Prefabbricato Guardiana	14	Impianto di betonaggio		Percorso viabilità leggera
04	Magazzino	15	Impianto lavanzate		
05	Prefabbricato Spogliatoi e wc	16	Vasca di recupero acque		
06	Prefabbricato officina	17	Vasca di stoccaggio acque		
07	Dormitori	18	Impianto vagliatura/frantumazione mobile		
08	Mensa	19	Vasca di sedimentazione		
09	Uffici	20	Assemblaggio armature e casseri		
10	Blocco per sistema di recupero delle acque durante lo scavo di galleria	21	Isola ecologica		
11	Infermeria		Zona stoccaggio terre		
			Recinzione Tipo A		
			Recinzione Tipo B		
			Recinzione Tipo C		

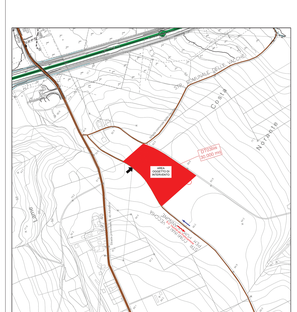

PLANIMETRIA 1 : 5000

LEGENDA

CANTIERI		VIABILITÀ	
Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	CB – CANTIERE BASE		LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO
	CO – CANTIERE OPERATIVO		LINEA FERROVIARIA ESISTENTE
	CA – CANTIERE DI ARMAMENTO		AUTOSTRADA A14
	AT – AREA TECNICA		VIABILITÀ PRINCIPALE
	AS – AREA STOCCAGGIO		VIABILITÀ SECONDARIA
	AL – AREA DI LAVORO		VIABILITÀ DA ADEGUARE
	ASD – AREA DISMISSIONE		PISTA DI CANTIERE
	DT – DEPOSITO TEMPORANEO		LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO A CURA DI ALTRO APPALTO
	AREA DI CANTIERE A CURA DI ALTRO APPALTO		PROSPETTIVA FOTOGRAFICA
	ACCESSO AI CANTIERI		VARCO DI ACCESSO
			SENSI DI MARCIA

TABELLA DEI CANTIERI

Codice	Descrizione	Comune	Superficie
CB01	CANTIERE BASE PER LAVORI DA INIZIO INTERVENTO A FINE VARIANTE	CAMPOMARINO (CB)	8.500 mq
CB02	CANTIERE BASE PER LAVORI DA FINE VARIANTE A FINE INTERVENTO	CAMPOMARINO (CB)	20.000 mq
CO01	CANTIERE OPERATIVO	CHIETI (CH)	11.000 mq
CO02	CANTIERE OPERATIVO	CAMPOMARINO (CB)	10.000 mq
CO03	CANTIERE OPERATIVO	CHIETI (CH)	30.000 mq
AT02	AREA TECNICA	CHIETI (CH)	3.000 mq
AT03	AREA TECNICA	TORINO (TO)	9.000 mq
AT04	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	15.000 mq
AT05	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	4.000 mq
AT06	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	6.700 mq
AT07	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	9.000 mq
AT08	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	4.000 mq
AT09	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	2.600 mq
AT10	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	5.600 mq
AT11	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	9.150 mq
AT12	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	900 mq
AS01	AREA DI STOCCAGGIO	TORINO (TO)	3.900 mq
AS02	AREA DI STOCCAGGIO	TORINO (TO)	9.400 mq
AS03	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	10.000 mq
AS04	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	15.000 mq
AS05	AREA DI STOCCAGGIO	CHIETI (CH)	11.500 mq
AS06	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	11.500 mq
AS07	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	900 mq
AS08	AREA DI STOCCAGGIO	CHIETI (CH)	5.000 mq
AS09	AREA DI STOCCAGGIO	CHIETI (CH)	7.500 mq
AS10	AREA DI STOCCAGGIO	SCERNI-ORTONA (CH)	12.000 mq
CA01	CANTIERE DI ARMAMENTO ALL'INTORNO DELLA STAZIONE FS DI TERMOLI	TERMOLI (CB)	13.000 mq
CA02	CANTIERE PER DISMISSIONE L.S. ALL'INTORNO DELLA STAZ.- FS DI CAMPOMARINO	CAMPOMARINO (CB)	2.500 mq
CA03	CANTIERE DI ARMAMENTO DA ALLESTIRE IN ADIACENZA AL SEDIME DI PROGETTO	SCERNI-ORTONA (CH)	14.400 mq
ASD01	CANTIERE PER LA DISMISSIONE DELLA V.S. ADIAIENTE SULL'ESTREMITÀ DI SE. FUORI AUTOSTRADA (ATTUALMENTE FUORI USO)	CAMPOMARINO (CB)	5.000 mq
ASD02	CANTIERE PER DISMISSIONE L.S. ALL'INTORNO DELLA STAZ.- FS DI CHIEUTI	CAMPOMARINO (CB)	3.300 mq
DT01	DEPOSITO TEMPORANEO	TORINO (TO)	21.500 mq
DT02	DEPOSITO TEMPORANEO	TORINO (TO)	14.500 mq
DT02bis	DEPOSITO TEMPORANEO	TORINO (TO)	12.300 mq
DT03bis	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	30.000 mq
DT03	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	36.000 mq
DT04	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	28.800 mq
DT05	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	18.000 mq
DT06	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	20.000 mq
DT07	DEPOSITO TEMPORANEO	CHIETI (CH)	15.000 mq
DT08	DEPOSITO TEMPORANEO	SCERNI-ORTONA (CH)	21.000 mq

COMMITTENTE:
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMA INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:
ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:
MANDATARIA: CONSORZIO STABILE ARGE STRINC
MANDANTI: PAVIMAL SRL, ATLANTE

PROGETTAZIONE:
MANDATARIA: HUB ENGINEERING
MANDANTI: HYpro

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Planimetria di dettaglio area deposito temporaneo DT03bis

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI REGGIO EMILIA Ing. Giorgio Sabbi n. 526

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	SCALA:
A.T.I. SACYR-ITALFERR-TECNOLOGIE-PAVIMAL-ATLANTE-STRINC-LEGACOOP-SOLEXPERT-CONSORZIO STABILE ARGE STRINC Il Direttore Tecnico Ing. Giorgio Sabbi	A.T.I. HUB ENGINEERING - HYpro Il Direttore Tecnico Ing. Giorgio Sabbi	1 : 2.00

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
LI0B	02	E	ZZ	P6	CA0000	03 6	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Prima emissione	G.Balestracci	24/10/22	V.Carnevo	24/10/22	T.Ferella	24/10/22	Dr. Ing. Giorgio Sabbi Ordine degli Ingegneri della Prov. di Reggio Emilia n. 526

File: LI0B02EZZP6CA000003-37A.DWG n. Elab.:
